

ESTADO DE MINAS GERAIS
PREFEITURA MUNICIPAL DE CONGONHAS

Pagamentos Para o Dia: 25/11/2024

Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.

Agencia: 1793-0 - Congonhas

Conta corrente (Débito): 54293-8 - BB C/54293-8 ROYALTIES

Docum.	Empenho	Código de Barras do Documento	Credor/Contrato	CNPJ/CPF	Cta. Credor	Banco	Agência	Liq. pago
12935	000515/24	CONSORCIO CH GOIABEIRAS	52.383.860/0001-55	11313546	743 - BANCO SEMEAR S.A.	0001 - 0001	808.439,92	808.439,92
Total de lançamentos: 1								808.439,92
Total de documentos: 1								808.439,92

Fernanda Santana Rodrigues
Matrícula: 41251

Camila Vasconcelos Siqueira Cianini
Matrícula: 55011

QUITACÃO CONFORME RECIBO
DE BANCO EM ANEXO.

Fernanda Santana Rodrigues
Tesoureira

Camila Vasconcelos Siqueira Cianini
Secretaria Adjunta da Fazenda

NOTA DE SUBEMPENHO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CONGONHAS

Empenho: 515
Subempenho: 3

C.N.P.J.: 16.752.446/0001-02
Praça Presidente Kubitscheck, 135, Centro, Congonhas, MG

06/11/2024
Página: 1/1
Tipo empenho: Global

1708 - Transferência da União Referente à Compensação Financeira de Recursos Minerais

PROC. COMPRA: 86/2023 LICITAÇÃO: 86/2023 CONTRATO: 344/2023 AF: 279

CREDOR: 24916 CONSORCIO CH GOIABEIRAS

Endereço: R URANO, 145, ***** Cidade: Belo Horizonte UF: MG
C.N.P.J.: 52.383.860/0001-55 Inscr.Est./Ident.Prof.:
Banco: Agência: Fone: 3132825499
Conta Corrente: Fax:

DOTAÇÃO:

Órgão: 13 - Secretaria Municipal Desenv. e Assistência Social
Unidade: 13.03 - Fundo Municipal de Habitação
Funcional: 16.244.0014 - Programas Habitacionais
Projeto/Atividade: 1.037 - Programa Investimento e Melhoria em Habitação
Elemento: 4.4.90.51.01.00.00.00 - Obras e Instalações de Domínio Público

Fonte de Recurso: 1708 - Transferência da União Referente à Compensação Financeira de Recursos Minerais

SALDOS:

Número do empenho :	515	Subempenhos anteriores:	741.896,00
Valor do empenho :	39.180.000,00	Valor do subempenho:	861.876,25
Valor Anulado :	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A) :	39.180.000,00	Total (B) :	1.603.772,25
		Saldo Atual (A - B) :	37.576.227,75

IMPORTÂNCIA:

Valor Bruto:	861.876,25
Descontos:	53.436,33
Valor Líquido:	808.439,92

ESPECIFICAÇÃO:

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA DE ENGENHARIA PARA CONSTRUÇÃO DE 328 MORADIAS, SENDO 82 PRÉDIOS, COMPOSTOS DE 2 APARTAMENTOS POR PAVIMENTO E 2 PAVIMENTOS, NO LOTEAMENTO GOIABEIRAS, INCLUSIVE FORNECIMENTO DE MATERIAL E MÃO DE OBRA, CONFORME PRC/86/23, CONCORRÊNCIA PMC/006/23, CONTRATO PMC/344/23. (Licitação Nº : 6/2023-CC). REFERENTE A DÉCIMA PRIMEIRA MEDIÇÃO, PERÍODO DE SETEMBRO 2024.

DESCONTOS	Conta/Rubrica	Descrição	Valor
Orçamentários	4.1.1.1.3.03.4.1.01.00.00	IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - Principal - Livre 60%	6.205,51
Orçamentários	4.1.1.1.3.03.4.1.02.00.00	IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - Principal - Educação 2	2.585,63
Orçamentários	4.1.1.1.3.03.4.1.03.00.00	IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - Principal - Saúde 15%	1.551,38
Orçamentários	4.1.1.1.4.51.1.1.01.00.00	ISS-QN - Principal - Livre 60%	25.856,29
Orçamentários	4.1.1.1.4.51.1.1.02.00.00	ISS-QN - Principal - Educação 25%	10.773,45
Orçamentários	4.1.1.1.4.51.1.1.03.00.00	ISS-QN - Principal - Saúde 15%	6.464,07
Total Orçamentário(s)			53.436,33
Total dos Descontos			53.436,33

 Julia Andrade Freitas Correa Secretaria Mun. de Des. e Assistência Social Orçamentador da Despesa	 Ana Maria Diniz Matos Dir.Contabilidade CRC/MG- 86404/O Responsável Técnico
---	---

LIQUIDAÇÃO: Nº: 10480

Atesto a liquidação desta despesa (Artigo 63 da Lei Federal 4320/64)


Leonardo Meijon Teixeira - 044.925.576-01
Economista

Data: 06/11/2024

ORDEM DE PAGAMENTO: Nº:

Autorizo o pagamento desta despesa (Artigo 64 da Lei Federal 4320/64)


Julia Andrade Freitas Correa
Secretaria Mun. de Des. e Assistência Social

RECIBO:

Recebi o valor desta despesa, da qual dou plena quitação: 808.439,92 (oitocentos e oito mil quatrocentos e trinta e nove reais e noventa e dois centavos)

ASS. DATA: 25/11/2024

NOME DOCUMENTO

BANCO / CHEQUE / DOCUMENTO ORDEM DE PAGAMENTO

Nº:

QUITAÇÃO:

QUITAÇÃO CONFORME RECIBO
DE BANCO EM ANEXO.

NFS-e - NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA

Nº:2024/12

Emitida em:
28/10/2024 às 19:17:21Competência:
28/10/2024Código de Verificação:
370a7246CONSORCIO CH GOIABEIRAS
CPF/CNPJ: 52.383.860/0001-55
RUA URANO, 145, Santa Lúcia - Cep: 30350-580
Belo Horizonte
Telefone:Inscrição Municipal: 1506752/001-2
MG
Email:

Tomador do(s) Serviço(s)

CPF/CNPJ: 16.752.446/0001-02

Inscrição Municipal: Não Informado

MUNICIPIO DE CONGONHAS

PRAÇA PRESIDENTE KUBISCHEK, 135, CENTRO - Cep: 36410-064

Congonhas

Telefone: (31)3732-0945

MG

Email: Não Informado

Discriminação do(s) Serviço(s)

11a MEDIÇÃO DE CONSTRUÇÃO DE 328 MORÁDIAS, SENDO 82 PRÉDIOS, COMPOSTOS DE 2 APARTAMENTOS POR PAVIMENTO E 2 PAVIMENTOS, NO LOTEAMENTO GOIABEIRAS, CONGONHAS MG, INCLUSIVE FORNECIMENTO DE MATERIAL E MÃO DE OBRA, CONTRATO Nº PMC/344/2023 DE 23/10/2023, CONCORRÊNCIA Nº PMC/006/2023, PRC Nº 086/2023, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº PMC/2961/2023 - Nº PMC/3252/2023, NO PERÍODO 01/09/2024 A 30/09/2024.

MATERIAL APLICADO: R\$ 0,00.

RETENÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA 1,20% - R\$ 10.342,52

CEI: 90.017.43559/72
ART: MG-20232490139

DADOS BANCÁRIOS

Banco: 743

Agência: 0001

CONTA CORRENTE: 11313546

FAVORECIDO: CONSORCIO CH GOIABEIRAS

CNPJ: 52.383.860/0001-55

VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS - 20,11% - FONTE IBPT - R\$ 173.323,31.

Construção Civil: Matrícula CEI: 90.017.43559/72 ART: MG20232490139

Código de Tributação do Município (CTISS)

0702-0/04-88 / Construção de edificações destinadas a usos diversos

Subitem Lista de Serviços LC 116/03 / Descrição:

7.02 / Execução, por administração, empreitada ou subempreitada, de obras de construção civil, hidráulica ou elétrica e de outras obras semelhantes, inclusive sondagem, perfuração de poços, escavação, drenagem e irrigação, terraplanagem, pavimentação, concretagem e a instalação e montagem de produtos, peças e equipamentos (exceto o fornecimento de mercadorias produzidas pelo prestador de serviços fora do local da prestação dos serviços, que fica sujeito ao ICMS).

Cod/Município da incidência do ISSQN:
3118007 / CongonhasNatureza da Operação:
Tributação fora do município

Valor dos serviços:	R\$ 861.876,25	Valor dos serviços:	R\$ 861.876,25
(-) Descontos:	R\$ 0,00	(-) Deduções:	R\$ 0,00
(-) Retenções Federais:	R\$ 10.342,52	(-) Desconto Incondicionado:	R\$ 0,00
(-) ISS Retido na Fonte:	R\$ 43.093,81	(=) Base de Cálculo:	R\$ 861.876,25
Valor Líquido:	R\$ 808.439,92	(x) Alíquota:	5%
		(=) Valor do ISS:	R\$ 43.093,81

Retenções Federais:

IR: R\$ 10.342,52

Outras Informações:

Chave de acesso no Ambiente de Dados Nacional: 31062001252383860000155240000000001224106179414047.

Prefeitura de Belo Horizonte - Secretaria Municipal de Fazenda
Rua Espírito Santo, 605 - 3º andar - Centro - CEP: 30160-919 - Belo Horizonte MG.
Dúvidas: SIGESPConferido N. F. Eletrônica
Em 20/10/2024
Jéssica 20130939

RECEBIDO NA CONTABILIDADE

Data: 05/11/24
Horário: 14:48



PREFEITURA DE CONGONHAS

Atestamos a exatidão do presente documento e autenticidade dos fatos que o originou, estando em condições de ser pago sem qualquer restrição.

Congonhas, ____/____/____

Valente Gommato da Silva 2014 6526
Nome Matrícula

João Lopes Fernandes 088 14886660
Nome Matrícula

Nome Matrícula

COMISSÃO PERMANENTE DE MEDIÇÕES DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA, OBRAS E VERIFICAÇÃO DE ESPECIFICAÇÕES NOMEADA PELA PORTARIA Nº PMC/91 DE 10 DE JANEIRO DE 2022 E DEMAIS ALTERÇÕES.

Sandra Raquel Lacerda Milagre
Presidente

Junio Farley Lima Barboza
Membro

Ederson Vieira Gonçalves
Membro

Mikael Sousa Guimarães
Membro



PREFEITURA MUNICIPAL DE
CONGONHAS - MG



PREFEITURA MUNICIPAL DE CONGONHAS - MG

Imposto Sobre Serviço Qualquer Natureza		
ISSQN / 2024		
Nº GUIA	Lançamento	Vencimento
5668419	2228171	20/11/2024
Nº PARCELA	DATA DO DOCUMENTO	Valor a Pagar
Parc01	06/11/2024	43.093,81
ISSQN		43.093,81
Finalidade : NOTA FISCAL 2024/12 - TOMADOR PREFEITURA MUNICIPAL DE CONGONHAS		

CONSORCIO CH GOIABEIRAS	
CPF/CNPJ :	52383860000155
CONTRIBUINTE :	60355
Nº CADASTRO :	1121900
RUA URANO , 145 , SALA 05 , , SANTA LUCIA	
End:	
Emitido por:	carlossiqueira

LOCAL DE PAGAMENTO				VENCIMENTO	
CEF, LOTERICAS, BANCO BRASIL , BANCO MERCANTIL				20/11/2024	
PARCELA	DATA DO DOCUMENTO	LANÇAMENTO	Nº GUIA	Nosso Número	MOEDA
Parc01	06/11/2024	2228171	5668419	8169000043093811190202411	REAL
ISSQN			43.093,81		
Finalidade : NOTA FISCAL 2024/12 - TOMADOR PREFEITURA MUNICIPAL DE CONGONHAS				VALOR ORIGINÁRIO	
				43.093,81	
				CORREÇÃO	
				0,00	
				(+) JUROS	
				0,00	
				(+) MULTA	
				0,00	
				(-) DESCONTO	
				0,00	
				VALOR	
				43.093,81	

PAGO

25/11/2024

Fernanda Santana Rodrigues

Matricula: 41251

SACADO	
CONSORCIO CH GOIABEIRAS	
CPF/CNPJ :	52383860000155
CONTRIBUINTE :	60355
Nº CADASTRO :	1121900
Endereço:	RUA URANO , 145 , SALA 05 , , SANTA LUCIA
AUTENTICAÇÃO MECÂNICA NO VERSO	
81690000430-9 93811190202-0 41120005668-6 41900000011-9	

PREFEITURA DE CONGONHAS
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA

Contrato nº PMC/344/2023 de 23/10/2023

Processo Administrativo nº PMC/3252/2023

Concorrência Nº PMC/006/2023

Objeto: Execução de 328 moradias, sendo 82 prédios, compostos de 2 apartamentos por pavimento e 2 pavimentos, no loteamento Goiabeiras, Congonhas-MG, inclusive fornecimento de material e mão de obra, inclusive fornecimento de material e mão de obra.

Contratada: Consórcio CH Goiabeiras (Conata Engenharia Ltda, Infracon Engenharia e Comércio Ltda e Construtora Sinarco).

Parecer nº 11 – 29/10/2024

Conforme art. 67 da Lei nº 8666/93, informo a Comissão Permanente de Medições de Serviços de Engenharia, Obras e Verificação de Especificações, que os serviços a serem faturados na **Décima Primeira Medição (Nota Fiscal Nº 2024/12 de 28/10/2024 no valor R\$ 861.876,25)**, referente a execução do objeto contratado acima referenciado, foram executados de acordo com as especificações constantes no contrato e planilha de medição em anexo.

Prefeitura de Congonhas, 29 de outubro de 2024



Ivan Lopes Fernandes

Engenheiro Civil – Prestar Service



Roberto Francisco da Silva

Secretário Adjunto de Obras e Infraestrutura

RECEBIDO NA CONTABILIDADE

Data: 05 / 11 / 24

Horário: 14 : 49



PREFEITURA DE CONGONHAS-MG
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA

TERMO DE FISCALIZAÇÃO

COMISSÃO PERMANENTE DE MEDIÇÕES DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA, OBRAS E VERIFICAÇÃO DE ESPECIFICAÇÕES NOMEADA PELA PORTARIA Nº PMC/91 DE 10 DE JANEIRO DE 2022 E DEMAIS ALTERÇÕES.

1 – Objeto do Contrato: Execução de 328 moradias, sendo 82 prédios, compostos de 2 apartamentos por pavimento e 2 pavimentos, no loteamento Goiabeiras, Congonhas-MG, inclusive fornecimento de material e mão de obra, inclusive fornecimento de material e mão de obra.

2 – Dados do Contrato:

2.1 – Contrato PMC/344/2023 de 23/10/2023

2.2 – Processo Administrativo nº. PMC/3252/2023.

2.3 – Modalidade: PRC Nº 086/2023 - Concorrência Nº PMC/006/2023

2.4 – O valor total do contrato é de R\$ 95.236.737,34 (noventa e cinco milhões, duzentos e trinta e seis mil, setecentos e trinta e sete reais e trinta e quatro centavos).

2.5 – Ordem de Serviços: 20/11/2023

2.6 – Previsão de término do contrato: 20/11/2025 (prazo de obra) 23/10/2026 (prazo de contrato).

2.7 – Contratada: Consórcio CH Goiabeiras (Conata Engenharia Ltda, Infracon Engenharia e Comércio Ltda e Construtora Sinarco).

2.8 – Primeiro Termo Aditivo: Constitui objeto do presente aditivo o acréscimo de quantitativos de serviços existentes e a inserção de serviços novos, no percentual de 4,39% do contrato, conforme planilhas. Valor: R\$ 4.176.575,24. Data: 09/07/2024.

3- Objeto da fiscalização:

3.1 – Atestar a exatidão do cumprimento da execução de 328 moradias, sendo 82 prédios, compostos de 2 apartamentos por pavimento e 2 pavimentos, no loteamento Goiabeiras, Congonhas-MG, inclusive fornecimento de material e mão de obra, inclusive fornecimento de material e mão de obra, referente à **Décima Primeira Medição**.

4- Atestado:

Os serviços do contrato acima mencionado referente a **décima primeira medição**, no valor de **R\$ 861.876,25** (oitocentos e sessenta e um mil, oitocentos e setenta e seis reais e vinte e cinco

centavos), representados pela **Nota Fiscal nº 2024/12** de 28 de outubro de 2024, estão em condições de ser paga pelo Município de Congonhas.

Por ser a expressão da verdade, firmamos o presente.

Congonhas, 29 de outubro de 2024.


Sandra Raquel Lacerda Milagre

Presidente


Ederson Viera Gonçalves

Membro


Mikael Sousa Guimarães

Membro


Junio Farley Lima Barboza

Membro



PREFEITURA DE CONGONHAS
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA
PLANILHA DE MEDIÇÃO - DÉCIMA PRIMEIRAMEDIDÇÃO

OBJETO: Execução de 328 moradias, sendo 82 prédios, compostos de 2 apartamentos por pavimento e 2 pavimentos, no loteamento Goiabeiras, Congonhas - MG, inclusive fornecimento de material e mão de obra

CONTRATADA: Consórcio CH Goiabeiras (Conata Engenharia Ltda, Infracon Engenharia e Comércio Ltda e Construtora Sinarco).

ORDEN DE SERVIÇOS: 20/11/2023

PRazo PARA EXECUÇÃO: 24 meses

PRazo DE VIGÊNCIA DO CONTRATO: 36 meses

PREVISÃO DE TÉRMINO DA EXECUÇÃO: 20/11/2025

PREVISÃO DE TÉRMINO DO CONTRATO: 23/10/2026

CONTRATO Nº PMC/344/2023 de 23/10/2023

PRC Nº 086/2023

CONCORRÊNCIA Nº PMC/006/2023

PROC. ADMINISTRATIVO Nº PMC/3252/2023 - Nº PMC/2961/2023

NOTA FISCAL Nº: 2024/12 - 28/10/2024

PERÍODO: 01/09/2024 A 30/09/2024

VALOR DO CONTRATO:

MEDIDO FATURADO:

ACUMULADO FATURADO:

SALDO A MEDIR:

R\$	99.413.312,58	100,00%
R\$	881.876,25	0,87%
R\$	7.227.752,72	7,27%
R\$	92.185.559,86	92,73%

PREVISÃO DE TÉRMINO DO CONTRATO: 23/10/2026													
ITEM	DESCRIÇÃO	QUANTITATIVOS					VALORES						
		UNIDADE	QUANTITATIVO PREVISTO	ACUM. ANTERIOR	EXECUTADO REALIZADO	ACUM. FATURADO	SALDO A EXECUTAR	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL PREVISTO	ACUM. ANTERIOR	MEDIDO EXECUTADO	ACUM. FATURADO	SALDO A EXECUTAR
1	MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO												
1.1	MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO - CENTROS URBANOS												
1.1.1	MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE OBRA EM CENTRO URBANO OU REGIÃO LIMITROFE COM VALOR ACIMA DE 3.000.000,01	%	0,20%	0,00		0,00	0,10%	R\$ 95.046.844,06	R\$ 190.093,29	R\$ 95.043,19	R\$ -	R\$ 95.043,19	R\$ 95.050,10
2	ADMINISTRAÇÃO LOCAL												
2.1	ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA												
2.1.1.1	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA SENIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	MES	24,00	8,33	1,00	9,33	14,67	R\$ 34.915,06	R\$ 837.961,44	R\$ 290.958,83	R\$ 34.915,06	R\$ 325.873,89	R\$ 512.087,55
2.1.1.2	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	MES	24,00	5,33		5,33	18,67	R\$ 22.353,36	R\$ 536.480,64	R\$ 119.217,92	R\$ -	R\$ 119.217,92	R\$ 417.262,72
2.1.1.3	ENCARREGADO GERAL DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	MES	24,00	4,00		4,00	20,00	R\$ 10.360,86	R\$ 248.660,84	R\$ 41.443,44	R\$ -	R\$ 41.443,44	R\$ 207.217,20
2.1.1.4	MESTRE DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	MES	24,00	7,00		7,00	17,00	R\$ 16.541,65	R\$ 396.999,60	R\$ 115.791,55	R\$ -	R\$ 115.791,55	R\$ 281.208,05
2.1.1.5	TÉCNICO EM SEGURANÇA DO TRABALHO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	MES	24,00	9,33	1,00	10,33	13,67	R\$ 8.090,57	R\$ 194.173,68	R\$ 75.511,99	R\$ 8.090,57	R\$ 83.602,56	R\$ 110.571,12
2.1.1.6	ALMOXARIFE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	MES	24,00	0,00		0,00	24,00	R\$ 5.074,53	R\$ 121.788,72	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 121.788,72
2.1.1.7	VIGIA DIURNO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	MES	24,00	13,26	1,4360	14,69	9,31	R\$ 4.069,84	R\$ 97.676,16	R\$ 53.955,22	R\$ 5.844,29	R\$ 59.799,51	R\$ 37.876,65
2.1.1.8	VIGIA NOTURNO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	8.640,00	3360,00	360,00	3720,00	4920,00	R\$ 29,19	R\$ 252.201,60	R\$ 98.078,40	R\$ 10.508,40	R\$ 108.586,80	R\$ 143.614,80
2.1.1.9	VEÍCULOS - LOCAÇÃO VEÍCULO TIPO PICAPE LEVE C/ SEGURO SEM COMBUSTÍVEL	MES	24,00	9,33	1,00	10,33	13,67	R\$ 3.901,08	R\$ 93.625,92	R\$ 36.410,08	R\$ 3.901,08	R\$ 40.311,16	R\$ 53.314,76
2.1.1.10	COMBUSTÍVEIS - GASOLINA	L	4.800,00	1466,67		1466,67	3333,33	R\$ 5,59	R\$ 26.832,00	R\$ 8.198,67	R\$ -	R\$ 8.198,67	R\$ 18.633,33
2.1.1.11	AUXILIAR DE ESCRITÓRIO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	MES	24,00	9,33	1,00	10,33	13,67	R\$ 4.263,45	R\$ 102.322,80	R\$ 39.792,20	R\$ 4.263,45	R\$ 44.055,65	R\$ 58.267,15
2.1.1.12	AUXILIAR TÉCNICO / ASSISTENTE DE ENGENHARIA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	MES	24,00	9,33		9,33	14,67	R\$ 7.144,04	R\$ 171.456,96	R\$ 66.677,71	R\$ -	R\$ 66.677,71	R\$ 104.779,25
3	SERVIÇOS INICIAIS												
3.1	IDENTIFICAÇÃO DA OBRA												
3.1.1	IDENTIFICAÇÃO DA OBRA												

ITEM	DESCRIÇÃO	QUANTITATIVOS						VALORES					
		UNIDADE	QUANTITATIVO PREVISTO	ACUM. ANTERIOR	EXECUTADO REALIZADO	ACUM. FATURADO	SALDO A EXECUTAR	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL PREVISTO	ACUM. ANTERIOR	MEDIDO EXECUTADO	ACUM. FATURADO	SALDO A EXECUTAR
3.1.1.1	FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE PLACA DE OBRA EM CHAPA GALVANIZADA #26, ESP. 0,45MM, DIMENSÃO (3X1,5)M, PLOTADA COM ADESIVO VINILICO, AFIXADA COM REBITES 4,8X40MM, EM ESTRUTURA METÁLICA DE METALON 20X20MM, ESP. 1,25MM, INCLUSIVE SUPORTE EM EUCALPTO AUTOCOLADO PINTADO COM TINTA PVA DUAS (2) DEMÃOS	UNIT	1,00	1,00		1,00	0,00	R\$ 1.622,68	R\$ 1.622,68	R\$ 1.622,68	-	R\$ 1.622,68	R\$ -
3.2	CANTEIRO DE OBRAS												
3.2.1	CANTEIRO DE OBRAS - CONTAINER												
3.2.1.1	MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE CONTAINER, INCLUSIVE CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE EM CAMINHÃO CARROCERIA COM GUINDALTO (MUNICK), EXCLUSIVE LOCAÇÃO DO CONTAINER	un	12,00	5,00		5,00	7,00	R\$ 830,77	R\$ 9.969,24	R\$ 4.153,85	-	R\$ 4.153,85	R\$ 5.815,39
3.2.1.2	LOCAÇÃO DE CONTAINER COM ISOLAMENTO TÉRMICO, TIPO 1, PARA ESCRITÓRIO DE OBRA, COM MEDIDAS REFERENCIAIS DE (6) METROS COMPRIMENTO, (2,3) METROS LARGURA E (2,5) METROS ALTURA ÚTL INTERNA, INCLUSIVE AR CONDICIONADO E LIGAÇÕES ELÉTRICAS INTERNAS, EXCLUSIVE MOBILIZAÇÃO/DESMOBILIZAÇÃO E LIGAÇÕES PROVISÓRIAS EXTERNAS	mês	24,00	9,00	1,00	10,00	14,00	R\$ 949,79	R\$ 22.794,96	R\$ 8.548,11	949,79	R\$ 9.497,90	R\$ 13.297,06
3.2.1.3	LOCAÇÃO DE CONTAINER COM ISOLAMENTO TÉRMICO, TIPO 3, PARA DEPOSITO/FERRAMENTARIA DE OBRA, COM MEDIDAS REFERENCIAIS DE (6) METROS COMPRIMENTO, (2,3) METROS LARGURA E (2,5) METROS ALTURA ÚTL INTERNA, INCLUSIVE LIGAÇÕES ELÉTRICAS INTERNAS, EXCLUSIVE MOBILIZAÇÃO/DESMOBILIZAÇÃO E LIGAÇÕES PROVISÓRIAS EXTERNAS	mês	24,00	9,00	1,00	10,00	14,00	R\$ 818,80	R\$ 19.651,20	R\$ 7.369,20	818,80	R\$ 8.188,00	R\$ 11.463,20
3.2.1.4	LOCAÇÃO DE CONTAINER COM ISOLAMENTO TÉRMICO, TIPO 4, PARA REFEITÓRIO DE OBRA, COM MEDIDAS REFERENCIAIS DE (6) METROS COMPRIMENTO, (2,3) METROS LARGURA E (2,5) METROS ALTURA ÚTL INTERNA, INCLUSIVE LIGAÇÕES ELÉTRICAS INTERNAS, EXCLUSIVE MOBILIZAÇÃO/DESMOBILIZAÇÃO E LIGAÇÕES PROVISÓRIAS EXTERNAS	mês	24,00	6,00	1,00	7,00	17,00	R\$ 728,62	R\$ 17.486,88	R\$ 4.371,72	728,62	R\$ 5.100,34	R\$ 12.386,54
3.2.1.5	LOCAÇÃO DE CONTAINER COM ISOLAMENTO TÉRMICO, TIPO 7, PARA VESTIÁRIO DE OBRA COM QUATRO (4) CHUVEIROS, TRÊS (3) VASOS SANITÁRIOS, UM (1) MICTÓRIO E UM (1) LAVATÓRIO COM MEDIDAS REFERENCIAIS DE (6) METROS COMPRIMENTO, (2,3) METROS LARGURA E (2,5) METROS ALTURA ÚTL INTERNA, INCLUSIVE LIGAÇÕES ELÉTRICAS E HIDROSSANITÁRIAS INTERNAS, EXCLUSIVE MOBILIZAÇÃO/DESMOBILIZAÇÃO E LIGAÇÕES PROVISÓRIAS EXTERNAS	mês	24,00	0,00		0,00	24,00	R\$ 953,80	R\$ 22.891,20	R\$ -	-	R\$ -	R\$ 22.891,20
3.2.1.6	BANHEIRO QUÍMICO - BANHEIRO QUÍMICO E REBOQUE PARA TRANSPORTE DE BANHEIRO QUÍMICO	MES	24,00	0,00		0,00	24,00	R\$ 1.237,29	R\$ 29.694,96	R\$ -	-	R\$ -	R\$ 29.694,96
3.2.1.7	LIGAÇÃO PROVISÓRIA DE ÁGUA E ESGOTO PARA CONTAINER (ESCRITÓRIO DE OBRA)	un	1,00	1,00		1,00	0,00	R\$ 358,04	R\$ 358,04	R\$ 358,04	-	R\$ 358,04	R\$ -
3.2.1.8	LIGAÇÃO PROVISÓRIA DE ENERGIA ELÉTRICA PARA CONTAINER	un	4,00	0,00		0,00	4,00	R\$ 396,96	R\$ 1.587,84	R\$ -	-	R\$ -	R\$ 1.587,84
3.2.1.9	LIGAÇÃO PROVISÓRIA DE ÁGUA E ESGOTO PARA CONTAINER (VESTIÁRIO DE OBRA), EXCLUSIVE CHUVEIRO ELÉTRICO	un	1,00	0,00		0,00	1,00	R\$ 422,32	R\$ 422,32	R\$ -	-	R\$ -	R\$ 422,32
3.3	SERVIÇOS TOPOGRÁFICOS												
3.3.1	SERVIÇOS TOPOGRÁFICOS												
3.3.1.1	TOPOGRAFIA - EQUIPE DE TOPOGRAFIA - OBRA	MÊS	8,00	6,33	0,50	6,83	1,17	R\$ 23.073,76	R\$ 184.590,08	R\$ 146.133,81	11.536,88	R\$ 157.670,69	R\$ 26.919,39
3.4	LIGAÇÃO PROVISÓRIA												
3.4.1	LIGAÇÃO PROVISÓRIA												

ITEM	DESCRIÇÃO	QUANTITATIVOS					VALORES						
		UNIDADE	QUANTITATIVO PREVISTO	ACUM. ANTERIOR	EXECUTADO REALIZADO	ACUM. FATURADO	SALDO A EXECUTAR	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL PREVISTO	ACUM. ANTERIOR	MEDIDO EXECUTADO	ACUM. FATURADO	SALDO A EXECUTAR
3.4.1.1	LIGAÇÃO DE ÁGUA PROVISÓRIA PARA CANTEIRO, INCLUSIVE HIDRÔMETRO E CAVALETE PARA MEDIÇÃO DE ÁGUA - ENTRADA PRINCIPAL EM AÇO GALVANIZADO DN 20MM (1/2") - PADRÃO CONCESSIONÁRIA	un	1,00	0,00		0,00	1,00	R\$ 455,97	R\$ 455,97	R\$ -	R\$ -	R\$ 455,97	
3.4.1.2	LIGAÇÃO PROVISÓRIA COM ENTRADA DE ENERGIA AÉREA, PADRÃO CEMIG, CARGA INSTALADA DE 15,1KVA ATÉ 30KVA, TRIFÁSICO, COM SAÍDA SUBTERRÂNEA, INCLUSIVE POSTE, CAIXA PARA MEDIDOR, DISJUNTOR, BARRAMENTO, ATERRAMENTO E ACESSÓRIOS	un	1,00	1,00		1,00	0,00	R\$ 1.390,42	R\$ 1.390,42	R\$ 1.390,42	R\$ -	R\$ -	
3.5	TAPUME												
3.5.1	TAPUME												
3.5.1.1	TAPUME COM TELHA METÁLICA. AF_05/2018	M2	3731,42	635,80		635,80	3.095,62	R\$ 181,98	R\$ 679.043,81	R\$ 115.702,88	R\$ -	R\$ 563.340,93	
3.6	ANDAIMES												
3.6.1	FACHADEIRO												
3.6.1.1	FORNECIMENTO DE ANDAIME METÁLICO PARA FACHADA (LOCAÇÃO), INCLUSIVE PISO METÁLICO E SAPATAS, EXCLUSIVE MONTAGEM E DESMONTAGEM	m2xmês	1839,84	0,00		0,00	1.839,84	R\$ 8,06	R\$ 14.829,11	R\$ -	R\$ -	R\$ 14.829,11	
3.6.1.2	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIME METÁLICO PARA FACHADA COM PISO METÁLICO, INCLUSIVE RODAPÉ/GUARDA- CORPO EM MADEIRA, EXCLUSIVE FORNECIMENTO DO ANDAIME	m2	1839,84	0,00		0,00	1.839,84	R\$ 18,89	R\$ 34.754,58	R\$ -	R\$ -	R\$ 34.754,58	
3.6.2	INTERNO												
3.6.2.1	ANDAIME EM CAVALETE METÁLICO PARA FORRO DE GESSO, COM CHAPA DE COMPENSADO E TÁBUA, COM REAPROVEITAMENTO, INCLUSIVE MONTAGEM/DESMONTAGEM E REMANEJAMENTO	m2	5892,12	0,00		0,00	5.892,12	R\$ 1,65	R\$ 9.721,99	R\$ -	R\$ -	R\$ 9.721,99	
3.7	MOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS												
3.7.1	MOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS												
3.7.1.1	MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTO PARA ESTACA TIPO HÉLICE CONTÍNUA DMT ATÉ 50 KM	un	2,000	0,00		0,00	2,00	R\$ 11.675,38	R\$ 23.350,76	R\$ -	R\$ -	R\$ 23.350,76	
4	CONJUNTO HABITACIONAL GOIAIBEIRAS												
4.1	MOVIMENTAÇÃO DE TERRA												
4.1.1	CORTE E ATERRO												
4.1.1.1	ESCAVAÇÃO HORIZONTAL EM SOLO DE 1ª CATEGORIA COM TRATOR DE ESTEIRAS (150HP/LÂMINA: 3,18M3). AF_07/2020	M3	93716,41	31210,77		46890,76	46.825,65	R\$ 4,16	R\$ 389.860,27	R\$ 129.836,82	R\$ 65.228,76	R\$ 194.794,69	
4.1.1.2	ATERRO COMPACTADO COM ROLO VIBRATÓRIO A 95% DO P.N.	m3	54577,3	9613,66		23255,27	31.322,03	R\$ 3,43	R\$ 187.200,14	R\$ 32.974,87	R\$ 48.790,72	R\$ 107.434,55	
4.1.2	BOTA FORA												
4.1.2.1	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 1,20 M³ / 155 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020	M3	89603,87	87564,55		109247,73	-19.643,86	R\$ 7,84	R\$ 702.494,32	R\$ 686.506,03	R\$ 169.998,13	R\$ 154.007,84	
4.1.2.2	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM).	M3XKM	1138056,68	775919,90		913796,32	224.260,36	R\$ 2,74	R\$ 3.118.275,29	R\$ 2.128.020,51	R\$ 377.781,39	R\$ 614.473,39	
4.1.2.3	AF_07/2020	M3	61189,89	0,00		0,00	61.189,89	R\$ 1,67	R\$ 102.187,11	R\$ -	R\$ -	R\$ 102.187,11	
4.1.3	COBERTURA VEGETAL DE TALUDES			0,00									

ITEM	DESCRIÇÃO	QUANTITATIVOS					VALORES						
		UNIDADE	QUANTITATIVO PREVISTO	ACUM. ANTERIOR	EXECUTADO REALIZADO	ACUM. FATURADO	SALDO A EXECUTAR	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL PREVISTO	ACUM. ANTERIOR	MÉDIO EXECUTADO	ACUM. FATURADO	SALDO A EXECUTAR
4.1.3.1	HIDROSSEMEADURA	M²	27.807,19614	0,00		0,00	27.807,20	R\$ 7,69	R\$ 213.837,33	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 213.837,33
4.2	DRENAGEM - REDE TUBULAR												
4.2.1	REDE TUBULAR DE CONCRETO												
4.2.1.1	ESCOVAÇÃO MECÂNICA DE VALA EM MATERIAL DE 1ª CATEGORIA	M²	4670,936757	0,00		0,00	4.670,94	R\$ 8,47	R\$ 39.562,83	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 39.562,83
4.2.1.2	ESTRUTURA DE ESCORAMENTO - ESTRUTURA DE ESCORAMENTO TIPO PONTALETEAMENTO	M2	2809,262185	0,00		0,00	2.809,26	R\$ 17,14	R\$ 48.150,75	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 48.150,75
4.2.1.3	FORMA E ESCORAMENTO - ESCORAMENTO DESCONTINUO TIPO A (MADEIRA 6 A 10CM)	M2	3213,2005	0,00		0,00	3.213,20	R\$ 24,17	R\$ 77.663,05	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 77.663,05
4.2.1.4	ESCORAMENTO DE VALA TIPO CONTÍNUO EMPREGANDO PRANCHAS E LONGARINAS DE PERoba	m2	1592,1091	0,00		0,00	1.592,11	R\$ 111,05	R\$ 176.803,71	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 176.803,71
4.2.1.5	PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1,5 M E MENOR QUE 2,5 M (ACERTO DO SOLO NATURAL), AF_08/2020	M2	1879,745	0,00		0,00	1.879,75	R\$ 3,43	R\$ 6.447,52	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 6.447,52
4.2.1.6	FORMA E ESCORAMENTO - FORMA DE TABUA DE PINHO DE 3a TIPO E (P/BERCO)	M2	950,4462	0,00		0,00	950,45	R\$ 32,22	R\$ 30.623,37	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 30.623,37
4.2.1.7	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, INCLUSIVE TRANSPORTE, LANÇAMENTO E ADENSAMENTO	m3	350,3034	0,00		0,00	350,30	R\$ 621,21	R\$ 217.611,97	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 217.611,97
4.2.1.8	TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 400 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO, AF_12/2015	M	264,93	0,00		0,00	264,93	R\$ 224,70	R\$ 59.529,77	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 59.529,77
4.2.1.9	PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 800 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL, DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO, AF_12/2015	M	1263,45	0,00		0,00	1.263,45	R\$ 403,92	R\$ 510.332,72	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 510.332,72
4.2.1.10	REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAÇÃO MECANIZADA, AF_04/2016	M3	895,7053	0,00		0,00	895,71	R\$ 36,48	R\$ 32.675,32	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 32.675,32
4.2.1.11	MOVIMENTO DE TERRA - REENTERRO COMPACTADO COM ROLO VIBRATORIO	M3	3143,414757	0,00		0,00	3.143,41	R\$ 6,10	R\$ 19.174,83	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 19.174,83
4.2.1.12	CARGA, MANOBR E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 1,20 M³ / 155 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3), AF_07/2020	M3	1584,30661	0,00		0,00	1.584,31	R\$ 7,84	R\$ 12.420,96	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 12.420,96
4.2.1.13	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM), AF_07/2020	M3XKM	23764,59914	0,00		0,00	23.764,60	R\$ 2,74	R\$ 65.115,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 65.115,00
4.2.1.14	ESPALHAMENTO DE MATERIAL COM TRATOR DE ESTEIRAS, AF_11/2019	M3	1584,30661	0,00		0,00	1.584,31	R\$ 1,67	R\$ 2.645,79	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 2.645,79
4.2.2	BOCAS DE LOBO												
4.2.2.1	CAIXA PARA BOCA LOBO - CAIXA PARA BOCA DE LOBO SIMPLES / BLOCO DE CONCRETO	UN	27,000	0,00		0,00	27,00	R\$ 1.179,93	R\$ 31.858,11	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 31.858,11
4.2.2.2	CAIXA PARA BOCA LOBO - CAIXA PARA BOCA DE LOBO DUPLA / BLOCO DE CONCRETO	UN	2,000	0,00		0,00	2,00	R\$ 2.014,02	R\$ 4.028,04	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 4.028,04
4.2.2.3	CONJUNTO QUADRO E GRELHA PARA BOCA DE LOBO - TIPO B (CONCRETO) - PADRÃO SUDECAP	UN	31,000	0,00		0,00	31,00	R\$ 458,30	R\$ 14.207,30	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 14.207,30
4.2.2.4	CANTONEIRA PARA BOCA DE LOBO - TIPO B (CONCRETO) - PADRÃO SUDECAP	UN	31,00	0,00		0,00	31,00	R\$ 153,79	R\$ 4.767,49	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 4.767,49
4.2.3	CAIXA DE PASSAGEM												
4.2.3.1	CAIXA DE PASSAGEM TIPO B - PADRÃO SUDECAP - D= 600 MM	UN	9,00	0,00		0,00	9,00	R\$ 2.711,63	R\$ 24.404,67	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 24.404,67
4.2.3.2	CAIXA DE PASSAGEM TIPO C - PADRÃO SUDECAP - D= 600 MM	UN	3,00	0,00		0,00	3,00	R\$ 3.115,71	R\$ 9.347,13	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 9.347,13

ITEM	DESCRIÇÃO	QUANTITATIVOS					VALORES						
		UNIDADE	QUANTITATIVO PREVISTO	ACUM. ANTERIOR	EXECUTADO REALIZADO	ACUM. FATURADO	SALDO A EXECUTAR	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL PREVISTO	ACUM. ANTERIOR	MÉDIO EXECUTADO	ACUM. FATURADO	SALDO A EXECUTAR
4.2.4	POÇOS DE VISITA - REDE DE CONCRETO												
4.2.4.1	POÇO DE VISITA TIPO A - PADRAO SUDECAP - D= 600 MM	UN	4,00	0,00		0,00	4,00	R\$ 2.812,29	R\$ 11.249,16	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 11.249,16
4.2.4.2	POÇO DE VISITA TIPO B - PADRAO SUDECAP - D= 600 MM	UN	12,00	0,00		0,00	12,00	R\$ 3.556,14	R\$ 42.673,68	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 42.673,68
4.2.4.3	POÇO DE VISITA TIPO C - PADRAO SUDECAP - D= 600 MM	UN	5,00	0,00		0,00	5,00	R\$ 4.111,31	R\$ 20.556,55	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 20.556,55
4.2.4.4	CHAMINÉ CIRCULAR PARA POÇO DE VISITA PARA DRENAGEM, EM ALVENARIA COM TUILOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIÂMETRO INTERNO = 0,6 M. AF_12/2020	M	27,71	0,00		0,00	27,71	R\$ 1.066,58	R\$ 29.554,93	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 29.554,93
4.2.4.5	TAMPAO DE POÇO DE VISITA - FERRO FUNDIDO NODULAR	UN	21,00	0,00		0,00	21,00	R\$ 1.073,75	R\$ 22.548,75	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 22.548,75
4.2.5	ALA DE REDE TUBULAR												
4.2.5.1	ALA DE REDE TUBULAR - D= 600 MM	UN	1,00	0,00		0,00	1,00	R\$ 1.529,81	R\$ 1.529,81	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.529,81
4.2.6	DISSIPADOR DE ENERGIA												
4.2.6.1	DISSIPADOR DE ENERGIA - DEB 02 - AREIA, BRITA E PEDRA DE MÃO COMERCIAIS	UN	1,00	0,00		0,00	1,00	R\$ 537,09	R\$ 537,09	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 537,09
4.3	SANEAMENTO - REDE TUBULAR												
4.3.1	REDE TUBULAR DE PVC												
4.3.1.1	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,5M	m3	268,24	0,00		0,00	268,24	R\$ 74,15	R\$ 19.890,29	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 19.890,29
4.3.1.2	PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M (ACERTO DO SOLO NATURAL). AF_08/2020	M2	268,24	0,00		0,00	268,24	R\$ 6,94	R\$ 1.861,61	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.861,61
4.3.1.3	LASTRO DE AREIA	m3	8,05	0,00		0,00	8,05	R\$ 192,37	R\$ 1.548,06	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.548,06
4.3.1.4	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, INCLUSIVE TRANSPORTE, LANÇAMENTO E ADENSAMENTO	m3	8,05	0,00		0,00	8,05	R\$ 621,21	R\$ 4.999,07	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 4.999,07
4.3.1.5	FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO PVC RÍGIDO, ESGOTO, PBV - SÉRIE NORMAL, DN 200 MM (6"), INCLUSIVE CONEXÕES	m	670,61	0,00		0,00	670,61	R\$ 201,49	R\$ 135.121,20	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 135.121,20
4.3.1.6	REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_04/2016	M3	261,54	0,00		0,00	261,54	R\$ 36,48	R\$ 9.540,90	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 9.540,90
4.3.1.7	CARGA, MANOBRAS E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM PÁ CARREGADEIRA (CAÇAMBA DE 1,7 A 2,8 M³ / 128 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020	M3	58,12	0,00		0,00	58,12	R\$ 10,02	R\$ 582,35	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 582,35
4.3.1.8	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	581,20	0,00		0,00	581,20	R\$ 2,74	R\$ 1.592,47	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.592,47
4.3.1.9	ESPALHAMENTO DE MATERIAL COM TRATOR DE ESTEIRAS. AF_11/2019	M3	58,12	0,00		0,00	58,12	R\$ 1,67	R\$ 97,05	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 97,05
4.3.2	REDE TUBULAR DE CONCRETO												
4.3.2.1	ESCAVAÇÃO MECÂNICA DE VALA EM MATERIAL DE 1ª CATEGORIA	M³	2,47	0,00		0,00	2,47	R\$ 8,47	R\$ 20,90	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 20,90
4.3.2.2	PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1,5 M E MENOR QUE 2,5 M (ACERTO DO SOLO NATURAL). AF_08/2020	M2	3,288	0,00		0,00	3,29	R\$ 3,43	R\$ 11,27	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 11,27
4.3.2.3	FORMA E ESCORAMENTO - FORMA DE TABUA DE PINHO DE 3a. TIPO E (P/BERÇO)	M2	2,568	0,00		0,00	2,57	R\$ 32,22	R\$ 82,74	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 82,74
4.3.2.4	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, INCLUSIVE TRANSPORTE, LANÇAMENTO E ADENSAMENTO	m3	3,29	0,00		0,00	3,29	R\$ 621,21	R\$ 2.042,53	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 2.042,53
4.3.2.5	TUBO DE CONCRETO (SIMPLES) PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 200 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_12/2015 - BASEADO EM SINAPI (95570)	M	21,00	0,00		0,00	21,00	R\$ 128,72	R\$ 2.703,12	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 2.703,12

ITEM	DESCRIÇÃO	QUANTITATIVOS					VALORES						
		UNIDADE	QUANTITATIVO PREVISTO	ACUM. ANTERIOR	EXECUTADO REALIZADO	ACUM. FATURADO	SALDO A EXECUTAR	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL PREVISTO	ACUM. ANTERIOR	MEDIDO EXECUTADO	ACUM. FATURADO	SALDO A EXECUTAR
4.3.2.6	REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_04/2018	M3	2,12	0,00		0,00	2,12	R\$ 36,48	R\$ 77,49	-	R\$ -	R\$ -	R\$ 77,49
4.3.2.7	MOVIMENTO DE TERRA - REATERRO COMPACTADO COM ROLO VIBRATORIO	M3	0,28	0,00		0,00	0,28	R\$ 6,07	R\$ 1,68	-	R\$ -	R\$ -	R\$ 1,68
4.3.2.8	CARGA, MANOBRAS E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 m³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 1,20 m³ / 155 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020	M3	0,54	0,00		0,00	0,54	R\$ 7,83	R\$ 4,24	-	R\$ -	R\$ -	R\$ 4,24
4.3.2.9	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 m³ EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	8,12	0,00		0,00	8,12	R\$ 2,74	R\$ 22,25	-	R\$ -	R\$ -	R\$ 22,25
4.3.2.10	ESPALHAMENTO DE MATERIAL COM TRATOR DE ESTERIAS. AF_11/2019	M3	0,54	0,00		0,00	0,54	R\$ 1,67	R\$ 0,90	-	R\$ -	R\$ -	R\$ 0,90
4.3.3	DISPOSITIVOS DIVERSOS												
4.3.3.1	CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIMENSÕES INTERNAS: 0,30X 3X0,3 M. AF_12/2020	UN	6,00	0,00		0,00	6,00	R\$ 241,38	R\$ 1.448,28	-	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.448,28
4.3.3.2	CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIMENSÕES INTERNAS: 0,4X0 4X0,4 M. AF_12/2020	UN	11,00	0,00		0,00	11,00	R\$ 447,50	R\$ 4.922,50	-	R\$ -	R\$ -	R\$ 4.922,50
4.3.3.3	CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X0 6X0,5 M. AF_12/2020	UN	73,00	0,00		0,00	73,00	R\$ 579,29	R\$ 42.288,17	-	R\$ -	R\$ -	R\$ 42.288,17
4.3.3.4	CANALETAS PARA DRENAGEM, EM CONCRETO COM FCK 15MPA, MOLDADA IN LOCO, SEÇÃO 15X15CM, FORMA EM CONTRA BARRANCO, EXCLUSIVAMENTE TAMPA, INCLUSIVE ESCAVAÇÃO, REATERRO COM TRANSPORTE E RETIRADA DO MATERIAL. ESCAVADO (EM CAÇAMBA)	m	5295,00	0,00		0,00	5.295,00	R\$ 74,53	R\$ 394.636,35	-	R\$ -	R\$ -	R\$ 394.636,35
4.3.3.5	CANALETAS PARA DRENAGEM, EM CONCRETO COM FCK 15MPA, MOLDADA IN LOCO, SEÇÃO 40X15CM, FORMA EM CONTRA BARRANCO, EXCLUSIVAMENTE TAMPA, INCLUSIVE ESCAVAÇÃO, REATERRO COM TRANSPORTE E RETIRADA DO MATERIAL. ESCAVADO (EM CAÇAMBA) - BASEADO EM SETOP (ED-14581)	M	457,10	0,00		0,00	457,10	R\$ 151,49	R\$ 69.246,07	-	R\$ -	R\$ -	R\$ 69.246,07
4.3.3.6	CANALETAS PARA DRENAGEM, EM CONCRETO COM FCK 15MPA, MOLDADA IN LOCO, SEÇÃO 50X15CM, FORMA EM CONTRA BARRANCO, EXCLUSIVAMENTE TAMPA, INCLUSIVE ESCAVAÇÃO, REATERRO COM TRANSPORTE E RETIRADA DO MATERIAL. ESCAVADO (EM CAÇAMBA) - BASEADO EM SETOP (ED-14581)	M	1005,90	0,00		0,00	1.005,90	R\$ 190,67	R\$ 191.794,95	-	R\$ -	R\$ -	R\$ 191.794,95
4.3.3.7	DESCIDA D'ÁGUA DE CORTES EM DEGRAUS - DCD 02 - AREIA E BRITA COMERCIAIS	M	8,00	0,00		0,00	8,00	R\$ 737,24	R\$ 5.897,92	-	R\$ -	R\$ -	R\$ 5.897,92
4.3.3.8	CANAL MONOBLOCO COM CORPO E GRELHA EM CONCRETO POLIMÉRICO COM EFEITO AUTOLIMPANTE - CARGA DE CONTROLE DE 400 KN - 100,0 X 15,0 X 23,0 CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO EM PAVIMENTO DE ASFALTO	M	36,00	0,00		0,00	36,00	R\$ 497,53	R\$ 17.911,08	-	R\$ -	R\$ -	R\$ 17.911,08
4.4	PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA												
4.4.1	ENSAIOS												
4.4.1.1	ENSAIO DE GRANULOMETRIA POR PENEIRAMENTO - SOLOS	U	54,00	0,00		0,00	54,00	R\$ 110,58	R\$ 5.971,32	-	R\$ -	R\$ -	R\$ 5.971,32
4.4.1.2	ENSAIO DE GRANULOMETRIA POR PENEIRAMENTO E SEDIMENTAÇÃO - SOLOS	U	4,00	0,00		0,00	4,00	R\$ 176,57	R\$ 706,28	-	R\$ -	R\$ -	R\$ 706,28
4.4.1.3	ENSAIO DE MASSA ESPECIFICA - IN SITU - METODO FRASCO DE AREIA - SOLOS	U	104,00	0,00		0,00	91,00	R\$ 45,21	R\$ 4.701,84	-	R\$ 587,73	R\$ 587,73	R\$ 4.114,11
4.4.1.4	ENSAIO DE TEOR DE UNIDADE - EM LABORATORIO - SOLOS	U	54,00	0,00		0,00	41,00	R\$ 52,17	R\$ 2.817,18	-	R\$ 678,21	R\$ 678,21	R\$ 2.138,97
4.4.1.5	ENSAIO DE LIMITE DE LIQUIDEZ - SOLOS	U	54,00	0,00		0,00	41,00	R\$ 92,14	R\$ 4.975,56	-	R\$ 1.197,82	R\$ 1.197,82	R\$ 3.777,74
4.4.1.6	ENSAIO DE LIMITE DE PLASTICIDADE - SOLOS	U	54,00	0,00		0,00	41,00	R\$ 92,60	R\$ 5.000,40	-	R\$ 1.203,80	R\$ 1.203,80	R\$ 3.796,60

ITEM	DESCRIÇÃO	QUANTITATIVOS						VALORES					
		UNIDADE	QUANTITATIVO PREVISTO	ACUM. ANTERIOR	EXECUTADO REALIZADO	ACUM. FATURADO	SALDO A EXECUTAR	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL PREVISTO	ACUM. ANTERIOR	MEDIDO EXECUTADO	ACUM. FATURADO	SALDO A EXECUTAR
4.4.1.7	ENSAIO DE ÍNDICE DE SUPORTE CALIFORNIA - AMOSTRAS NÃO TRABALHADAS - ENERGIA NORMAL - SOLOS (BASEADO SINAPI 74022/019 - 05/2019)	UND	54,00	0,00		0,00	54,00	R\$ 271,06	R\$ 14.637,24	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 14.637,24
4.4.1.8	ENSAIO DE COMPACTAÇÃO - AMOSTRAS NÃO TRABALHADAS - ENERGIA NORMAL - SOLOS	U	54,00	0,00	13,00	13,00	41,00	R\$ 135,82	R\$ 7.334,28	R\$ -	R\$ 1.765,66	R\$ 1.765,66	R\$ 5.568,62
4.4.2	PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA												
4.4.2.1	REGULARIZAÇÃO - REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DO SUBLEITO	M2	27053,4	0,00		0,00	27.053,40	R\$ 3,20	R\$ 86.570,88	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 86.570,88
4.4.2.2	SUB-BASE ESTAB. GRANUL. ENERGIA PROCTOR INTERMED. - COM BRITA BICA CORRIDA (AGREGADO DE PEDREIRA)	M3	2784,663	0,00		0,00	2.784,66	R\$ 244,21	R\$ 680.042,55	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 680.042,55
4.4.2.3	BASE ESTAB. GRANUL., COMP. ENER. PROCTOR MODIF. - COM BRITA BICA CORRIDA (AGREGADO DE PEDREIRA)	M3	2828,543	0,00		0,00	2.828,54	R\$ 281,16	R\$ 738.179,96	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 738.179,96
4.4.2.4	CARGA DE MATERIAL DE QUALQUER NATUREZA SOBRE CAMINHÃO - MECÂNICA	m3	7294,5678	0,00		0,00	7.294,57	R\$ 3,58	R\$ 26.114,55	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 26.114,55
4.4.2.5	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM).	M3XKM	109418,517	0,00		0,00	109.418,52	R\$ 2,74	R\$ 299.806,73	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 299.806,73
4.4.2.6	Imprimação (Execução e fornecimento do material betuminoso, exclusive transporte do material betuminoso)	m2	18584,42	0,00		0,00	18.584,42	R\$ 4,96	R\$ 92.079,52	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 92.079,52
4.4.2.7	Pintura de ligação (Execução e fornecimento do material betuminoso, exclusive transporte do material betuminoso)	m2	18584,42	0,00		0,00	18.584,42	R\$ 2,63	R\$ 48.824,42	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 48.824,42
4.4.2.8	TRANSPORTE COM CAMINHÃO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO DE 30000 L, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020	TXKM	946,78542	0,00		0,00	946,79	R\$ 1,63	R\$ 1.543,26	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.543,26
4.4.2.9	TRANSPORTE COM CAMINHÃO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO DE 30000 L, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: TXKM).	TXKM	1485,92	0,00		0,00	1.485,92	R\$ 0,62	R\$ 927,47	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 927,47
4.4.2.10	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE ROLAMENTO - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019	M3	928,22	0,00		0,00	928,22	R\$ 2.085,90	R\$ 1.936.176,18	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.936.176,18
4.4.2.11	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: TXKM).	TXKM	66831,91	0,00		0,00	66.831,91	R\$ 1,63	R\$ 108.936,01	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 108.936,01
4.4.2.12	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020	TXKM	105594,421	0,00		0,00	105.594,42	R\$ 0,64	R\$ 67.580,42	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 67.580,42
4.4.3	PASSEIO												
4.4.3.1	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_08/2022	M3	529,79	0,00		0,00	529,79	R\$ 980,46	R\$ 519.436,72	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 519.436,72
4.4.3.2	REBAIXAMENTO DE PASSEIO PARA RAMPA DE ACESSO, COM ACABAMENTO DE SUPERFÍCIE DE CONCRETO - BASEADO EM ORSE (3644)	UN	36,00	0,00		0,00	36,00	R\$ 21,77	R\$ 783,72	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 783,72
4.4.4	SARJETA E MEIO FIO												
4.4.4.1	MEIO FIO E CORDÃO - PADRÃO SUDECAP - MEIO FIO EM CONCRETO PRE-MOLDADO FCK=20MPa, PADRÃO SUDECAP TIPO A, 30 X 14,2/12 (H X L/L2), COMPRIMENTO 80 CM	M	3569,19	0,00		0,00	3.569,19	R\$ 55,00	R\$ 196.305,45	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 196.305,45
4.4.4.2	SARJETA - PADRÃO SUDECAP - TIPO B - (50X10)CM - DES-R01	M	3406,61	0,00		0,00	3.406,61	R\$ 42,47	R\$ 144.678,72	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 144.678,72
4.4.5	VIA DE PEDESTRES												
4.4.5.1	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_08/2022	M3	27,92	0,00		0,00	27,92	R\$ 980,46	R\$ 27.374,44	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 27.374,44

ITEM	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QUANTITATIVO PREVISTO	QUANTITATIVOS		ACUM. FATURADO	SALDO A EXECUTAR	PREÇO UNITÁRIO	VALORES					
				ACUM. ANTERIOR	EXECUTADO REALIZADO				PREÇO TOTAL PREVISTO	ACUM. ANTERIOR	MÉDIO EXECUTADO	ACUM. FATURADO	SALDO A EXECUTAR	
4.5	CONTEÚNÇÕES													
4.5.1	MURO 1													
4.5.1.1	MURO DE FACE EM TELA METÁLICA DOBRADA EM L PARA SOLO REFORÇADO - C = 2,0 M, L = 0,5 M E H = 0,5 M - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M²	44,00	0,00		0,00	44,00	R\$ 723,38	R\$ 31.828,72	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 31.828,72	
4.5.1.2	GEOGRELHA TECIDA DE PVA (POLI ALCÓOL VINILICO) COM MODULO DE RIGIDEZ DE 6000KN/M A 5% DE DEFORMAÇÃO. FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO - BASEADO EM EMOP (06.100.0142-0)	M²	1346,00	0,00		0,00	1.346,00	R\$ 247,16	R\$ 332.677,36	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 332.677,36	
4.5.1.3	ENCHIMENTO COM PEDRA DE MÃO TIPO RACHÃO EM MURO PARA SOLO REFORÇADO. PARA MUROS COM ALTURA MAIOR QUE 4 M E MENOR OU IGUAL A 12 M FORNECIMENTO E EXECUÇÃO. AF_122015 - BASEADO EM SINAPI (92750)	M³	21,7	0,00		0,00	21,70	R\$ 512,30	R\$ 11.116,91	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 11.116,91	
4.5.2	MURO 2													
4.5.2.1	MURO DE FACE EM TELA METÁLICA DOBRADA EM L PARA SOLO REFORÇADO - C = 2,0 M, L = 0,5 M E H = 0,5 M - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M²	387,00	0,00		0,00	387,00	R\$ 723,38	R\$ 279.948,06	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 279.948,06	
4.5.2.2	GEOGRELHA TECIDA DE PVA (POLI ALCÓOL VINILICO) COM MODULO DE RIGIDEZ DE 6000KN/M A 5% DE DEFORMAÇÃO. FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO - BASEADO EM EMOP (06.100.0142-0)	M²	3937,00	0,00		0,00	3.937,00	R\$ 247,16	R\$ 973.068,92	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 973.068,92	
4.5.2.3	ENCHIMENTO COM PEDRA DE MÃO TIPO RACHÃO EM MURO PARA SOLO REFORÇADO. PARA MUROS COM ALTURA MAIOR QUE 4 M E MENOR OU IGUAL A 12 M FORNECIMENTO E EXECUÇÃO. AF_122015 - BASEADO EM SINAPI (92750)	M³	193,40	0,00		0,00	193,40	R\$ 512,30	R\$ 99.078,82	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 99.078,82	
4.5.3	MURO 3													
4.5.3.1	MURO DE FACE EM TELA METÁLICA DOBRADA EM L PARA SOLO REFORÇADO - C = 2,0 M, L = 0,5 M E H = 0,5 M - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M²	373,00	0,00		0,00	373,00	R\$ 723,38	R\$ 269.820,74	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 269.820,74	
4.5.3.2	GEOGRELHA TECIDA DE PVA (POLI ALCÓOL VINILICO) COM MODULO DE RIGIDEZ DE 6000KN/M A 5% DE DEFORMAÇÃO. FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO - BASEADO EM EMOP (06.100.0142-0)	M²	3999,00	0,00		0,00	3.999,00	R\$ 247,16	R\$ 988.392,84	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 988.392,84	
4.5.3.3	ENCHIMENTO COM PEDRA DE MÃO TIPO RACHÃO EM MURO PARA SOLO REFORÇADO. PARA MUROS COM ALTURA MAIOR QUE 4 M E MENOR OU IGUAL A 12 M FORNECIMENTO E EXECUÇÃO. AF_122015 - BASEADO EM SINAPI (92750)	M³	186,45	0,00		0,00	186,45	R\$ 512,30	R\$ 95.518,33	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 95.518,33	
4.5.4	MURO 4													
4.5.4.1	MURO DE FACE EM TELA METÁLICA DOBRADA EM L PARA SOLO REFORÇADO - C = 2,0 M, L = 0,5 M E H = 0,5 M - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M²	2173	0,00		0,00	2.173,00	R\$ 723,38	R\$ 1.571.904,74	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.571.904,74	
4.5.4.2	GEOGRELHA TECIDA DE PVA (POLI ALCÓOL VINILICO) COM MODULO DE RIGIDEZ DE 6000KN/M A 5% DE DEFORMAÇÃO. FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO - BASEADO EM EMOP (06.100.0142-0)	M²	8903,20	0,00		0,00	8.903,20	R\$ 247,16	R\$ 2.200.514,91	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 2.200.514,91	
4.5.4.3	ENCHIMENTO COM PEDRA DE MÃO TIPO RACHÃO EM MURO PARA SOLO REFORÇADO. PARA MUROS COM ALTURA MAIOR QUE 4 M E MENOR OU IGUAL A 12 M FORNECIMENTO E EXECUÇÃO. AF_122015 - BASEADO EM SINAPI (92750)	M³	1086,20	0,00		0,00	1.086,20	R\$ 512,30	R\$ 556.460,26	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 556.460,26	
4.5.5	MURO 5													
4.5.5.1	MURO DE FACE EM TELA METÁLICA DOBRADA EM L PARA SOLO REFORÇADO - C = 2,0 M, L = 0,5 M E H = 0,5 M - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M²	228,00	0,00		0,00	228,00	R\$ 723,38	R\$ 164.930,64	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 164.930,64	
4.5.5.2	GEOGRELHA TECIDA DE PVA (POLI ALCÓOL VINILICO) COM MODULO DE RIGIDEZ DE 6000KN/M A 5% DE DEFORMAÇÃO. FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO - BASEADO EM EMOP (06.100.0142-0)	M²	2102,00	0,00		0,00	2.102,00	R\$ 247,16	R\$ 519.530,32	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 519.530,32	

ITEM	DESCRIÇÃO	QUANTITATIVOS					VALORES						
		UNIDADE	QUANTITATIVO PREVISTO	ACUM. ANTERIOR	EXECUTADO REALIZADO	ACUM. FATURADO	SALDO A EXECUTAR	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL PREVISTO	ACUM. ANTERIOR	MEDIDO EXECUTADO	ACUM. FATURADO	SALDO A EXECUTAR
4.5.5.3	ENCHIMENTO COM PEDRA DE MÃO TIPO RACHÃO EM MURO PARA SOLO REFORÇADO, PARA MUROS COM ALTURA MAIOR QUE 4 M E MENOR OU IGUAL A 12 M FORNECIMENTO E EXECUÇÃO. AF_12/2015 - BASEADO EM SINAPI (92750)	M³	114,00	0,00		0,00	114,00	R\$ 512,30	R\$ 58.402,20	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 58.402,20
4.5.6	MURO 6												
4.5.6.1	MURO DE FACE EM TELA METÁLICA DOBRADA EM L PARA SOLO REFORÇADO - C = 2,0 M, L = 0,5 M E H = 0,5 M - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M²	339,00	0,00		0,00	339,00	R\$ 723,38	R\$ 245.225,82	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 245.225,82
4.5.6.2	GEOTÊXTIL TECIDA DE PVA (POLI ALCOL VINILICO) COM MÓDULO DE RIGIDEZ DE 8000KN/M A 5% DE DEFORMAÇÃO. FORNECIMENTO E COLOCACAO - BASEADO EM EMOP (06.100.0142-0)	M²	819,00	0,00		0,00	819,00	R\$ 247,16	R\$ 202.424,04	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 202.424,04
4.5.6.3	ENCHIMENTO COM PEDRA DE MÃO TIPO RACHÃO EM MURO PARA SOLO REFORÇADO, PARA MUROS COM ALTURA MAIOR QUE 4 M E MENOR OU IGUAL A 12 M FORNECIMENTO E EXECUÇÃO. AF_12/2015 - BASEADO EM SINAPI (92750)	M³	169,50	0,00		0,00	169,50	R\$ 512,30	R\$ 86.834,85	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 86.834,85
4.5.7	MURO 7												
4.5.7.1	CHUMBADOR DE AÇO CA-50 - D = 25 MM - ANCORADO NA ROCHA COM INJEÇÃO DE NATA DE CIMENTO - FORNECIMENTO, PERFURAÇÃO E INSTALAÇÃO - BASEADO EM SICRO (5605925)	M	2330,00	0,00		0,00	2.330,00	R\$ 147,85	R\$ 344.490,50	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 344.490,50
4.5.7.2	PROTEÇÃO DE TALUDES COM TELA Q-246 E GRAMPO DE ANCORAGEM, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - BASEADO EM SICRO (4413018)	KG	1308,30	0,00		0,00	1.308,30	R\$ 36,61	R\$ 47.896,86	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 47.896,86
4.5.7.3	CONCRETO PROJETADO VIA SECA FCK = 30 MPa APLICADO EM SUPERFÍCIES INCLINADAS E VERTICAIS	M³	101,64	0,00		0,00	101,64	R\$ 1.429,53	R\$ 145.297,42	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 145.297,42
4.5.7.4	DRENO BARBACÃ, DN 50 MM, COM MATERIAL DRENANTE. AF_07/2021	UN	175,00	0,00		0,00	175,00	R\$ 32,12	R\$ 5.621,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 5.621,00
4.5.7.5	DRENO BARBACÃ, DN 100 MM, COM MATERIAL DRENANTE. AF_07/2021	UN	59	0,00		0,00	59,00	R\$ 35,69	R\$ 2.105,71	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 2.105,71
4.5.8	MURO 8												
4.5.8.1	CHUMBADOR DE AÇO CA-50 - D = 25 MM - ANCORADO NA ROCHA COM INJEÇÃO DE NATA DE CIMENTO - FORNECIMENTO, PERFURAÇÃO E INSTALAÇÃO - BASEADO EM SICRO (5605925)	M	5515	0,00		0,00	5.515,00	R\$ 147,85	R\$ 815.392,75	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 815.392,75
4.5.8.2	PROTEÇÃO DE TALUDES COM TELA Q-246 E GRAMPO DE ANCORAGEM, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - BASEADO EM SICRO (4413018)	KG	3105	0,00		0,00	3.105,00	R\$ 36,61	R\$ 113.674,05	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 113.674,05
4.5.8.3	CONCRETO PROJETADO VIA SECA FCK = 30 MPa APLICADO EM SUPERFÍCIES INCLINADAS E VERTICAIS	M³	236,76	0,00		0,00	236,76	R\$ 1.429,53	R\$ 338.455,52	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 338.455,52
4.5.8.4	DRENO BARBACÃ, DN 50 MM, COM MATERIAL DRENANTE. AF_07/2021	UN	143	0,00		0,00	143,00	R\$ 32,12	R\$ 4.593,16	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 4.593,16
4.5.8.5	DRENO BARBACÃ, DN 100 MM, COM MATERIAL DRENANTE. AF_07/2021	UN	430	0,00		0,00	430,00	R\$ 35,69	R\$ 15.346,70	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 15.346,70
4.6	SINALIZAÇÃO VERTICAL E HORIZONTAL												
4.6.1	SINALIZAÇÃO VERTICAL												
4.6.1.1	Placa de aço carbono com película refletiva grau técnico tipo I da ABNT - Placa Circular (Execução, incluindo fornecimento e transporte de todos os materiais, inclusive poste de sustentação)	m2	1,374446786	0,00		0,00	1,37	R\$569,36	R\$ 782,55	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 782,55
4.6.1.2	Placa de aço carbono com película refletiva grau técnico tipo I da ABNT - Placa Octogonal (Execução, incluindo fornecimento e transporte de todos os materiais, inclusive poste de sustentação)	m2	7,689270186	0,00		0,00	7,69	R\$537,73	R\$ 4.134,75	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 4.134,75
4.6.1.3	Placa de aço carbono com película refletiva grau técnico tipo I da ABNT - Placa Quadrada (Execução, incluindo fornecimento e transporte de todos os materiais, inclusive poste de sustentação)	m2	0,405	0,00		0,00	0,41	R\$552,89	R\$ 223,92	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 223,92
4.6.2	SINALIZAÇÃO HORIZONTAL												
4.6.2.1	PINTURA DE FAIXA COM TINTA ACRILICA - ESPESURA DE 0,6 MM	M²	1064,32	0,00		0,00	1.064,32	R\$ 47,55	R\$ 50.608,41	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 50.608,41

ITEM	DESCRIÇÃO	QUANTITATIVOS					VALORES						
		UNIDADE	QUANTITATIVO PREVISITO	ACUM. ANTERIOR	EXECUTADO REALIZADO	ACUM. FATURADO	SALDO A EXECUTAR	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL PREVISITO	ACUM. ANTERIOR	MÉDIO EXECUTADO	ACUM. FATURADO	SALDO A EXECUTAR
4.6.2.2	Setas, símbolos e dizeres de resina acrílica 0,6mm de espessura (Execução, incluindo pré-marcção, fornecimento e transporte de todos os materiais)	m2	29,85	0,00		0,00	29,85	R\$ 46,44	R\$ 1.386,23	-	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.386,23
5	CASA TIPO 2 QUARTOS												
5.1	INFRAESTRUTURA												
5.1.1	ESTACAS												
5.1.1.1	EXECUÇÃO DE ESTACA TIPO HÉLICE CONTÍNUA, DIÂMETRO 600MM, EXCLUSIV. ARMAÇÃO E CONCRETO ESTRUTURAL	m	4752,00	0,00		0,00	4.752,00	R\$ 105,94	R\$ 503.426,88	-	R\$ -	R\$ -	R\$ 503.426,88
5.1.1.2	FORNECIMENTO DE CONCRETO ESTRUTURAL, USINADO BOMBADO, COM FCK 30 MPa, INCLUSIVE LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO (FUNDAÇÃO)	m3	1343,599488	0,00		0,00	1.343,60	R\$ 861,75	R\$ 1.157.846,85	-	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.157.846,85
5.1.1.3	CORTE, DOBRA E MONTAGEM DE AÇO CA-50/60	Kg	33240,0	0,00		0,00	33.240,00	R\$ 16,24	R\$ 539.817,60	-	R\$ -	R\$ -	R\$ 539.817,60
5.1.1.4	CARGA, MANOBR. E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 m³ - CARGA COM PÁ CARREGADEIRA (CAÇAMBA DE 1,7 A 2,8 m³ / 128 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3), AF_07/2020	M3	1746,6	0,00		0,00	1.746,60	R\$ 10,02	R\$ 17.500,93	-	R\$ -	R\$ -	R\$ 17.500,93
5.1.1.5	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 m³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM), AF_07/2020	M3XKM	26200,2	0,00		0,00	26.200,20	R\$ 2,74	R\$ 71.788,54	-	R\$ -	R\$ -	R\$ 71.788,54
5.1.1.6	ESPALHAMENTO DE MATERIAL COM TRATOR DE ESTEIRAS, AF_11/2019	M3	1746,6	0,00		0,00	1.746,60	R\$ 1,67	R\$ 2.916,82	-	R\$ -	R\$ -	R\$ 2.916,82
5.1.1.7	ARRASAMENTO MECANICO DE ESTACA DE CONCRETO ARMADO, DIÂMETROS DE ATÉ 40 CM, AF_05/2021	UN	720,0	0,00		0,00	720,00	R\$ 18,87	R\$ 13.586,40	-	R\$ -	R\$ -	R\$ 13.586,40
5.1.2	RADIER												
5.1.2.1	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,5M	m3	494,886	0,00		0,00	494,89	R\$ 74,15	R\$ 36.695,79	-	R\$ -	R\$ -	R\$ 36.695,79
5.1.2.2	COMPACTAÇÃO MECÂNICA DE SOLO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM COMPACTADOR DE SOLOS A PERCUSSÃO, AF_09/2021	M2	3534,9	0,00		0,00	3.534,90	R\$ 3,63	R\$ 12.831,68	-	R\$ -	R\$ -	R\$ 12.831,68
5.1.2.3	CAMADA SEPARADORA PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, EM LONA PLÁSTICA, AF_09/2021	M2	3534,9	0,00		0,00	3.534,90	R\$ 3,25	R\$ 11.488,42	-	R\$ -	R\$ -	R\$ 11.488,42
5.1.2.4	LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA N.1 E PEDRA BRITADA N.2), APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE 10 CM*, AF_07/2019	M3	353,49	0,00		0,00	353,49	R\$ 193,51	R\$ 68.403,84	-	R\$ -	R\$ -	R\$ 68.403,84
5.1.2.5	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, EM MADEIRA SERRADA, 4 UTILIZAÇÕES, AF_09/2021	M2	194,25	0,00		0,00	194,25	R\$ 169,77	R\$ 32.977,82	-	R\$ -	R\$ -	R\$ 32.977,82
5.1.2.6	ARMAÇÃO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM USO DE TELA Q-196, AF_09/2021	KG	27480	0,00		0,00	27.480,00	R\$ 22,17	R\$ 609.231,60	-	R\$ -	R\$ -	R\$ 609.231,60
5.1.2.7	FORNECIMENTO DE CONCRETO ESTRUTURAL, USINADO BOMBADO, COM FCK 25 MPa, INCLUSIVE LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO (FUNDAÇÃO)	m3	494,886	0,00		0,00	494,89	R\$ 837,20	R\$ 414.318,55	-	R\$ -	R\$ -	R\$ 414.318,55
5.1.2.8	CORTE, DOBRA E MONTAGEM DE AÇO CA-50/60	Kg	2763	0,00		0,00	2.763,00	R\$ 16,24	R\$ 44.871,12	-	R\$ -	R\$ -	R\$ 44.871,12
5.2	SUPERESTRUTURA												
5.2.1	PAREDES DE CONCRETO												
5.2.1.1	SISTEMA CONSTRUTIVO RACIONALIZADO (PAREDE DE CONCRETO)	M²	14364,6	0,00		0,00	14.364,60	R\$ 332,16	R\$ 4.771.345,53	-	R\$ -	R\$ -	R\$ 4.771.345,53

ITEM	DESCRIÇÃO	QUANTITATIVOS				VALORES							
		UNIDADE	QUANTITATIVO PREVISTO	ACUM. ANTERIOR	EXECUTADO REALIZADO	ACUM. FATURADO	SALDO A EXECUTAR	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL PREVISTO	ACUM. ANTERIOR	MEDIDO EXECUTADO	ACUM. FATURADO	SALDO A EXECUTAR
5.2.1.2	ESTUCAMENTO DE DENSIDADE BAIXA DE PANOS DE FACHADA DO SISTEMA DE PAREDES DE CONCRETO EM UNIDADES HABITACIONAIS DE DOIS PAVIMENTOS (SOBRADO), ACESSO COM PLATAFORMA, UTILIZAÇÃO DE ARGAMASSA COLANTE. AF_10/2022	M2	2872,92	0,00		0,00	2.872,92	R\$ 11,47	R\$ 32.952,39	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 32.952,39
5.2.2	LAJES												
5.2.2.1	SISTEMA CONSTRUTIVO RACIONALIZADO (PAREDE DE CONCRETO)	M²	5923,20	0,00		0,00	5.923,20	R\$ 332,16	R\$ 1.967.450,11	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.967.450,11
5.2.3	ESCALA PREMOLDADA												
5.2.3.1	ESCALA PRE-MOLDADA TIPO JACARÉ COM 15 DEGRAUS 28X18CM E 120CM DE LARGURA - BASEADO EM FDE (13.04.027)	M	30,00	0,00		0,00	30,00	R\$ 2.999,79	R\$ 89.993,70	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 89.993,70
5.3	ARQUITETURA												
5.3.1	PINTURA INTERNA												
5.3.1.1	APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014	M2	9689,40	0,00		0,00	9.689,40	R\$ 3,63	R\$ 35.172,52	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 35.172,52
5.3.1.2	EMASSAMENTO EM PAREDE COM MASSA CORRIDA (PVA), DUAS (2) DEMÃOS, INCLUSIVE LIXAMENTO PARA PINTURA	m2	10849,4	0,00		0,00	10.649,40	R\$ 19,23	R\$ 204.787,96	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 204.787,96
5.3.1.3	TEXTURA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_09/2016	M2	15997,08	0,00		0,00	15.997,08	R\$ 15,43	R\$ 246.834,94	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 246.834,94
5.3.2	PINTURA EXTERNA												
5.3.2.1	APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014	M2	7429,5	0,00		0,00	7.429,50	R\$ 3,63	R\$ 26.969,08	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 26.969,08
5.3.2.2	TEXTURA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_09/2016	M2	14859	0,00		0,00	14.859,00	R\$ 15,43	R\$ 229.274,37	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 229.274,37
5.3.3	REVESTIMENTO DE PAREDE												
5.3.3.1	REVESTIMENTO COM CERÂMICA APLICADO EM PAREDE, ACABAMENTO ESMALTADO, AMBIENTE INTERNO/EXTERNO, PADRÃO EXTRA, DIMENSÃO DA PEÇA ATÉ 2025 CM2, PEI III, ASSENTAMENTO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA, INCLUSIVE REJUNTAMENTO	m2	5730,84	0,00		0,00	5.730,84	R\$ 83,52	R\$ 478.639,75	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 478.639,75
5.3.4	PISO												
5.3.4.1	CONTRAPISO COM ARGAMASSA AUTONIVELANTE, APLICADO SOBRE LAJE, ADERIDO, ESPESSURA 3CM. AF_07/2021	M2	5215,2	0,00		0,00	5.215,20	R\$ 40,72	R\$ 212.362,94	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 212.362,94
5.3.4.2	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM ARGAMASSA POLIMÉRICA / MEMBRANA ACRÍLICA, 3 DEMÃOS. AF_06/2018	M2	2499,3	0,00		0,00	2.499,30	R\$ 30,44	R\$ 76.078,69	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 76.078,69
5.3.4.3	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 45X45 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA ENTRE 5 M2 E 10 M2. AF_06/2014	M2	5215,2	0,00		0,00	5.215,20	R\$ 69,43	R\$ 362.091,33	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 362.091,33
5.3.4.4	RODAPÉ CERÂMICO DE 7CM DE ALTURA COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 45X45CM. AF_06/2014	M	4368	0,00		0,00	4.368,00	R\$ 9,98	R\$ 43.592,64	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 43.592,64
5.3.5	TETO												
5.3.5.1	APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM TETO, UMA DEMÃO. AF_06/2014	M2	4265,40	0,00		0,00	4.265,40	R\$ 4,14	R\$ 17.658,75	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 17.658,75
5.3.5.2	EMASSAMENTO EM TETO COM MASSA CORRIDA (PVA), DUAS (2) DEMÃOS, INCLUSIVE LIXAMENTO PARA PINTURA	m2	4890,00	0,00		0,00	4.890,00	R\$ 32,70	R\$ 159.903,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 159.903,00
5.3.5.3	TEXTURA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, UMA DEMÃO. AF_09/2016	M2	8530,80	0,00		0,00	8.530,80	R\$ 18,40	R\$ 156.966,72	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 156.966,72

[Handwritten signature and initials]

ITEM	DESCRIÇÃO	QUANTITATIVOS					VALORES						
		UNIDADE	QUANTITATIVO PREVISTO	ACUM. ANTERIOR	EXECUTADO REALIZADO	ACUM. FATURADO	SALDO A EXECUTAR	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL PREVISTO	ACUM. ANTERIOR	MEDIDO EXECUTADO	ACUM. FATURADO	SALDO A EXECUTAR
5.3.5.4	FORRO EM CHAPA DE GESSO ACARTONADA RESISTENTE A UMIDADE, ESP. 12,5MM, COM FIXAÇÃO DO TIPO ESTRUTURADA EM PERFIL METÁLICO, EXCLUSIVE PERFIL TABICA, SANCA E MOLDURA, INCLUSIVE ACESSÓRIOS E FIXAÇÃO - BASEADO EM SETOP (ED-49686)	M²	624.60	0,00		0,00	624.60	R\$ 93,03	R\$ 58.106,53	R\$ -	-	R\$ -	R\$ 58.106,53
5.3.5.5	PREPARAÇÃO PARA EMASSAMENTO OU PINTURA (LÁTEX/ACRILICA) EM PAREDE, INCLUSIVE UMA (1) DEMÃO DE SELADOR ACRILICO	m2	624.60	0,00		0,00	624.60	R\$ 6.99	R\$ 4.365,95	R\$ -	-	R\$ -	R\$ 4.365,95
5.3.5.6	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRILICA EM TETO, DUAS DEMÃOS, AF_06/2014	M2	624.60	0,00		0,00	624.60	R\$ 19.36	R\$ 12.092,25	R\$ -	-	R\$ -	R\$ 12.092,25
5.3.6	SHAFT			0,00									
5.3.6.1	FECHAMENTO DOS SHAFTS EM SISTEMA DE PAREDE DRYWALL COM UMA LINHA DE PERFIL E FECHAMENTO EM PLACA CIMENTICA-BASADO EM SINAPI (96366)	M²	358.32	0,00		0,00	358.32	R\$ 298,13	R\$ 106.825,94	R\$ -	-	R\$ -	R\$ 106.825,94
5.3.7	PEDRAS (SOLEIRA, BANCADAS, CHAPIM, ETC)												
5.3.7.1	BANCADA EM GRANITO CINZA ANDORINHA E = 3 CM, APOIADA EM CONSOL DE METALON 20 X 30 MM	m2	72.00	0,00		0,00	72.00	R\$ 424,44	R\$ 30.559,68	R\$ -	-	R\$ -	R\$ 30.559,68
5.3.7.2	BANCADA EM GRANITO CINZA ANDORINHA E = 3 CM, APOIADA EM ALVENARIA	m2	46.60	0,00		0,00	46.60	R\$ 396.80	R\$ 18.490,88	R\$ -	-	R\$ -	R\$ 18.490,98
5.3.7.3	SOLEIRA EM GRANITO, LARGURA 15 CM, ESPESURA 2,0 CM, AF_09/2020	M	696.00	0,00		0,00	696.00	R\$ 96,43	R\$ 67.115,28	R\$ -	-	R\$ -	R\$ 67.115,28
5.3.7.4	PEITORIL DE GRANITO CINZA ANDORINHA E = 3 CM	m2	69.12	0,00		0,00	69.12	R\$ 337,24	R\$ 23.310,02	R\$ -	-	R\$ -	R\$ 23.310,02
5.3.8	PORTAS												
5.3.8.1	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA VERNIZ, SEMI-OCA (LEVE OU MEDIA), PADRÃO MEDIO, 60x210cm, ESPESSURA DE 3,5cm, ITENS INCLUIDOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_12/2019	UN	240.00	0,00		0,00	240.00	R\$ 1.230,16	R\$ 295.238,40	R\$ -	-	R\$ -	R\$ 295.238,40
5.3.8.2	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA VERNIZ, SEMI-OCA (LEVE OU MEDIA), PADRÃO MEDIO, 70x210cm, ESPESSURA DE 3,5cm, ITENS INCLUIDOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_12/2019	UN	360.00	0,00		0,00	360.00	R\$ 1.242,15	R\$ 447.174,00	R\$ -	-	R\$ -	R\$ 447.174,00
5.3.8.3	KIT DE PORTA DE MADEIRA FRISADA, SEMI-OCA (LEVE OU MEDIA), PADRÃO MEDIO, 80x210cm, ESPESSURA DE 3,5cm, ITENS INCLUIDOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_12/2019	UN	120.00	0,00		0,00	120.00	R\$ 1.344,58	R\$ 161.349,60	R\$ -	-	R\$ -	R\$ 161.349,60
5.3.8.4	FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE PORTA EM ALUMÍNIO, TIPO VENEZIANA E VIDRO, DE ABRIR, ACABAMENTO ANODIZADO NATURAL, INCLUSIVE FECHADURA E MARCO - BASEADO EM SETOP (ED-7576)	M²	201.60	0,00		0,00	201.60	R\$ 967,26	R\$ 192.983,61	R\$ -	-	R\$ -	R\$ 192.983,61
5.3.8.5	PORTA DE CORRER DE ALUMÍNIO, COM DUAS FOLHAS PARA VIDRO, INCLUSO VIDRO LISO INCOLOR, FECHADURA E PUXADOR, SEM ALIZAR, AF_12/2019	M2	105.60	0,00		0,00	105.60	R\$ 487,57	R\$ 51.487,39	R\$ -	-	R\$ -	R\$ 51.487,39
5.3.8.6	PINTURA VERNIZ (INCOLOR) ALQUIDICO EM MADEIRA, USO INTERNO E EXTERNO, 2 DEMÃOS, AF_01/2021	M2	2494.80	0,00		0,00	2.494.80	R\$ 24,15	R\$ 60.249,42	R\$ -	-	R\$ -	R\$ 60.249,42
5.3.9	JANELAS												
5.3.9.1	JANELA DE ALUMÍNIO TIPO MAXIMAR, COM VIDROS, BATENTE E FERRAGENS, EXCLUSIVE ALIZAR, ACABAMENTO E CONTRAMARCO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_12/2019	M2	43.20	0,00		0,00	43.20	R\$ 613,79	R\$ 26.515,72	R\$ -	-	R\$ -	R\$ 26.515,72
5.3.9.2	JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 2 FOLHAS PARA VIDROS, COM VIDROS, BATENTE, ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE E FERRAGENS, EXCLUSIVE ALIZAR E CONTRAMARCO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_12/2019	M2	518.40	0,00		0,00	518.40	R\$ 313,24	R\$ 162.383,61	R\$ -	-	R\$ -	R\$ 162.383,61

ITEM	DESCRIÇÃO	QUANTITATIVOS					VALORES						
		UNIDADE	QUANTITATIVO PREVISTO	ACUM. ANTERIOR	EXECUTADO REALIZADO	ACUM. FATURADO	SALDO A EXECUTAR	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL PREVISTO	ACUM. ANTERIOR	MEDIDO EXECUTADO	ACUM. FATURADO	SALDO A EXECUTAR
5.3.9.3	JANELA FIXA DE ALUMÍNIO PARA VIDRO, COM VIDRO, BATENTE E FERRAGENS, EXCLUSIVE ACABAMENTO, ALIZAR E CONTRAMARCO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	M2	43,20	0,00		0,00	43,20	R\$ 644,60	R\$ 27.846,72	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 27.846,72
5.3.10	ESPELHOS												
5.3.10.1	ESPELHO CRISTAL, DIMENSÃO 60X90CM, COM ESP. 4MM, EM ACABAMENTO LAPIDADO, INCLUSIVE FIXAÇÃO COM PARAFUSO TIPO FINESSE, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	un	120,00	0,00		0,00	120,00	R\$ 287,31	R\$ 34.477,20	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 34.477,20
5.3.11	METAIS												
5.3.11.1	CUBA DE EMBUTIR RETANGULAR DE AÇO INOXIDÁVEL, 46 X 30 X 12 CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	120,00	0,00		0,00	120,00	R\$ 246,89	R\$ 29.626,80	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 29.626,80
5.3.11.2	TORNEIRA CROMADA TUBO MÓVEL, DE MESA, 1/2 OU 3/4, PARA PIA DE COZINHA, PADRÃO ALTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	120,00	0,00		0,00	120,00	R\$ 124,20	R\$ 14.904,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 14.904,00
5.3.12	LOUÇAS												
5.3.12.1	VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA - PADRÃO MÉDIO, INCLUSO ENGATE FLEXÍVEL EM METAL CROMADO, 1/2 X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	120,00	0,00		0,00	120,00	R\$ 643,19	R\$ 77.182,80	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 77.182,80
5.3.12.2	LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA COM COLUNA, 45 X 55CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO MÉDIO, INCLUSO SIFÃO TIPO GARRAFA, VÁLVULA E ENGATE FLEXÍVEL DE 40CM EM METAL CROMADO, COM TORNEIRA CROMADA DE MESA, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	120,00	0,00		0,00	120,00	R\$ 1.037,83	R\$ 124.539,60	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 124.539,60
5.3.12.3	CHUVEIRO ELÉTRICO COMUM CORPO PLÁSTICO, TIPO DUCHA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	120,00	0,00		0,00	120,00	R\$ 107,25	R\$ 12.870,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 12.870,00
5.3.12.4	TANQUE DE LOUÇA BRANCA COM COLUNA, 30L OU EQUIVALENTE, INCLUSO SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, VÁLVULA PLÁSTICA E TORNEIRA DE METAL CROMADO PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	120,00	0,00		0,00	120,00	R\$ 939,16	R\$ 112.699,20	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 112.699,20
5.3.13	GUARDA CORPO E CORRIMÃO												
5.3.13.1	CORRIMÃO SIMPLES, DIÂMETRO EXTERNO = 1 1/2, EM ALUMÍNIO. AF_04/2019_PS	M	312,00	0,00		0,00	312,00	R\$ 121,28	R\$ 37.839,36	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 37.839,36
5.3.13.2	GUARDA-CORPO DE AÇO GALVANIZADO DE 1,10M DE ALTURA, MONTANTES TUBULARES DE 1,1/2" ESPAÇADOS DE 1,20M, TRAVESSA SUPERIOR DE 2", GRADIL FORMADO POR BARRAS CHATAS EM FERRO DE 32X4,8MM, FIXADO COM CHUMBADOR MECÂNICO. AF_04/2019_PS	M	375,00	0,00		0,00	375,00	R\$ 600,46	R\$ 225.172,50	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 225.172,50
5.3.14	ÁREA EXTERNA												
5.3.14.1	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS VAZADOS DE CONCRETO APARENTE DE 14X19X39 CM (ESPESSURA 14 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_12/2021	M2	501,00	0,00		0,00	501,00	R\$ 123,48	R\$ 61.863,48	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 61.863,48
5.3.14.2	PLANTIO DE GRAMA ESMERALDA OU SÃO CARLOS OU CURITIBANA, EM PLACAS. AF_05/2022	M2	438,60	0,00		0,00	438,60	R\$ 21,41	R\$ 9.390,42	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 9.390,42
5.3.14.3	PINTURA DE DEMARCAÇÃO DE VAGA COM TINTA ACRÍLICA, E = 10 CM, APLICAÇÃO MANUAL. AF_09/2021	M	1350,00	0,00		0,00	1.350,00	R\$ 4,80	R\$ 6.480,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 6.480,00
5.3.14.4	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM. AF_10/2022	M2	1446,00	0,00		0,00	1.446,00	R\$ 72,19	R\$ 104.386,74	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 104.386,74
5.3.14.5	CARGA DE MATERIAL DE QUALQUER NATUREZA SOBRE CAMINHÃO - MECÂNICA. AF_07/2020	m3	173,52	0,00		0,00	173,52	R\$ 3,58	R\$ 621,20	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 621,20
5.3.14.6	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	2602,80	0,00		0,00	2.602,80	R\$ 2,74	R\$ 7.131,67	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 7.131,67
5.4	COBERTURA METÁLICA												
5.4.1	COBERTURA METÁLICA												

ITEM	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QUANTITATIVO PREVISTO	QUANTITATIVOS			VALORES				
				ACUM. EXECUTADO REALIZADO	ACUM. FATURADO	SALDO A EXECUTAR	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL PREVISTO	ACUM. ANTERIOR	MEDIDO EXECUTADO	ACUM. FATURADO
	FORNECIMENTO DE ESTRUTURA METÁLICA E ENGRADAMENTO METÁLICO, EM AÇO, PARA TELHADO, EXCLUSIVE TELHA, INCLUSIVE FABRICAÇÃO, TRANSPORTE, MONTAGEM E APLICAÇÃO DE FUNDO PREPARADOR ANTICORROSIVO EM SUPERFÍCIE METÁLICA, UMA (1) DEMÃO	Kg	18626,40	0,00		18.626,40	R\$ 27,63	R\$ 514.647,43	-	-	R\$ 514.647,43
5.4.1.2	SERVIÇO GALVANIZAÇÃO A FOGO - ESTRUTURAS / ESQUADRIAS - BASEADO EM FDE (15.80.080)	KG	18626,40	0,00		18.626,40	R\$ 5,31	R\$ 98.906,18	-	-	R\$ 98.906,18
5.4.1.3	CUMEIRA PARA TELHA DE FIBROCIMENTO ESTRUTURAL E = 6 MM, INCLUSO ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO E ICAMENTO, AF_07/2019	M	390,00	0,00		390,00	R\$ 100,54	R\$ 39.210,60	-	-	R\$ 39.210,60
5.4.1.4	TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E = 6 MM, COM RECOBRIMENTO LATERAL DE 1/4 DE ONDA PARA TELHADO COM INCLINAÇÃO MAIOR QUE 10°, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO ICAMENTO, AF_07/2019	M2	3902,40	0,00		3.902,40	R\$ 50,95	R\$ 198.827,28	-	-	R\$ 198.827,28
6	CASA TIPO 3 QUARTOS										
6.1	INFRAESTRUTURA										
6.1.1	ESTACAS										
6.1.1.1	EXECUÇÃO DE ESTACA TIPO HÉLICE CONTÍNUA, DIÂMETRO 800MM, EXCLUSIVE ARMAÇÃO E CONCRETO ESTRUTURAL	m	8236,80	0,00		8.236,80	R\$ 105,94	R\$ 872.606,59	-	-	R\$ 872.606,59
6.1.1.2	FORNECIMENTO DE CONCRETO ESTRUTURAL, USINADO BOMBADO, COM FCK 30 MPa, INCLUSIVE LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO (FUNDAÇÃO)	m3	2328,91	0,00		2.328,91	R\$ 861,75	R\$ 2.006.934,55	-	-	R\$ 2.006.934,55
6.1.1.3	CORTE, DOBRA E MONTAGEM DE AÇO CA-50/60	Kg	57616,00	0,00		57.616,00	R\$ 16,24	R\$ 935.683,84	-	-	R\$ 935.683,84
6.1.1.4	CARGA, MANOBRAS E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM PÁ CARREGADEIRA (CAÇAMBA DE 1,7 A 2,8 M³ / 128 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3), AF_07/2020	M3	3027,44	0,00		3.027,44	R\$ 10,02	R\$ 30.334,94	-	-	R\$ 30.334,94
6.1.1.5	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: MAXKM), AF_07/2020	MAXKM	45413,68	0,00		45.413,68	R\$ 2,74	R\$ 124.433,48	-	-	R\$ 124.433,48
6.1.1.6	ESPALHAMENTO DE MATERIAL COM TRATOR DE ESTEIRAS, AF_11/2019	M3	3027,44	0,00		3.027,44	R\$ 1,67	R\$ 5.055,82	-	-	R\$ 5.055,82
6.1.1.7	ARRASAMENTO MECÂNICO DE ESTACA DE CONCRETO ARMADO, DIÂMETROS DE ATÉ 40 CM, AF_05/2021	UN	1248,00	0,00		1.248,00	R\$ 18,87	R\$ 23.549,76	-	-	R\$ 23.549,76
6.1.2	RADIER										
6.1.2.1	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,5M	m3	1175,79	0,00		1.175,79	R\$ 74,15	R\$ 87.185,03	-	-	R\$ 87.185,03
6.1.2.2	COMPACTAÇÃO MECÂNICA DE SOLO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM COMPACTADOR DE SOLOS A PERCUSSÃO, AF_09/2021	M2	8398,52	0,00		8.398,52	R\$ 3,63	R\$ 30.486,62	-	-	R\$ 30.486,62
6.1.2.3	CAMADA SEPARADORA PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, EM LONA PLÁSTICA, AF_09/2021	M2	8398,52	0,00		8.398,52	R\$ 3,25	R\$ 27.295,19	-	-	R\$ 27.295,19
6.1.2.4	LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA N.1 E PEDRA BRITADA N.2), APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESURA DE 10 CM, AF_07/2019	M3	839,852	0,00		839,85	R\$ 193,51	R\$ 162.519,76	-	-	R\$ 162.519,76
6.1.2.5	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, EM MADEIRA SERRADA, 4 UTILIZAÇÕES, AF_09/2021	M2	411,9752	0,00		411,98	R\$ 169,77	R\$ 69.941,02	-	-	R\$ 69.941,02
6.1.2.6	ARMAÇÃO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM USO DE TELA Q-196, AF_09/2021	KG	71396,00	0,00		71.396,00	R\$ 22,17	R\$ 1.582.849,32	-	-	R\$ 1.582.849,32
6.1.2.7	FORNECIMENTO DE CONCRETO ESTRUTURAL, USINADO BOMBADO, COM FCK 25 MPa, INCLUSIVE LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO (FUNDAÇÃO)	m3	1175,79	0,00		1.175,79	R\$ 837,20	R\$ 984.373,73	-	-	R\$ 984.373,73
6.1.2.8	CORTE, DOBRA E MONTAGEM DE AÇO CA-50/60	Kg	6380,40	0,00		6.380,40	R\$ 16,24	R\$ 103.617,69	-	-	R\$ 103.617,69

ITEM	DESCRIÇÃO	QUANTITATIVOS				VALORES							
		UNIDADE	QUANTITATIVO PREVISTO	ACUM. ANTERIOR	EXECUTADO REALIZADO	ACUM. FATURADO	SALDO A EXECUTAR	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL PREVISTO	ACUM. ANTERIOR	MEDIDO EXECUTADO	ACUM. FATURADO	SALDO A EXECUTAR
6.2	SUPERESTRUTURA												
6.2.1	PAREDES DE CONCRETO												
6.2.1.1	SISTEMA CONSTRUTIVO RACIONALIZADO (PAREDE DE CONCRETO)	M²	40115,92	0,00		0,00	40.115,92	R\$ 332,16	R\$ 13.324.903,98	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 13.324.903,98
6.2.1.2	ESTUCAMENTO DE DENSIDADE BAIXA DE PANOS DE FACHADA DO SISTEMA DE PAREDES DE CONCRETO EM UNIDADES HABITACIONAIS DE DOIS PAVIMENTOS (SOBRADO). ACESSO COM PLATAFORMA, UTILIZAÇÃO DE ARGAMASSA COLANTE. AF_10/2022	M2	8023,18	0,00		0,00	8.023,18	R\$ 11,47	R\$ 92.025,92	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 92.025,92
6.2.2	LAJES												
6.2.2.1	SISTEMA CONSTRUTIVO RACIONALIZADO (PAREDE DE CONCRETO)	M²	14791,92	0,00		0,00	14.791,92	R\$ 332,16	R\$ 4.913.284,14	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 4.913.284,14
6.2.3	ESCALA PREMOLDADA												
6.2.3.1	ESCALA PRE-MOLDADA TIPO JACARÉ COM 15 DEGRAUS 28X18CM E 120CM DE LARGURA - BASEADO EM FDE (13.04.027)	M	52,00	0,00		0,00	52,00	R\$ 2.999,79	R\$ 155.989,08	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 155.989,08
6.3	ARQUITETURA												
6.3.1	PINTURA INTERNA												
6.3.1.1	APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014	M2	22487,30	0,00		0,00	22.487,30	R\$ 3,63	R\$ 81.628,89	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 81.628,89
6.3.1.2	EMASSAMENTO EM PAREDE COM MASSA CORRIDA (PVA), DUAS (2) DEMÃOS, INCLUSIVE LIXAMENTO PARA PINTURA	m2	24151,30	0,00		0,00	24.151,30	19,22999963	R\$ 464.429,49	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 464.429,49
6.3.1.3	TEXTURA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_09/2016	M2	44677,15	0,00		0,00	44.677,15	R\$ 15,43	R\$ 689.368,42	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 689.368,42
6.3.2	PINTURA EXTERNA												
6.3.2.1	APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014	M2	13561,29	0,00		0,00	13.561,29	R\$ 3,63	R\$ 49.227,48	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 49.227,48
6.3.2.2	TEXTURA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_09/2016	M2	27122,58	0,00		0,00	27.122,58	R\$ 15,43	R\$ 418.501,40	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 418.501,40
6.3.3	REVESTIMENTO DE PAREDE												
6.3.3.1	REVESTIMENTO COM CERÂMICA APLICADO EM PAREDE, ACABAMENTO ESMALTADO, AMBIENTE INTERNO/EXTERNO, PADRÃO EXTRA, DIMENSÃO DA PEÇA ATÉ 2025 CM2, PEI III, ASSENTAMENTO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA, INCLUSIVE REJUNTAMENTO	m2	14540,45	0,00		0,00	14.540,45	R\$ 83,52	R\$ 1.214.418,38	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.214.418,38
6.3.4	PISO												
6.3.4.1	CONTRAPISO COM ARGAMASSA AUTONIVELANTE, APLICADO SOBRE LAJE, ADERIDO, ESPESURA 3CM. AF_07/2021	M2	12821,12	0,00		0,00	12.821,12	R\$ 40,72	R\$ 522.076,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 522.076,00
6.3.4.2	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM ARGAMASSA POLIMÉRICA / MEMBRANA ACRÍLICA, 3 DEMÃOS. AF_06/2018	M2	6527,04	0,00		0,00	6.527,04	R\$ 30,44	R\$ 198.683,09	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 198.683,09
6.3.4.3	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 45X45 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA ENTRE 5 M2 E 10 M2. AF_06/2014	M2	12821,12	0,00		0,00	12.821,12	R\$ 69,43	R\$ 890.170,36	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 890.170,36
6.3.4.4	RODAPÉ CERÂMICO DE 7CM DE ALTURA COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 45X45CM. AF_06/2014	M	10939,56	0,00		0,00	10.939,56	R\$ 9,98	R\$ 109.176,80	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 109.176,80
6.3.5	TETO												
6.3.5.1	APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM TETO, UMA DEMÃO. AF_06/2014	M2	10308,48	0,00		0,00	10.308,48	R\$ 4,14	R\$ 42.677,10	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 42.677,10
6.3.5.2	EMASSAMENTO EM TETO COM MASSA CORRIDA (PVA), DUAS (2) DEMÃOS, INCLUSIVE LIXAMENTO PARA PINTURA	m2	12209,6	0,00		0,00	12.209,60	R\$ 32,70	R\$ 399.253,92	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 399.253,92
6.3.5.3	TEXTURA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, UMA DEMÃO. AF_09/2016	M2	20616,96	0,00		0,00	20.616,96	R\$ 18,40	R\$ 379.352,06	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 379.352,06

ITEM	DESCRIÇÃO	QUANTITATIVOS					VALORES						
		UNIDADE	QUANTITATIVO PREVISTO	ACUM. ANTERIOR	EXECUTADO REALIZADO	ACUM. FATURADO	SALDO A EXECUTAR	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL PREVISTO	ACUM. ANTERIOR	MÉDIO EXECUTADO	ACUM. FATURADO	SALDO A EXECUTAR
6.3.5.4	FORRO EM CHAPA DE GESSO ACRTONADA RESISTENTE A UNIDADE, ESP. 12,5MM, COM FIXAÇÃO DO TIPO ESTRUTURADA EM PERFIL METÁLICO, EXCLUSIVE PERFIL TABICA, SANCA E MOLDURA, INCLUSIVE ACESSÓRIOS E FIXAÇÃO - BASEADO EM SETOP (ED-498989)	M²	1901,12	0,00		0,00	1.901,12	R\$ 93,03	R\$ 176.861,19	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 176.861,19
6.3.5.5	PREPARAÇÃO PARA EMASSAMENTO OU PINTURA (LÁTEX/ACRÍLICA) EM PAREDE, INCLUSIVE UMA (1) DEMÃO DE SELADOR ACRÍLICO	m2	1901,12	0,00		0,00	1.901,12	R\$ 6,99	R\$ 13.288,82	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 13.288,82
6.3.5.6	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM TETO, DUAS DEMÃOS, AF_06/2014	M2	1901,12	0,00		0,00	1.901,12	R\$ 19,36	R\$ 36.805,68	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 36.805,68
6.3.6	SHAFT												
6.3.6.1	FECHAMENTO DOS SHAFTS EM SISTEMA DE PAREDE DRYWALL COM UMA LINHA DE PERFIL E FECHAMENTO EM PLACA CIMENTÍCA-BASEADO EM SINAPI (963665)	M²	1135,68	0,00		0,00	1.135,68	R\$ 288,13	R\$ 338.580,27	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 338.580,27
6.3.7	PEDRAS (SOLEIRA, BANCADAS, CHAPIM, ETC)												
6.3.7.1	BANCAOA EM GRANITO CINZA ANDORINHA E = 3 CM, APOIADA EM CONSOLE DE METALON 20 X 30 MM	m2	124,80	0,00		0,00	124,80	R\$ 424,44	R\$ 52.970,11	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 52.970,11
6.3.7.2	BANCAODA EM GRANITO CINZA ANDORINHA E = 3 CM, APOIADA EM ALVENARIA	m2	81,12	0,00		0,00	81,12	R\$ 386,80	R\$ 32.188,41	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 32.188,41
6.3.7.3	SOLEIRA EM GRANITO, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM, AF_09/2020	M	1206,4	0,00		0,00	1.206,40	R\$ 96,43	R\$ 116.333,15	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 116.333,15
6.3.7.4	PETTORIL DE GRANITO CINZA ANDORINHA E = 3 CM	m2	149,76	0,00		0,00	149,76	R\$ 337,24	R\$ 50.505,06	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 50.505,06
6.3.8	PORTAS												
6.3.8.1	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA VERNIZ, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 80x210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_12/2019	UN	416,00	0,00		0,00	416,00	R\$ 1.230,16	R\$ 511.746,56	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 511.746,56
6.3.8.2	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA VERNIZ, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 70x210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_12/2019	UN	624,00	0,00		0,00	624,00	R\$ 1.242,15	R\$ 775.101,60	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 775.101,60
6.3.8.3	KIT DE PORTA DE MADEIRA FRISADA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 80x210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_12/2019	UN	208,00	0,00		0,00	208,00	R\$ 1.344,58	R\$ 279.672,64	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 279.672,64
6.3.8.4	FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE PORTA EM ALUMÍNIO, TIPO VENEZIANA E VIDRO, DE ABRIR, ACABAMENTO ANODIZADO NATURAL, INCLUSIVE FECHADURA E MARCO - BASEADO EM SETOP (ED-7576)	M²	349,44	0,00		0,00	349,44	R\$ 957,26	R\$ 334.504,93	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 334.504,93
6.3.8.5	PORTA DE CORRER DE ALUMÍNIO, COM DUAS FOLHAS PARA VIDRO, INCLUSO VIDRO LISO INCOLOR, FECHADURA E PUXADOR, SEM ALIZAR, AF_12/2019	M2	411,84	0,00		0,00	411,84	R\$ 487,57	R\$ 200.800,82	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 200.800,82
6.3.8.6	PINTURA VERNIZ (INCOLOR) ALOUIDICO EM MADEIRA, USO INTERNO E EXTERNO, 2 DEMÃOS, AF_07/2021	M2	4.324,32	0,00		0,00	4.324,32	R\$ 24,15	R\$ 104.432,32	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 104.432,32
6.3.9	JANELAS												
6.3.9.1	JANELA DE ALUMÍNIO TIPO MAXIMAR, COM VIDROS, BATENTE E FERRAGENS, EXCLUSIVE ALIZAR, ACABAMENTO E CONTRAMARCO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_12/2019	M2	149,76	0,00		0,00	149,76	R\$ 613,79	R\$ 91.921,19	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 91.921,19
6.3.9.2	JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 2 FOLHAS PARA VIDROS, COM VIDROS, BATENTE, ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE E FERRAGENS, EXCLUSIVE ALIZAR E CONTRAMARCO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_12/2019	M2	1.048,32	0,00		0,00	1.048,32	R\$ 313,24	R\$ 328.375,75	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 328.375,75

ITEM	DESCRIÇÃO	QUANTITATIVOS					VALORES					SALDO A EXECUTAR
		UNIDADE	QUANTITATIVO PREVISTO	ACUM. ANTERIOR	EXECUTADO REALIZADO	ACUM. FATURADO	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL PREVISTO	ACUM. ANTERIOR	MÉDIO EXECUTADO	ACUM. FATURADO	SALDO A EXECUTAR
6.3.9.3	JANELA FIXA DE ALUMÍNIO PARA VIDRO, COM VIDRO, BATENTE E FERRAGENS, EXCLUSIVE ACABAMENTO, ALIZAR E CONTRAMARCO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 12/2019	M2	74,88	0,00		0,00	R\$ 644,80	R\$ 48.267,64	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 48.267,64
6.3.10	ESPELHOS											
6.3.10.1	ESPELHO CRISTAL, DIMENSÃO (60X90)CM, COM ESP. 4MM, EM ACABAMENTO LAPIDADO, INCLUSIVE FIXAÇÃO COM PARAFUSO TIPO FINESSEON, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	un	416,00	0,00		0,00	R\$ 287,31	R\$ 119.520,96	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 119.520,96
6.3.11	METAIS											
6.3.11.1	CUBA DE EMBUTIR RETANGULAR DE AÇO INOXIDÁVEL, 46 X 30 X 12 CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 01/2020	UN	208,00	0,00		0,00	R\$ 246,89	R\$ 51.353,12	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 51.353,12
6.3.11.2	TORNEIRA CROMADA TUBO MOVEL, DE MESA, 1/2 OU 3/4, PARA PIA DE COZINHA, PADRÃO ALTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 01/2020	UN	208,00	0,00		0,00	R\$ 124,20	R\$ 25.833,60	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 25.833,60
6.3.12	LOUÇAS											
6.3.12.1	VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA - PADRÃO MÉDIO, INCLUSO ENGATE FLEXÍVEL EM METAL CROMADO, 1/2 X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 01/2020	UN	416,00	0,00		0,00	R\$ 643,19	R\$ 267.567,04	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 267.567,04
6.3.12.2	LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA COM COLUNA, 45 X 55CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO MÉDIO, INCLUSO SIFÃO TIPO GARRAFA, VÁLVULA E ENGATE FLEXÍVEL DE 40CM EM METAL CROMADO, COM TORNEIRA CROMADA DE MESA, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 01/2020	UN	416,00	0,00		0,00	R\$ 1.037,83	R\$ 431.737,28	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 431.737,28
6.3.12.3	CHUVEIRO ELÉTRICO COMUM CORPO PLÁSTICO, TIPO DUCHA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 01/2020	UN	416,00	0,00		0,00	R\$ 107,25	R\$ 44.616,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 44.616,00
6.3.12.4	TANQUE DE LOUÇA BRANCA COM COLUNA, 30L OU EQUIVALENTE, INCLUSO SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, VÁLVULA PLÁSTICA E TORNEIRA DE METAL CROMADO PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 01/2020	UN	208,00	0,00		0,00	R\$ 939,16	R\$ 195.345,28	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 195.345,28
6.3.13	GUARDA CORPO E CORRIMÃO											
6.3.13.1	CORRIMÃO SIMPLES, DIÂMETRO EXTERNO = 1 1/2, EM ALUMÍNIO. AF. 04/2019 PS	M	540,80	0,00		0,00	R\$ 121,28	R\$ 65.588,22	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 65.588,22
6.3.13.2	GUARDA-CORPO DE AÇO GALVANIZADO DE 1,0M DE ALTURA, MONTANTES TUBULARES DE 1 1/2" ESPAÇADOS DE 1,20M, TRAVESSA SUPERIOR DE 2", GRADIL FORMADO POR BARRAS CHATAS EM FERRO DE 32X4,8MM, FIXADO COM CHUMBADOR MECÂNICO. AF. 04/2019 PS	M	814,32	0,00		0,00	R\$ 600,46	R\$ 488.966,58	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 488.966,58
6.3.14	ÁREA EXTERNA											
6.3.14.1	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS VAZADOS DE CONCRETO APARENTE DE 14X19X39 CM (ESPESURA 14 CM) E ARGAMASSA DE ASCENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF. 12/2021	M2	921,44	0,00		0,00	R\$ 123,48	R\$ 113.779,41	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 113.779,41
6.3.14.2	PLANTIO DE GRAMA ESMERALDA OU SÃO CARLOS OU CURITIBANA, EM PLACAS. AF. 05/2022	M2	802,88	0,00		0,00	R\$ 21,41	R\$ 17.189,66	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 17.189,66
6.3.14.3	PINTURA DE DEMARCAÇÃO DE VAGA COM TINTA ACRÍLICA, E = 10 CM, APLICAÇÃO MANUAL. AF. 05/2021	M	2340	0,00		0,00	R\$ 4,80	R\$ 11.232,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 11.232,00
6.3.14.4	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESURA 6 CM. AF. 10/2022	M2	1552,72	0,00		0,00	R\$ 72,19	R\$ 112.090,85	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 112.090,85
6.3.14.5	CARGA DE MATERIAL DE QUALQUER NATUREZA SOBRE CAMINHÃO - MECÂNICA	m3	186,33	0,00		0,00	R\$ 3,58	R\$ 667,04	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 667,04
6.3.14.6	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA, PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF. 07/2020	M3XKM	2794,90	0,00		0,00	R\$ 2,74	R\$ 7.658,01	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 7.658,01
6.4	COBERTURA METÁLICA											
6.4.1	COBERTURA METÁLICA											

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

ITEM	DESCRIÇÃO	QUANTITATIVOS					VALORES						
		UNIDADE	QUANTITATIVO PREVISTO	ACUM. EXECUTADO ANTERIOR	ACUM. EXECUTADO REALIZADO	ACUM. FATURADO	SALDO A EXECUTAR	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL PREVISTO	ACUM. ANTERIOR	MEDIDO EXECUTADO	ACUM. FATURADO	SALDO A EXECUTAR
6.4.1.1	FORNECIMENTO DE ESTRUTURA METÁLICA E ENGRADAMENTO METÁLICO, EM AÇO, PARA TELHADO, EXCLUSIVE TELHA, INCLUSIVE FABRICAÇÃO, TRANSPORTE, MONTAGEM E APLICAÇÃO DE FUNDO PREPARADOR ANTICORROSIVO EM SUPERFÍCIE METÁLICA, UMA (1) DEMÃO	Kg	46143,76	0,00		0,00	46.143,76	R\$ 27,63	R\$ 1.274.952,08	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.274.952,08
6.4.1.2	SERVIÇO GALVANIZAÇÃO A FOGO - ESTRUTURAS / ESQUADRIAS, - BASEADO EM FDE (15,80,080)	KG	46143,76	0,00		0,00	46.143,76	R\$ 5,31	R\$ 245.023,36	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 245.023,36
6.4.1.3	CUMEIRA PARA TELHA DE FIBROCIMENTO ESTRUTURAL E = 6 MM, INCLUSIVE ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO E IÇAMENTO. AF_07/2019	M	780,00	0,00		0,00	780,00	R\$ 100,54	R\$ 78.421,20	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 78.421,20
6.4.1.4	TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E = 6 MM, COM RECOBRIMENTO LATERAL DE 1/4 DE ONDA PARA TELHADO COM INCLINAÇÃO MAIOR QUE 10º, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019	M2	9738,04	0,00		0,00	9.738,04	R\$ 50,95	R\$ 496.153,13	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 496.153,13
7	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS												
7.1	CASA 2 QUARTOS												
7.1.1	INFRAESTRUTURA												
7.1.1.1	CAIXA DE LIGAÇÃO/PASSAGEM EM PVC RÍGIDO PARA ELETRODUTO ROSCAVEL, DIMENSÕES 4"x2", EMBUTIDA EM ALVENARIA, COM PLACA COM FURO CENTRAL. - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	120,00	0,00		0,00	120,00	R\$ 18,66	R\$ 2.239,20	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 2.239,20
7.1.1.2	CAIXA OCTOGONAL 4" X 4", PVC, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	900,00	0,00		0,00	900,00	R\$ 16,57	R\$ 14.913,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 14.913,00
7.1.1.3	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE. -FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	5382,00	0,00		0,00	5.382,00	R\$ 12,09	R\$ 65.068,38	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 65.068,38
7.1.1.4	CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE. -FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	3762,00	0,00		0,00	3.762,00	R\$ 18,30	R\$ 68.844,60	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 68.844,60
7.1.2	INTERRUPTORES, TOMADAS, LUMINÁRIAS E SENSOR												
7.1.2.1	TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+1 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA. -FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	1830,00	0,00		0,00	1.830,00	R\$ 31,98	R\$ 58.523,40	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 58.523,40
7.1.2.2	TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+1 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA. -FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	480,00	0,00		0,00	480,00	R\$ 51,25	R\$ 24.600,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 24.600,00
7.1.2.3	INTERRUPTOR PARALELO (3 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA. -FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	120,00	0,00		0,00	120,00	R\$ 87,29	R\$ 10.474,80	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 10.474,80
7.1.2.4	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+1 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA. - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	450,00	0,00		0,00	450,00	R\$ 53,84	R\$ 24.228,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 24.228,00
7.1.2.5	INTERRUPTOR INTERMEDIÁRIO (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA. -FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2017	UN	300,00	0,00		0,00	300,00	R\$ 54,07	R\$ 16.221,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 16.221,00
7.1.2.6	INTERRUPTOR PULSADOR CAMPAINHA (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA. - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2017	UN	120,00	0,00		0,00	120,00	R\$ 28,98	R\$ 3.477,60	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 3.477,60
7.1.2.7	INTERRUPTOR PARALELO (2 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA. -FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	120,00	0,00		0,00	120,00	R\$ 62,42	R\$ 7.490,40	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 7.490,40
7.1.2.8	LUMINÁRIA COMERCIAL CHANFRADA DE SOBREPOR, PARA UMA (1) LÂMPADA TUBULAR FLUORESCENTE 1x32W-Ø78 OU 1x40W-Ø710 OU LED 1x18W-Ø78, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, EXCLUSIVE BASE, REATOR E LÂMPADA	un	660,00	0,00		0,00	660,00	R\$ 91,20	R\$ 60.192,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 60.192,00
7.1.2.9	LUMINÁRIA DE EMBUTIR PLAFON 18W LED - BASEADA EM SBC 080121	UN	180,00	0,00		0,00	180,00	R\$ 91,77	R\$ 16.518,60	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 16.518,60
7.1.2.10	LUMINÁRIA ARANDELA TIPO MEIA-LUA COMPLETA, DIÂMETRO 25 CM, PARA UMA (1) LÂMPADA LED, POTÊNCIA 15W, BULBO A65, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, INCLUSIVE BASE E LÂMPADA	un	120,00	0,00		0,00	120,00	R\$ 77,29	R\$ 9.274,80	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 9.274,80
7.1.3	CABEAMENTO												

ITEM	DESCRIÇÃO	QUANTITATIVOS					VALORES					SALDO A EXECUTAR	
		UNIDADE	QUANTITATIVO PREVISTO	ACUM. ANTERIOR	EXECUTADO REALIZADO	ACUM. FATURADO	SALDO A EXECUTAR	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL PREVISTO	ACUM. ANTERIOR	MEDIDO EXECUTADO		ACUM. FATURADO
7.1.3.1	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015	M	39330,00	0,00		0,00	39.330,00	R\$ 4,84	R\$ 190.357,20	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 190.357,20
7.1.3.2	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015	M	3381,00	0,00		0,00	3.381,00	R\$ 7,44	R\$ 25.154,64	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 25.154,64
7.1.4	QDC-1 (PRIMEIRO PAVIMENTO CASA 01)												
7.1.4.1	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 18 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 10/2020	UN	30,00	0,00		0,00	30,00	R\$ 742,59	R\$ 22.277,70	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 22.277,70
7.1.4.2	SUPRESSOR DE SURTO PARA PROTEÇÃO PRIMÁRIA EM OGD, ATÉ 1,5 KV - 5 KA	un	120,00	0,00		0,00	120,00	R\$ 363,29	R\$ 43.594,80	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 43.594,80
7.1.4.3	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 10/2020	UN	60,00	0,00		0,00	60,00	R\$ 113,36	R\$ 6.801,60	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 6.801,60
7.1.4.4	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 10/2020	UN	30,00	0,00		0,00	30,00	R\$ 121,36	R\$ 3.640,80	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 3.640,80
7.1.4.5	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 10/2020	UN	150,00	0,00		0,00	150,00	R\$ 114,82	R\$ 17.223,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 17.223,00
7.1.4.6	DISJUNTOR MONOPOLAR DR 25 A - DISPOSITIVO RESIDUAL DIFERENCIAL, TIPO AC, REF 5SU1 SIEMENS OU SIMILAR - BASEADA EM ORSE 7871	UN	90,00	0,00		0,00	90,00	R\$ 98,46	R\$ 8.861,40	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 8.861,40
7.1.4.7	DISJUNTOR BIPOLAR DR 40 A - DISPOSITIVO RESIDUAL DIFERENCIAL, TIPO AC, 30MA, REF 5SM1 314-OMB, SIEMENS OU SIMILAR - BASEADA EM ORSE 8077	UN	30,00	0,00		0,00	30,00	R\$ 178,27	R\$ 5.348,10	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 5.348,10
7.1.5	QDC-1 (PRIMEIRO PAVIMENTO CASA 02)												
7.1.5.1	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 18 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 10/2020	UN	30,00	0,00		0,00	30,00	R\$ 742,59	R\$ 22.277,70	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 22.277,70
7.1.5.2	DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO DE SURTO, CLASSE 2	UN	120,00	0,00		0,00	120,00	R\$ 159,47	R\$ 19.136,40	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 19.136,40
7.1.5.3	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 10/2020	UN	60,00	0,00		0,00	60,00	R\$ 113,36	R\$ 6.801,60	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 6.801,60
7.1.5.4	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 10/2020	UN	30,00	0,00		0,00	30,00	R\$ 121,36	R\$ 3.640,80	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 3.640,80
7.1.5.5	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 10/2020	UN	150,00	0,00		0,00	150,00	R\$ 114,82	R\$ 17.223,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 17.223,00
7.1.5.6	DISJUNTOR MONOPOLAR DR 25 A - DISPOSITIVO RESIDUAL DIFERENCIAL, TIPO AC, REF 5SU1 SIEMENS OU SIMILAR - BASEADA EM ORSE 7871	UN	90,00	0,00		0,00	90,00	R\$ 98,46	R\$ 8.861,40	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 8.861,40
7.1.5.7	DISJUNTOR BIPOLAR DR 40 A - DISPOSITIVO RESIDUAL DIFERENCIAL, TIPO AC, 30MA, REF 5SM1 314-OMB, SIEMENS OU SIMILAR - BASEADA EM ORSE 8077	UN	30,00	0,00		0,00	30,00	R\$ 178,27	R\$ 5.348,10	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 5.348,10
7.1.6	QDC-1 (SEGUNDO PAVIMENTO CASA 01)												
7.1.6.1	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 18 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 10/2020	UN	30,00	0,00		0,00	30,00	R\$ 742,59	R\$ 22.277,70	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 22.277,70
7.1.6.2	DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO DE SURTO, CLASSE 2	UN	120,00	0,00		0,00	120,00	R\$ 159,47	R\$ 19.136,40	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 19.136,40
7.1.6.3	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 10/2020	UN	60,00	0,00		0,00	60,00	R\$ 113,36	R\$ 6.801,60	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 6.801,60
7.1.6.4	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 10/2020	UN	30,00	0,00		0,00	30,00	R\$ 121,36	R\$ 3.640,80	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 3.640,80
7.1.6.5	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 10/2020	UN	150,00	0,00		0,00	150,00	R\$ 114,82	R\$ 17.223,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 17.223,00
7.1.6.6	DISJUNTOR MONOPOLAR DR 25 A - DISPOSITIVO RESIDUAL DIFERENCIAL, TIPO AC, REF 5SU1 SIEMENS OU SIMILAR - BASEADA EM ORSE 7871	UN	90,00	0,00		0,00	90,00	R\$ 98,46	R\$ 8.861,40	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 8.861,40

ITEM	DESCRIÇÃO	QUANTITATIVOS						VALORES					
		UNIDADE	QUANTITATIVO PREVISTO	ACUM. ANTERIOR	EXECUTADO REALIZADO	ACUM. FATURADO	SALDO A EXECUTAR	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL PREVISTO	ACUM. ANTERIOR	MÉDIO EXECUTADO	ACUM. FATURADO	SALDO A EXECUTAR
7.1.6.7	DISJUNTOR BIPOLAR DR 40 A - DISPOSITIVO RESIDUAL DIFERENCIAL, TIPO AC, 30MA, REF: SSM1 314-OMB, SIEMENS OU SIMILAR - BASEADA EM ORSE 8077	UN	30,00	0,00		0,00	30,00	R\$ 178,27	R\$ 5.346,10	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 5.346,10
7.1.7	QDC-1 (SEGUNDO PAVIMENTO CASA 02)												
7.1.7.1	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 18 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	30,00	0,00		0,00	30,00	R\$ 742,59	R\$ 22.277,70	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 22.277,70
7.1.7.2	SUPRESSOR DE SURTO PARA PROTEÇÃO PRIMÁRIA EM QGD, ATÉ 1,5 KV - 5 KA	un	120,00	0,00		0,00	120,00	R\$ 363,29	R\$ 43.594,80	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 43.594,80
7.1.7.3	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	60,00	0,00		0,00	60,00	R\$ 113,36	R\$ 6.801,60	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 6.801,60
7.1.7.4	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	30,00	0,00		0,00	30,00	R\$ 121,36	R\$ 3.640,80	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 3.640,80
7.1.7.5	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	150,00	0,00		0,00	150,00	R\$ 114,82	R\$ 17.223,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 17.223,00
7.1.7.6	DISJUNTOR MONOPOLAR DR 25 A - DISPOSITIVO RESIDUAL DIFERENCIAL, TIPO AC, REF: SSM1 SIEMENS OU SIMILAR - BASEADA EM ORSE 7871	UN	90,00	0,00		0,00	90,00	R\$ 98,46	R\$ 8.861,40	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 8.861,40
7.1.7.7	DISJUNTOR BIPOLAR DR 40 A - DISPOSITIVO RESIDUAL DIFERENCIAL, TIPO AC, 30MA, REF: SSM1 314-OMB, SIEMENS OU SIMILAR - BASEADA EM ORSE 8077	UN	30,00	0,00		0,00	30,00	R\$ 178,27	R\$ 5.346,10	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 5.346,10
7.1.8	ENTRADA DE ENERGIA												
7.1.8.1	ENTRADA DE ENERGIA AÉREA, TIPO C8, PADRÃO CEMIG, CARGA INSTALADA DE 66,1KVA ATÉ 75KVA, TRIFÁSICO, COM SAÍDA SUBTERRÂNEA, INCLUSIVE POSTE, CAIXA PARA MEDIDOR, DISJUNTOR, BARRAMENTO, ATERRAMENTO E ACESSÓRIOS	UN	120,00	0,00		0,00	120,00	R\$ 9.358,25	R\$ 1.122.990,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.122.990,00
7.2	CASA 3 QUARTOS												
7.2.1	INFRAESTRUTURA												
7.2.1.1	CAIXA DE LIGAÇÃO/PASSAGEM EM PVC RÍGIDO PARA ELETRODUTO ROSCÁVEL, DIMENSÕES 4"x2", EMBUTIDA EM ALVENARIA, COM PLACA COM FURO CENTRAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	823,00	0,00		0,00	823,00	R\$ 18,66	R\$ 15.357,18	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 15.357,18
7.2.1.2	CAIXA OCTOGONAL 4" X 4", PVC, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	2887,00	0,00		0,00	2.687,00	R\$ 16,57	R\$ 44.523,59	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 44.523,59
7.2.1.3	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	13826,00	0,00		0,00	13.826,00	R\$ 12,09	R\$ 167.156,34	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 167.156,34
7.2.1.4	CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (130 M DO PISO), PVC, AF_12/2015	UN	9335,00	0,00		0,00	9.335,00	R\$ 18,30	R\$ 170.830,50	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 170.830,50
7.2.2	INTERRUPTORES, TOMADAS, LUMINÁRIAS E SENSOR												
7.2.2.1	TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	4880,00	0,00		0,00	4.880,00	R\$ 31,98	R\$ 156.062,40	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 156.062,40
7.2.2.2	TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	1344,00	0,00		0,00	1.344,00	R\$ 51,25	R\$ 68.880,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 68.880,00
7.2.2.3	INTERRUPTOR PARALELO (3 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	424,00	0,00		0,00	424,00	R\$ 87,29	R\$ 37.010,96	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 37.010,96
7.2.2.4	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	424,00	0,00		0,00	424,00	R\$ 53,84	R\$ 22.828,16	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 22.828,16
7.2.2.5	INTERRUPTOR INTERMEDIÁRIO (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2017	UN	990,00	0,00		0,00	990,00	R\$ 54,07	R\$ 53.529,30	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 53.529,30
7.2.2.6	INTERRUPTOR PARALELO (2 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	424,00	0,00		0,00	424,00	R\$ 62,42	R\$ 26.466,08	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 26.466,08

ITEM	DESCRIÇÃO	QUANTITATIVOS					VALORES						
		UNIDADE	QUANTITATIVO PREVISTO	ACUM. ANTERIOR	EXECUTADO REALIZADO	ACUM. FATURADO	SALDO A EXECUTAR	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL PREVISTO	ACUM. ANTERIOR	MEDIDO EXECUTADO	ACUM. FATURADO	SALDO A EXECUTAR
7.2.2.7	INTERRUPTOR PULSADOR CAMPAINHA (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2017	UN	283,00	0,00		0,00	283,00	R\$ 28,98	R\$ 8.201,34	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 8.201,34
7.2.2.8	LUMINÁRIA COMERCIAL CHANFRADA DE SOBREPOR, PARA UMA (1) LÂMPADA TUBULAR FLUORESCENTE 1X32W-Ø18 OU 1X40W-Ø110 OU LED 1X18W-Ø18, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, EXCLUSIVE BASE, REATOR E LÂMPADA	un	1556,00	0,00		0,00	1.556,00	R\$ 91,20	R\$ 141.907,20	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 141.907,20
7.2.2.9	LUMINÁRIA DE EMBUTIR PLAFON 18W LED - BASEADA EM SBC 060121	UN	424,00	0,00		0,00	424,00	R\$ 91,77	R\$ 38.910,48	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 38.910,48
7.2.2.10	LUMINÁRIA ARANDELA TIPO MEIA-LUA COMPLETA, DIÂMETRO 25 CM, PARA UMA (1) LÂMPADA LED, POTÊNCIA 15W, BULBO A65, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, INCLUSIVE BASE E LÂMPADA	un	283,00	0,00		0,00	283,00	R\$ 77,29	R\$ 21.873,07	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 21.873,07
7.2.3	CABEAMENTO												
7.2.3.1	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	85960,00	0,00		0,00	85.960,00	R\$ 4,84	R\$ 416.046,40	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 416.046,40
7.2.3.2	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	9838,00	0,00		0,00	9.838,00	R\$ 7,44	R\$ 73.194,72	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 73.194,72
7.2.4	QDC-1 (PRIMEIRO PAVIMENTO CASA 01)												
7.2.4.1	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 18 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	52,00	0,00		0,00	52,00	R\$ 742,59	R\$ 38.614,68	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 38.614,68
7.2.4.2	SUPRESSOR DE SURTO PARA PROTEÇÃO PRIMÁRIA EM QGD, ATÉ 1,5 KV - 5 KA	un	208,00	0,00		0,00	208,00	R\$ 363,29	R\$ 75.564,32	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 75.564,32
7.2.4.3	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	104,00	0,00		0,00	104,00	R\$ 113,36	R\$ 11.789,44	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 11.789,44
7.2.4.4	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	52,00	0,00		0,00	52,00	R\$ 121,36	R\$ 6.310,72	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 6.310,72
7.2.4.5	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	260,00	0,00		0,00	260,00	R\$ 114,82	R\$ 29.853,20	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 29.853,20
7.2.4.6	DISJUNTOR MONOPOLAR DR 25 A - DISPOSITIVO RESIDUAL DIFERENCIAL, TIPO AC, REF.5SU1 SIEMENS OU SIMILAR - BASEADA EM ORSE 7871	UN	156,00	0,00		0,00	156,00	R\$ 98,46	R\$ 15.359,76	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 15.359,76
7.2.4.7	DISJUNTOR BIPOLAR DR 40 A - DISPOSITIVO RESIDUAL DIFERENCIAL, TIPO AC, 30MA, REF.5SM1 314-OMB, SIEMENS OU SIMILAR - BASEADA EM ORSE 8077	UN	52,00	0,00		0,00	52,00	R\$ 178,27	R\$ 9.270,04	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 9.270,04
7.2.5	QDC-1 (PRIMEIRO PAVIMENTO CASA 02)												
7.2.5.1	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 18 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	52,00	0,00		0,00	52,00	R\$ 742,59	R\$ 38.614,68	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 38.614,68
7.2.5.2	DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO DE SURTO, CLASSE 2.	UN	208,00	0,00		0,00	208,00	R\$ 159,47	R\$ 33.169,76	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 33.169,76
7.2.5.3	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	104,00	0,00		0,00	104,00	R\$ 113,36	R\$ 11.789,44	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 11.789,44
7.2.5.4	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	52,00	0,00		0,00	52,00	R\$ 121,36	R\$ 6.310,72	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 6.310,72
7.2.5.5	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	260,00	0,00		0,00	260,00	R\$ 114,82	R\$ 29.853,20	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 29.853,20
7.2.5.6	DISJUNTOR MONOPOLAR DR 25 A - DISPOSITIVO RESIDUAL DIFERENCIAL, TIPO AC, REF.5SU1 SIEMENS OU SIMILAR - BASEADA EM ORSE 7871	UN	156,00	0,00		0,00	156,00	R\$ 98,46	R\$ 15.359,76	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 15.359,76
7.2.5.7	DISJUNTOR BIPOLAR DR 40 A - DISPOSITIVO RESIDUAL DIFERENCIAL, TIPO AC, 30MA, REF.5SM1 314-OMB, SIEMENS OU SIMILAR - BASEADA EM ORSE 8077	UN	52,00	0,00		0,00	52,00	R\$ 178,27	R\$ 9.270,04	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 9.270,04

ITEM	DESCRIÇÃO	QUANTITATIVOS					VALORES						
		UNIDADE	QUANTITATIVO PREVISTO	ACUM. EXECUTADO ANTERIOR	ACUM. EXECUTADO REALIZADO	ACUM. FATURADO	SALDO A EXECUTAR	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL PREVISTO	ACUM. ANTERIOR	MEDIDO EXECUTADO	ACUM. FATURADO	SALDO A EXECUTAR
7.2.6	QDC-1 (SEGUNDO PAVIMENTO CASA 01)												
7.2.6.1	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 18 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	52,00	0,00		0,00	52,00	R\$ 742,59	R\$ 38.614,68	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 38.614,68
7.2.6.2	DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO DE SURTO, CLASSE 2.	UN	208,00	0,00		0,00	208,00	R\$ 159,47	R\$ 33.169,76	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 33.169,76
7.2.6.3	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	104,00	0,00		0,00	104,00	R\$ 113,36	R\$ 11.789,44	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 11.789,44
7.2.6.4	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	52,00	0,00		0,00	52,00	R\$ 121,36	R\$ 6.310,72	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 6.310,72
7.2.6.5	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	260,00	0,00		0,00	260,00	R\$ 114,82	R\$ 29.853,20	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 29.853,20
7.2.6.6	DISJUNTOR MONOPOLAR DR 25 A - DISPOSITIVO RESIDUAL DIFERENCIAL, TIPO AC, REF. 5SUI SIEMENS OU SIMILAR - BASEADA EM ORSE 7871	UN	156,00	0,00		0,00	156,00	R\$ 98,46	R\$ 15.359,76	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 15.359,76
7.2.6.7	DISJUNTOR BIPOLAR DR 40 A - DISPOSITIVO RESIDUAL DIFERENCIAL, TIPO AC, 30MA, REF. 5SM1 314-OMB, SIEMENS OU SIMILAR - BASEADA EM ORSE 8077	UN	52,00	0,00		0,00	52,00	R\$ 178,27	R\$ 9.270,04	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 9.270,04
7.2.7	QDC-1 (SEGUNDO PAVIMENTO CASA 02)												
7.2.7.1	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 18 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	52,00	0,00		0,00	52,00	R\$ 742,59	R\$ 38.614,68	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 38.614,68
7.2.7.2	DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO DE SURTO, CLASSE 2.	UN	208,00	0,00		0,00	208,00	R\$ 159,47	R\$ 33.169,76	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 33.169,76
7.2.7.3	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	104,00	0,00		0,00	104,00	R\$ 113,36	R\$ 11.789,44	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 11.789,44
7.2.7.4	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	52,00	0,00		0,00	52,00	R\$ 121,36	R\$ 6.310,72	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 6.310,72
7.2.7.5	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	260,00	0,00		0,00	260,00	R\$ 114,82	R\$ 29.853,20	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 29.853,20
7.2.7.6	DISJUNTOR MONOPOLAR DR 25 A - DISPOSITIVO RESIDUAL DIFERENCIAL, TIPO AC, REF. 5SUI SIEMENS OU SIMILAR - BASEADA EM ORSE 7871	UN	156,00	0,00		0,00	156,00	R\$ 98,46	R\$ 15.359,76	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 15.359,76
7.2.7.7	DISJUNTOR BIPOLAR DR 40 A - DISPOSITIVO RESIDUAL DIFERENCIAL, TIPO AC, 30MA, REF. 5SM1 314-OMB, SIEMENS OU SIMILAR - BASEADA EM ORSE 8077	UN	52,00	0,00		0,00	52,00	R\$ 178,27	R\$ 9.270,04	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 9.270,04
7.2.8	ENTRADA DE ENERGIA												
7.2.8.1	ENTRADA DE ENERGIA AÉREA, TIPO C2, PADRÃO CEMIG, CARGA INSTALADA DE 15,1KVA ATÉ 23KVA, TRIFÁSICO, COM SAÍDA SUBTERRÂNEA, INCLUSIVE POSTE, CAIXA PARA MEDIDOR, DISJUNTOR, BARRAMENTO, ATERRAMENTO E ACESSÓRIOS	UN	208,00	0,00		0,00	208,00	R\$ 4.432,30	R\$ 921.918,40	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 921.918,40
7.3	ÁREA EXTERNA												
7.3.1	INFRAESTRUTURA												
7.3.1.1	CAIXA RETANGULAR 4" X 4" MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	516,00	0,00		0,00	516,00	R\$ 23,77	R\$ 12.265,32	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 12.265,32
7.3.1.2	CAIXA DE PASSAGEM EM CHAPA DE AÇO COM TAMPA APARAFUSADA, SOBREPOR, 202 X 202 X 102 MM	un	936,00	0,00		0,00	936,00	R\$ 103,12	R\$ 96.520,32	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 96.520,32
7.3.1.3	ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO ROSCÁVEL, DN 32 MM (1,14"), INCLUSIVE CONEXÕES, SUPORTES E FIXAÇÃO	m	10532,40	0,00		0,00	10.532,40	R\$ 44,86	R\$ 472.378,14	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 472.378,14
7.3.1.4	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	748,00	0,00		0,00	748,00	R\$ 12,09	R\$ 9.043,32	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 9.043,32
7.3.2	INTERRUPTORES, TOMADAS, LUMINÁRIAS E SENSOR												

ITEM	DESCRIÇÃO	QUANTITATIVOS				VALORES						
		UNIDADE	QUANTITATIVO PREVISTO	ACUM. ANTERIOR	EXECUTADO REALIZADO	ACUM. FATURADO	SALDO A EXECUTAR	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL PREVISTO	ACUM. ANTERIOR	MEDIDO EXECUTADO	ACUM. FATURADO
7.3.2.1	RELÉ FOTOELÉTRICO, TENSÃO 220V COM CAPACIDADE DE CARGA 1600VA, INCLUSIVE BASE E INSTALAÇÃO	un	156,00	0,00		0,00	156,00	R\$ 54,22	R\$ 8.458,32	R\$ -	R\$ -	R\$ 8.458,32
7.3.2.2	SENSOR DE PRESENÇA COM FOTOCÉLULA, FIXAÇÃO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020	UN	533,00	0,00		0,00	533,00	R\$ 136,46	R\$ 72.733,18	R\$ -	R\$ -	R\$ 72.733,18
7.3.2.3	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PONTO PARA ILUMINAÇÃO - EQUIPADA COM MÓDULO LED E DRIVER COM ÍNDICE DE PROTEÇÃO IP67, INDICADA PARA ÁREAS EXTERNAS E EXPOSTAS AO TEMPO, EM POSTE DE AÇO GALVANIZADO, COM 60MM DE DIÂMETRO. - ALTURA ÚTIL = 500CM. REF.: LUMICENTER - LEX01-S2M750 OU EQUIVALENTE.	UND	804,00	0,00		0,00	804,00	R\$ 2.104,81	R\$ 1.692.267,24	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.692.267,24
7.3.2.4	LUMINÁRIA ARANDELA TIPO TARTARUGA, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA LED DE 6 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020	UN	480,00	0,00		0,00	480,00	R\$ 149,84	R\$ 71.923,20	R\$ -	R\$ -	R\$ 71.923,20
7.3.3	INTERRUPTORES, TOMADAS, LUMINÁRIAS E SENSOR											
7.3.3.1	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	31680,00	0,00		0,00	31.680,00	R\$ 4,84	R\$ 153.234,40	R\$ -	R\$ -	R\$ 153.234,40
7.3.3.2	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	23831,00	0,00		0,00	23.831,00	R\$ 7,44	R\$ 177.302,64	R\$ -	R\$ -	R\$ 177.302,64
7.3.4	QDC-1 (ILUMINAÇÃO EXTERNA)											
7.3.4.1	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 40 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	1,00	0,00		0,00	1,00	R\$ 1.291,62	R\$ 1.291,62	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.291,62
7.3.4.2	SUPRESSOR DE SURTO PARA PROTEÇÃO PRIMÁRIA EM QGD, ATÉ 1,5 KV - 5 KA	un	4,00	0,00		0,00	4,00	R\$ 363,29	R\$ 1.453,16	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.453,16
7.3.4.3	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	11,00	0,00		0,00	11,00	R\$ 113,36	R\$ 1.246,96	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.246,96
7.3.4.4	DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 50A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	1,00	0,00		0,00	1,00	R\$ 171,74	R\$ 171,74	R\$ -	R\$ -	R\$ 171,74
7.3.5	QDC-2 (ILUMINAÇÃO EXTERNA)											
7.3.5.1	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 40 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	1,00	0,00		0,00	1,00	R\$ 1.291,62	R\$ 1.291,62	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.291,62
7.3.5.2	SUPRESSOR DE SURTO PARA PROTEÇÃO PRIMÁRIA EM QGD, ATÉ 1,5 KV - 5 KA	un	4,00	0,00		0,00	4,00	R\$ 363,29	R\$ 1.453,16	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.453,16
7.3.5.3	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	11,00	0,00		0,00	11,00	R\$ 113,36	R\$ 1.246,96	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.246,96
7.3.5.4	DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 50A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	1,00	0,00		0,00	1,00	R\$ 171,74	R\$ 171,74	R\$ -	R\$ -	R\$ 171,74
7.3.6	QDC-3 (ILUMINAÇÃO EXTERNA)											
7.3.6.1	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 40 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	1,00	0,00		0,00	1,00	R\$ 1.291,62	R\$ 1.291,62	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.291,62
7.3.6.2	SUPRESSOR DE SURTO PARA PROTEÇÃO PRIMÁRIA EM QGD, ATÉ 1,5 KV - 5 KA	un	4,00	0,00		0,00	4,00	R\$ 363,29	R\$ 1.453,16	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.453,16
7.3.6.3	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	11,00	0,00		0,00	11,00	R\$ 113,36	R\$ 1.246,96	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.246,96
7.3.6.4	DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 50A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	1,00	0,00		0,00	1,00	R\$ 171,74	R\$ 171,74	R\$ -	R\$ -	R\$ 171,74
7.3.7	QDC-4 (ILUMINAÇÃO EXTERNA)											
7.3.7.1	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 40 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	1,00	0,00		0,00	1,00	R\$ 1.291,62	R\$ 1.291,62	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.291,62

ITEM	DESCRIÇÃO	QUANTITATIVOS				VALORES							
		UNIDADE	QUANTITATIVO PREVISTO	ACUM. ANTERIOR	EXECUTADO REALIZADO	ACUM. FATURADO	SALDO A EXECUTAR	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL PREVISTO	ACUM. ANTERIOR	MÉDIO EXECUTADO	ACUM. FATURADO	SALDO A EXECUTAR
7.3.7.2	SUPRESSOR DE SURTO PARA PROTEÇÃO PRIMÁRIA EM QGD, ATÉ 1,5 KV - 5 KA	un	4,00	0,00		0,00	4,00	R\$ 363,29	R\$ 1.453,16	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.453,16
7.3.7.3	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_10/2020	UN	11,00	0,00		0,00	11,00	R\$ 113,36	R\$ 1.246,96	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.246,96
7.3.7.4	DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 50A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_10/2020	UN	1,00	0,00		0,00	1,00	R\$ 171,74	R\$ 171,74	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 171,74
7.3.8	QDC-5 (ILUMINAÇÃO EXTERNA)												
7.3.8.1	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 40 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_10/2020	UN	1,00	0,00		0,00	1,00	R\$ 1.291,62	R\$ 1.291,62	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.291,62
7.3.8.2	SUPRESSOR DE SURTO PARA PROTEÇÃO PRIMÁRIA EM QGD, ATÉ 1,5 KV - 5 KA	un	4,00	0,00		0,00	4,00	R\$ 363,29	R\$ 1.453,16	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.453,16
7.3.8.3	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_10/2020	UN	11,00	0,00		0,00	11,00	R\$ 113,36	R\$ 1.246,96	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.246,96
7.3.8.4	DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 50A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_10/2020	UN	1,00	0,00		0,00	1,00	R\$ 171,74	R\$ 171,74	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 171,74
7.3.9	QDC-6 (ILUMINAÇÃO EXTERNA)												
7.3.9.1	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 40 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_10/2020	UN	1,00	0,00		0,00	1,00	R\$ 1.291,62	R\$ 1.291,62	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.291,62
7.3.9.2	SUPRESSOR DE SURTO PARA PROTEÇÃO PRIMÁRIA EM QGD, ATÉ 1,5 KV - 5 KA	un	4,00	0,00		0,00	4,00	R\$ 363,29	R\$ 1.453,16	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.453,16
7.3.9.3	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_10/2020	UN	11,00	0,00		0,00	11,00	R\$ 113,36	R\$ 1.246,96	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.246,96
7.3.9.4	DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 50A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_10/2020	UN	1,00	0,00		0,00	1,00	R\$ 171,74	R\$ 171,74	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 171,74
7.3.10	QDC-7 (ILUMINAÇÃO EXTERNA)												
7.3.10.1	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 40 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_10/2020	UN	1,00	0,00		0,00	1,00	R\$ 1.291,62	R\$ 1.291,62	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.291,62
7.3.10.2	SUPRESSOR DE SURTO PARA PROTEÇÃO PRIMÁRIA EM QGD, ATÉ 1,5 KV - 5 KA	un	4,00	0,00		0,00	4,00	R\$ 363,29	R\$ 1.453,16	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.453,16
7.3.10.3	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_10/2020	UN	11,00	0,00		0,00	11,00	R\$ 113,36	R\$ 1.246,96	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.246,96
7.3.10.4	DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 50A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_10/2020	UN	1,00	0,00		0,00	1,00	R\$ 171,74	R\$ 171,74	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 171,74
7.3.11	QDC-8 (ILUMINAÇÃO EXTERNA)												
7.3.11.1	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 40 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_10/2020	UN	1,00	0,00		0,00	1,00	R\$ 1.291,62	R\$ 1.291,62	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.291,62
7.3.11.2	SUPRESSOR DE SURTO PARA PROTEÇÃO PRIMÁRIA EM QGD, ATÉ 1,5 KV - 5 KA	un	4,00	0,00		0,00	4,00	R\$ 363,29	R\$ 1.453,16	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.453,16
7.3.11.3	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_10/2020	UN	11,00	0,00		0,00	11,00	R\$ 113,36	R\$ 1.246,96	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.246,96
7.3.11.4	DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 50A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_10/2020	UN	1,00	0,00		0,00	1,00	R\$ 171,74	R\$ 171,74	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 171,74
7.3.12	QDC-9 (ILUMINAÇÃO EXTERNA)												
7.3.12.1	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 40 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_10/2020	UN	1,00	0,00		0,00	1,00	R\$ 1.291,62	R\$ 1.291,62	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.291,62
7.3.12.2	SUPRESSOR DE SURTO PARA PROTEÇÃO PRIMÁRIA EM QGD, ATÉ 1,5 KV - 5 KA	un	4,00	0,00		0,00	4,00	R\$ 363,29	R\$ 1.453,16	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.453,16
7.3.12.3	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_10/2020	UN	11,00	0,00		0,00	11,00	R\$ 113,36	R\$ 1.246,96	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.246,96

ITEM	DESCRIÇÃO	QUANTITATIVOS					VALORES					SALDO A EXECUTAR	
		UNIDADE	QUANTITATIVO PREVISTO	ACUM. ANTERIOR	EXECUTADO REALIZADO	ACUM. FATURADO	SALDO A EXECUTAR	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL PREVISTO	ACUM. ANTERIOR	MEDIDO EXECUTADO		ACUM. FATURADO
7.3.12.4	DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 50A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	1,00	0,00		0,00	1,00	R\$ 171,74	R\$ 171,74	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 171,74
7.3.13	QDC-10 (ILUMINAÇÃO EXTERNA)												
7.3.13.1	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, COM EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA SUPRESSOR DE SURTO PARA PROTEÇÃO PRIMÁRIA EM QGD, ATÉ 1,5 KV - 5 KA	UN	1,00	0,00		0,00	1,00	R\$ 1.291,62	R\$ 1.291,62	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.291,62
7.3.13.2	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	un	4,00	0,00		0,00	4,00	R\$ 363,29	R\$ 1.453,16	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.453,16
7.3.13.3	DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 50A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	11,00	0,00		0,00	11,00	R\$ 113,36	R\$ 1.246,96	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.246,96
7.3.13.4	DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 50A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	1,00	0,00		0,00	1,00	R\$ 171,74	R\$ 171,74	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 171,74
7.4	ALIMENTADORES												
7.4.1	INFRAESTRUTURA												
7.4.1.1	CAIXA DE INSPEÇÃO EM CONCRETO, TIPO "ZA" PASSEIO, PADRÃO CEMIG, DIMENSÃO (28X28)CM, ALTURA 40CM, COM TAMPA E ARO ARTICULADO EM FERRO FUNDIDO, INCLUSIVE ESCAVACÃO, APILOAMENTO, LASTRO DE BRITA, REATERRO E TRANSPORTE E RETIRADA DO MATERIAL ESCAVADO (EM CAÇAMBA)	un	528,00	0,00		0,00	528,00	R\$ 243,29	R\$ 128.457,12	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 128.457,12
7.4.1.2	CAIXA DE INSPEÇÃO EM CONCRETO, TIPO "ZB" PASSEIO, PADRÃO CEMIG, DIMENSÃO (52X44)CM, ALTURA 70CM, COM TAMPA E ARO ARTICULADO EM FERRO FUNDIDO, INCLUSIVE ESCAVACÃO, APILOAMENTO, LASTRO DE BRITA, REATERRO E TRANSPORTE E RETIRADA DO MATERIAL ESCAVADO (EM CAÇAMBA)	un	195,00	0,00		0,00	195,00	R\$ 800,95	R\$ 156.185,25	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 156.185,25
7.4.1.3	DUTO CORRUGADO EM PEAD (POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE), PARA PROTEÇÃO DE CABOS SUBTERRÂNEOS DN 40 MM (1. 1/2")	m	2233,20	0,00		0,00	2.233,20	R\$ 29,81	R\$ 66.571,69	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 66.571,69
7.4.1.4	DUTO CORRUGADO EM PEAD (POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE), PARA PROTEÇÃO DE CABOS SUBTERRÂNEOS DN 75 MM (3")	m	5280,00	0,00		0,00	5.280,00	R\$ 49,34	R\$ 260.515,20	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 260.515,20
7.4.2	CABEAMENTO												
7.4.2.1	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	1602,00	0,00		0,00	1.602,00	R\$ 12,03	R\$ 19.272,06	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 19.272,06
7.4.2.2	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	11336,40	0,00		0,00	11.336,40	R\$ 19,06	R\$ 216.071,78	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 216.071,78
7.4.2.3	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 25 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021	M	336,00	0,00		0,00	336,00	R\$ 31,61	R\$ 10.620,96	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 10.620,96
7.4.2.4	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 35 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021	M	2222,40	0,00		0,00	2.222,40	R\$ 43,72	R\$ 97.163,32	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 97.163,32
7.4.2.5	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 50 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021	M	2018,40	0,00		0,00	2.018,40	R\$ 63,48	R\$ 128.128,03	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 128.128,03
7.4.2.6	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 70 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021	M	7147,20	0,00		0,00	7.147,20	R\$ 87,90	R\$ 628.238,88	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 628.238,88
7.4.2.7	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 95 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021	M	8121,60	0,00		0,00	8.121,60	R\$ 113,67	R\$ 923.182,27	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 923.182,27
7.4.3	QUADRO (QGBT)												

ITEM	DESCRIÇÃO	QUANTITATIVOS					VALORES						
		UNIDADE	QUANTITATIVO PREVISTO	ACUM. ANTERIOR	EXECUTADO REALIZADO	ACUM. FATURADO	SALDO A EXECUTAR	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL PREVISTO	ACUM. ANTERIOR	MEDIDO EXECUTADO	ACUM. FATURADO	SALDO A EXECUTAR
7.4.3.1	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 12 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	40,00	0,00		0,00	40,00	R\$ 537,45	R\$ 21.498,00	R\$ -	-	R\$ -	R\$ 21.498,00
7.4.3.2	DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO TRIPOLAR 125 A COM CAIXA MOLDA DA 10 KA	UN	1,00	0,00		0,00	1,00	R\$ 771,52	R\$ 771,52	R\$ -	-	R\$ -	R\$ 771,52
7.4.4	QUADRO (QGBT-CONDOMÍNIO)												
7.4.4.1	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 24 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	1,00	0,00		0,00	1,00	R\$ 779,13	R\$ 779,13	R\$ -	-	R\$ -	R\$ 779,13
7.4.4.2	SUPRESSOR DE SURTO PARA PROTEÇÃO PRIMÁRIA EM QGD, ATÉ 1,5 KV - 5 KA	un	4,00	0,00		0,00	4,00	R\$ 363,29	R\$ 1.453,16	R\$ -	-	R\$ -	R\$ 1.453,16
7.4.4.3	DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO TRIPOLAR, CORRENTE NOMINAL DE 250A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	1,00	0,00		0,00	1,00	R\$ 2.023,41	R\$ 2.023,41	R\$ -	-	R\$ -	R\$ 2.023,41
7.4.4.4	DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 40A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	1,00	0,00		0,00	1,00	R\$ 160,99	R\$ 160,99	R\$ -	-	R\$ -	R\$ 160,99
7.4.4.5	DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 50A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	1,00	0,00		0,00	1,00	R\$ 171,74	R\$ 171,74	R\$ -	-	R\$ -	R\$ 171,74
7.4.4.6	DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO NEMA, CORRENTE NOMINAL DE 80 ATÉ 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	1,00	0,00		0,00	1,00	R\$ 284,56	R\$ 284,56	R\$ -	-	R\$ -	R\$ 284,56
7.4.5	QUADRO (QGBT-ENTRADA)												
7.4.5.1	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE CIRCUITOS DE SOBREPOR ARA 32 MODULOSCOM BARRAMENTO DE 1980A - BASEADO EM SINAPI (10/18/78)	UN	1,00	0,00		0,00	1,00	R\$ 5.188,91	R\$ 5.188,91	R\$ -	-	R\$ -	R\$ 5.188,91
7.4.5.2	SUPRESSOR DE SURTO PARA PROTEÇÃO PRIMÁRIA EM QGD, ATÉ 1,5 KV - 5 KA	un	4,00	0,00		0,00	4,00	R\$ 363,29	R\$ 1.453,16	R\$ -	-	R\$ -	R\$ 1.453,16
7.4.5.3	DISJUNTOR CAIXA MOLDA DA TRIPOLAR ELÉTRICO 1250A - DMB1000S - BASEADO EM SBC (06/41/71)	UN	1,00	0,00		0,00	1,00	R\$ 16.937,38	R\$ 16.937,38	R\$ -	-	R\$ -	R\$ 16.937,38
7.4.5.4	DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO TRIPOLAR, CORRENTE NOMINAL DE 125A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	80,00	0,00		0,00	80,00	R\$ 811,30	R\$ 64.904,00	R\$ -	-	R\$ -	R\$ 64.904,00
7.4.5.5	DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO TRIPOLAR, CORRENTE NOMINAL DE 250A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	1,00	0,00		0,00	1,00	R\$ 2.023,41	R\$ 2.023,41	R\$ -	-	R\$ -	R\$ 2.023,41
7.5	SUBESTAÇÃO												
7.5.1	ENTRADA DE ENERGIA												
7.5.1.1	SUBESTAÇÃO AÉREA DE 500 KVA/13.800-380/220V COM QUADRO DE MEDIÇÃO E PROTEÇÃO GERAL, INCLUSIVE MALHA DE ATERRAMENTO - BASEADO EM SEINFRA (C4759)	UN	1,00	0,00		0,00	1,00	R\$ 194.413,21	R\$ 194.413,21	R\$ -	-	R\$ -	R\$ 194.413,21
8	SPCI												
8.1	SPCI												
8.1.1	EXTINTORES												
8.1.1.1	PREVENÇÃO E COMBATE A INCENDIO - EXTINTOR PO QUIMICO SECO ABC 4KG CAP.2.A. 20-B. C	UN	164,00	0,00		0,00	164,00	R\$ 147,09	R\$ 24.122,76	R\$ -	-	R\$ -	R\$ 24.122,76
8.1.2	SISTEMA DE ILUMINAÇÃO DE EMERGENCIA												
8.1.2.1	LUMINÁRIA DE EMERGENCIA, COM 30 LÂMPADAS LED DE 2 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020	UN	82,00	0,00		0,00	82,00	R\$ 37,84	R\$ 3.102,88	R\$ -	-	R\$ -	R\$ 3.102,88
8.1.3.1	SINALIZAÇÃO DE ORIENTAÇÃO E SALVAMENTO	U	82,00	0,00		0,00	82,00	R\$ 28,04	R\$ 2.299,28	R\$ -	-	R\$ -	R\$ 2.299,28
8.1.4	SINALIZAÇÃO DE EQUIPAMENTO												
8.1.4.1	PLACA FOTOLUMINESCENTE -E5- -300 X 300 MM	U	164,00	0,00		0,00	164,00	R\$ 25,34	R\$ 4.155,76	R\$ -	-	R\$ -	R\$ 4.155,76
8.1.5	SINALIZAÇÃO COMPLEMENTAR												

ITEM	DESCRIÇÃO	QUANTITATIVOS					VALORES					
		UNIDADE	QUANTITATIVO PREVISTO	ACUM. ANTERIOR	EXECUTADO REALIZADO	ACUM. FATURADO	SALDO A EXECUTAR	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL PREVISTO	ACUM. ANTERIOR	MEDIDO EXECUTADO	ACUM. FATURADO
8.1.5.1	PLACA DE INDICAÇÃO (CÓDIGO (M1 E M7) INDICAÇÃO SISTEMAS DE COMBATE A INCÊNDIO EXISTENTES NA EDIFICAÇÃO E NÃO DESLIGAMENTO DO QUADRO DE ENERGIA - 400X400MM - BASEADO EM CPQS (N.04.000.039071)	UN	82,00	0,00		0,00	82,00	R\$ 64,73	R\$ 5.307,86	R\$ -	R\$ -	R\$ 5.307,86
9	INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS											
9.1	ESGOTO											
9.1.1	ESGOTO											
9.1.1.1	CAIXA DE ESGOTO DE INSPEÇÃO/PASSAGEM EM ALVENARIA (60X60X60CM), REVESTIMENTO EM ARGAMASSA COM ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, COM TAMPA DE CONCRETO, INCLUSIVE ESCAVAÇÃO, REATERRO E TRANSPORTE E RETIRADA DO MATERIAL ESCAVADO (EM CAÇAMBA)	un	320,00	0,00		0,00	320,00	R\$ 501,78	R\$ 160.569,60	R\$ -	R\$ -	R\$ 160.569,60
9.1.1.2	CAIXA DE GORDURA/SABÃO EM ALVENARIA - BASEADO EM SEINFRA (C0601)	UN	134,00	0,00		0,00	134,00	R\$ 444,60	R\$ 59.576,40	R\$ -	R\$ -	R\$ 59.576,40
9.1.1.3	SIFÃO DO TIPO GARRAFAÇOPO EM PVC 1 1/4" X 1 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	328,00	0,00		0,00	328,00	R\$ 26,74	R\$ 8.770,72	R\$ -	R\$ -	R\$ 8.770,72
9.1.1.4	SIFÃO DO TIPO FLEXÍVEL COM ADAPTADOR EM PVC 1 1/2" X 1 1/2" (BASEADO SINAPI 86883)	UN	377,00	0,00		0,00	377,00	R\$ 27,91	R\$ 10.522,07	R\$ -	R\$ -	R\$ 10.522,07
9.1.1.5	VÁLVULA EM METAL 1 1/2" PARA PIA, TANQUE OU LAVATÓRIO, COM OU SEM LADRÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 - BASEADO SINAPI (86879)	UN	328,00	0,00		0,00	328,00	R\$ 90,00	R\$ 29.520,00	R\$ -	R\$ -	R\$ 29.520,00
9.1.1.6	RALO SIFONADO EM PVC 100 X 100 X 50 MM COM GRELHA REDONDA - BASEADO EM SETOP (ED-49954)	UN	656,00	0,00		0,00	656,00	R\$ 30,16	R\$ 19.784,96	R\$ -	R\$ -	R\$ 19.784,96
9.1.1.7	RALO SECO PVC QUADRADO 100 X 100 X 50 MM COM GRELHA BRANCA - BASEADO EM SETOP (ED-49954)	UN	656,00	0,00		0,00	656,00	R\$ 38,95	R\$ 25.551,20	R\$ -	R\$ -	R\$ 25.551,20
9.1.1.8	BUCHA DE REDUÇÃO LONGA, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL E ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	770,80	0,00		0,00	770,80	R\$ 13,06	R\$ 10.066,64	R\$ -	R\$ -	R\$ 10.066,64
9.1.1.9	CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	990,15	0,00		0,00	990,15	R\$ 16,16	R\$ 16.000,82	R\$ -	R\$ -	R\$ 16.000,82
9.1.1.10	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022	UN	783,10	0,00		0,00	783,10	R\$ 35,90	R\$ 28.113,29	R\$ -	R\$ -	R\$ 28.113,29
9.1.1.11	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	1705,60	0,00		0,00	1.705,60	R\$ 12,25	R\$ 20.893,60	R\$ -	R\$ -	R\$ 20.893,60
9.1.1.12	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022	UN	489,95	0,00		0,00	489,95	R\$ 12,94	R\$ 6.339,95	R\$ -	R\$ -	R\$ 6.339,95
9.1.1.13	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	334,15	0,00		0,00	334,15	R\$ 33,32	R\$ 11.133,87	R\$ -	R\$ -	R\$ 11.133,87
9.1.1.14	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	139,40	0,00		0,00	139,40	R\$ 11,92	R\$ 1.661,64	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.661,64
9.1.1.15	JOELHO 90 C/ANEL P/ ESGOTO SECUNDÁRIO 40 MM - 1 1/2"	UN	990,15	0,00		0,00	990,15	R\$ 15,66	R\$ 15.505,74	R\$ -	R\$ -	R\$ 15.505,74
9.1.1.16	JUNÇÃO DE REDUÇÃO INVERTIDA, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022	UN	69,70	0,00		0,00	69,70	R\$ 52,64	R\$ 3.669,00	R\$ -	R\$ -	R\$ 3.669,00
9.1.1.17	JUNÇÃO SIMPLIS, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022	UN	379,25	0,00		0,00	379,25	R\$ 66,85	R\$ 25.352,86	R\$ -	R\$ -	R\$ 25.352,86

ITEM	DESCRIÇÃO	QUANTITATIVOS					VALORES						
		UNIDADE	QUANTITATIVO PREVISTO	ACUM. ANTERIOR	EXECUTADO REALIZADO	ACUM. FATURADO	SALDO A EXECUTAR	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL PREVISTO	ACUM. ANTERIOR	MÉDIO EXECUTADO	ACUM. FATURADO	SALDO A EXECUTAR
9.1.1.18	JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022	UN	852,80	0,00		0,00	852,80	R\$ 66,85	R\$ 57.009,68	R\$ -	-	R\$ -	R\$ 57.009,68
9.1.1.19	JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDAVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	139,40	0,00		0,00	139,40	R\$ 17,60	R\$ 2.453,44	R\$ -	-	R\$ -	R\$ 2.453,44
9.1.1.20	LUNTA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022	UN	1031,15	0,00		0,00	1.031,15	R\$ 22,24	R\$ 22.932,77	R\$ -	-	R\$ -	R\$ 22.932,77
9.1.1.22	FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO PVC RÍGIDO, ESGOTO, PBV - SÉRIE NORMAL, DN 100 MM (4"), INCLUSIVE CONEXÕES	m	992,20	0,00		0,00	992,20	R\$ 54,43	R\$ 54.005,44	R\$ -	-	R\$ -	R\$ 54.005,44
9.1.1.23	FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO PVC RÍGIDO, ESGOTO, PB - SÉRIE NORMAL, DN 40MM (1.1/2"), INCLUSIVE CONEXÕES	m	998,35	0,00		0,00	998,35	R\$ 26,68	R\$ 26.635,97	R\$ -	-	R\$ -	R\$ 26.635,97
9.1.1.24	FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO PVC RÍGIDO, ESGOTO, PBV - SÉRIE NORMAL, DN 50 MM (2"), INCLUSIVE CONEXÕES	m	992,20	0,00		0,00	992,20	R\$ 36,58	R\$ 36.294,67	R\$ -	-	R\$ -	R\$ 36.294,67
9.1.2	ESGOTO (ENTERRADO)												
9.1.2.1	FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO PVC RÍGIDO, ESGOTO, PBV - SÉRIE NORMAL, DN 100 MM (4"), INCLUSIVE CONEXÕES	m	3511,855	0,00		0,00	3.511,86	R\$ 54,43	R\$ 191.150,26	R\$ -	-	R\$ -	R\$ 191.150,26
9.1.2.2	FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO PVC RÍGIDO, ESGOTO, PB - SÉRIE NORMAL, DN 40MM (1.1/2"), INCLUSIVE CONEXÕES	m	1029,10	0,00		0,00	1.029,10	R\$ 26,68	R\$ 27.456,38	R\$ -	-	R\$ -	R\$ 27.456,38
9.1.2.3	FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO PVC RÍGIDO, ESGOTO, PBV - SÉRIE NORMAL, DN 50 MM (2"), INCLUSIVE CONEXÕES	m	649,85	0,00		0,00	649,85	R\$ 36,58	R\$ 23.771,51	R\$ -	-	R\$ -	R\$ 23.771,51
9.2	ESGOTO (GORDURA)												
9.2.1	ESGOTO (GORDURA)												
9.2.1.1	INSTALAÇÃO DE SIÃO DE METAL PARA PIA, TIPO COPO COM ACABAMENTO CROMADO, DIÂMETRO (1.1/2"x1.1/2" OU 2"), INCLUSIVE FORNECIMENTO	U	328,00	0,00		0,00	328,00	R\$ 253,99	R\$ 83.306,72	R\$ -	-	R\$ -	R\$ 83.306,72
9.2.1.2	VALVULA EM PLÁSTICO 1 PARA PIA, TANQUE OU LAVATÓRIO, COM OU SEM LABRÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	328,00	0,00		0,00	328,00	R\$ 11,36	R\$ 3.726,08	R\$ -	-	R\$ -	R\$ 3.726,08
9.2.1.3	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022	UN	192,70	0,00		0,00	192,70	R\$ 35,90	R\$ 6.917,93	R\$ -	-	R\$ -	R\$ 6.917,93
9.2.1.4	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDAVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	24,60	0,00		0,00	24,60	R\$ 12,25	R\$ 301,35	R\$ -	-	R\$ -	R\$ 301,35
9.2.1.5	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022	UN	1057,80	0,00		0,00	1.057,80	R\$ 12,94	R\$ 13.687,93	R\$ -	-	R\$ -	R\$ 13.687,93
9.2.1.6	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	668,30	0,00		0,00	668,30	R\$ 17,64	R\$ 11.788,81	R\$ -	-	R\$ -	R\$ 11.788,81
9.2.1.7	JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022	UN	315,70	0,00		0,00	315,70	R\$ 66,85	R\$ 21.104,54	R\$ -	-	R\$ -	R\$ 21.104,54
9.2.1.8	JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	172,20	0,00		0,00	172,20	R\$ 32,86	R\$ 5.658,49	R\$ -	-	R\$ -	R\$ 5.658,49

ITEM	DESCRIÇÃO	QUANTITATIVOS					VALORES						
		UNIDADE	QUANTITATIVO PREVISTO	ACUM. ANTERIOR	EXECUTADO REALIZADO	ACUM. FATURADO	SALDO A EXECUTAR	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL PREVISTO	ACUM. ANTERIOR	MEDIDO EXECUTADO	ACUM. FATURADO	SALDO A EXECUTAR
9.2.1.9	LUBA SIMPLER, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	2451,80	0,00		0,00	2.451,80	R\$ 11,31	R\$ 27.729,85	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 27.729,85
9.2.1.10	LUBA SIMPLER, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	656,00	0,00		0,00	656,00	R\$ 21,32	R\$ 13.985,92	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 13.985,92
9.2.1.11	FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO PVC RÍGIDO, ESGOTO, PBV - SÉRIE NORMAL, DN 50 MM (2"), INCLUSIVE CONEXÕES	m	1785,55	0,00		0,00	1.785,55	R\$ 36,58	R\$ 65.315,41	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 65.315,41
9.2.1.12	TE, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	268,00	0,00		0,00	268,00	R\$ 29,45	R\$ 7.892,60	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 7.892,60
9.2.2	ESGOTO (GORDURA ENTERRADA)												
9.2.2.1	CAIXA DE GORDURA 100 L CONCRETO PADRÃO GOINFRA IMPERMEABILIZADA - BASEADO EM AGETOP CIVIL (081851)	UN	328,00	0,00		0,00	328,00	R\$ 775,75	R\$ 254.446,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 254.446,00
9.2.2.2	FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO PVC RÍGIDO, ESGOTO, PBV - SÉRIE NORMAL, DN 100 MM (4"), INCLUSIVE CONEXÕES	m	1390,00	0,00		0,00	1.390,00	R\$ 54,43	R\$ 75.657,70	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 75.657,70
9.2.2.3	FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO PVC RÍGIDO, ESGOTO, PBV - SÉRIE NORMAL, DN 50 MM (2"), INCLUSIVE CONEXÕES	m	411,00	0,00		0,00	411,00	R\$ 36,58	R\$ 15.034,38	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 15.034,38
9.3	VENTILAÇÃO												
9.3.1	VENTILAÇÃO												
9.3.1.1	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022	UN	1391,95	0,00		0,00	1.391,95	R\$ 12,94	R\$ 18.011,83	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 18.011,83
9.3.1.2	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022	UN	863,05	0,00		0,00	863,05	R\$ 11,88	R\$ 10.253,03	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 10.253,03
9.3.1.3	JUNÇÃO SIMPLER, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022	UN	528,90	0,00		0,00	528,90	R\$ 25,19	R\$ 13.322,99	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 13.322,99
9.3.1.4	LUBA SIMPLER, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022	UN	2029,50	0,00		0,00	2.029,50	R\$ 7,39	R\$ 14.998,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 14.998,00
9.3.1.5	TERMINAL DE VENTILAÇÃO, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022	UN	328,00	0,00		0,00	328,00	R\$ 15,24	R\$ 4.998,72	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 4.998,72
9.3.1.6	FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO PVC RÍGIDO, ESGOTO, PBV - SÉRIE NORMAL, DN 50 MM (2"), INCLUSIVE CONEXÕES	m	1310,00	0,00		0,00	1.310,00	R\$ 36,58	R\$ 47.919,80	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 47.919,80
9.3.1.7	TE, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022	UN	328,00	0,00		0,00	328,00	R\$ 49,63	R\$ 16.278,64	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 16.278,64
9.3.2	VENTILAÇÃO (ENTERRADA)												
9.3.2.1	FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO PVC RÍGIDO, ESGOTO, PBV - SÉRIE NORMAL, DN 50 MM (2"), INCLUSIVE CONEXÕES	m	1005,00	0,00		0,00	1.005,00	R\$ 36,58	R\$ 36.762,90	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 36.762,90
9.4	ALIMENTAÇÃO												
9.4.1	ALIMENTAÇÃO												

ITEM	DESCRIÇÃO	QUANTITATIVOS					VALORES						
		UNIDADE	QUANTITATIVO PREVISTO	ACUM. ANTERIOR	EXECUTADO REALIZADO	ACUM. FATURADO	SALDO A EXECUTAR	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL PREVISTO	ACUM. ANTERIOR	MÉDIO EXECUTADO	ACUM. FATURADO	SALDO A EXECUTAR
9.4.1.1	REGISTRO DE ESFERA, PVC, ROSCAVEL, COM BORBOLETA, 3/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_09/2021	UN	328.00	0,00		0,00	328.00	R\$ 25,53	R\$ 8.373,84	R\$ -	-	R\$ -	R\$ 8.373,84
9.4.1.2	REGISTRO DE GAUETA BRUTO, LATÃO, ROSCAVEL, 1 1/4", COM ACABAMENTO E CANOPIA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_08/2021	UN	328.00	0,00		0,00	328.00	R\$ 244,51	R\$ 80.199,28	R\$ -	-	R\$ -	R\$ 80.199,28
9.4.1.3	JOELHO 90 SOLDÁVEL, C/ ROSCA - 25 MM - 3/4" (BASEADO SBC 052233)	UN	328.00	0,00		0,00	328.00	R\$ 40,45	R\$ 13.267,60	R\$ -	-	R\$ -	R\$ 13.267,60
9.4.1.4	COLAR DE TOMADA EM PVC 3/4" - PVC MISTO SOLDÁVEL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, (BASEADO SINAPI 88396)	UN	328.00	0,00		0,00	328.00	R\$ 21,42	R\$ 7.025,76	R\$ -	-	R\$ -	R\$ 7.025,76
9.4.1.5	FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO PVC RÍGIDO ROSCAVEL, ÁGUA FRIA, DN 3/4" (25 MM), INCLUSIVE CONEXÕES	m	50,00	0,00		0,00	50,00	R\$ 40,48	R\$ 2.024,00	R\$ -	-	R\$ -	R\$ 2.024,00
9.4.1.6	FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO PVC RÍGIDO ROSCAVEL, ÁGUA FRIA, DN 1,1/4" (40 MM), INCLUSIVE CONEXÕES	m	49,00	0,00		0,00	49,00	R\$ 68,79	R\$ 3.370,71	R\$ -	-	R\$ -	R\$ 3.370,71
9.4.1.7	ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25 MM X 3/4", INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_06/2016	UN	328.00	0,00		0,00	328.00	R\$ 7,48	R\$ 2.453,44	R\$ -	-	R\$ -	R\$ 2.453,44
9.4.1.8	ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 40 MM X 1 1/4", INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_06/2016	UN	328.00	0,00		0,00	328.00	R\$ 15,14	R\$ 4.965,92	R\$ -	-	R\$ -	R\$ 4.965,92
9.4.1.9	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_06/2022	UN	822.05	0,00		0,00	822.05	R\$ 9,86	R\$ 8.105,41	R\$ -	-	R\$ -	R\$ 8.105,41
9.4.1.10	FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO PVC RÍGIDO SOLDÁVEL, ÁGUA FRIA, DN 25 MM (3/4") , INCLUSIVE CONEXÕES	m	3478,85	0,00		0,00	3.478,85	R\$ 27,70	R\$ 96.364,14	R\$ -	-	R\$ -	R\$ 96.364,14
9.4.1.11	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_06/2022	UN	268.00	0,00		0,00	268.00	R\$ 21,98	R\$ 5.890,64	R\$ -	-	R\$ -	R\$ 5.890,64
9.4.1.12	FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO PVC RÍGIDO SOLDÁVEL, ÁGUA FRIA, DN 40 MM (1,1/4"), INCLUSIVE CONEXÕES	m	268.00	0,00		0,00	268.00	R\$ 48,71	R\$ 13.054,28	R\$ -	-	R\$ -	R\$ 13.054,28
9.4.2	ALIMENTAÇÃO (ENTERRADA)												
9.4.2.1	JOELHO 90 PVC SOLD/ROSCA - D= 25MMX3/4" - BASEADO EM SEINFRA (C/1526)	UN	328.00	0,00		0,00	328.00	R\$ 15,03	R\$ 4.929,84	R\$ -	-	R\$ -	R\$ 4.929,84
9.4.2.2	FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO PVC RÍGIDO SOLDÁVEL, ÁGUA FRIA, DN 25 MM (3/4"), INCLUSIVE CONEXÕES	m	328.00	0,00		0,00	328.00	R\$ 27,70	R\$ 9.085,60	R\$ -	-	R\$ -	R\$ 9.085,60
9.5	ÁGUA FRIA												
9.5.1	ÁGUA FRIA												
9.5.1.1	DUCHA HIGIÊNICA COM REGISTRO PARA CONTROLE DE FLUXO DE ÁGUA, DIÂMETRO 1/2" (20MM), INCLUSIVE FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	un	328.00	0,00		0,00	328.00	R\$ 180,62	R\$ 59.243,36	R\$ -	-	R\$ -	R\$ 59.243,36
9.5.1.2	ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2 X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_01/2020	UN	328.00	0,00		0,00	328.00	R\$ 14,38	R\$ 4.716,64	R\$ -	-	R\$ -	R\$ 4.716,64
9.5.1.3	REGISTRO DE GAUETA, TIPO BRUTO, ROSCAVEL, 3/4" (PARA TUBO SOLDÁVEL, OU PPR DN 25MM/CVPC DN 22MM), INCLUSIVE VOLANTE PARA AÇÃOAMENTO	un	1991,00	0,00		0,00	1.991,00	R\$ 40,04	R\$ 79.719,64	R\$ -	-	R\$ -	R\$ 79.719,64
9.5.1.4	ENGATE FLEXÍVEL EM INOX, 1/2 X 30CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_01/2020	UN	328.00	0,00		0,00	328.00	R\$ 67,96	R\$ 22.290,88	R\$ -	-	R\$ -	R\$ 22.290,88
9.5.1.5	ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2 X 30CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_01/2020	UN	328.00	0,00		0,00	328.00	R\$ 12,61	R\$ 4.136,08	R\$ -	-	R\$ -	R\$ 4.136,08
9.5.1.6	JOELHO 90 REDUÇÃO PVC SOLD/ROSCA DE LATÃO 25MMX1/2" - BASEADO EM SBC 052233	UN	328.00	0,00		0,00	328.00	R\$ 38,84	R\$ 12.739,52	R\$ -	-	R\$ -	R\$ 12.739,52
9.5.1.7	LUA DE REDUÇÃO SOLDÁVEL, C/ROSCA 25 X 3/4", FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - BASEADO EM AGETOP CIVIL (081121)	UN	328.00	0,00		0,00	328.00	R\$ 32,16	R\$ 10.548,48	R\$ -	-	R\$ -	R\$ 10.548,48

ITEM	DESCRIÇÃO	QUANTITATIVOS				VALORES							
		UNIDADE	QUANTITATIVO PREVISTO	ACUM. ANTERIOR	EXECUTADO REALIZADO	ACUM. FATURADO	SALDO A EXECUTAR	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL PREVISTO	ACUM. ANTERIOR	MEDIDO EXECUTADO	ACUM. FATURADO	SALDO A EXECUTAR
9.5.1.8	ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO. PVC, SOLDÁVEL, DN 25 MM X 3/4. INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016	UN	3605,95	0,00		0,00	3.605,95	R\$ 7,48	R\$ 26.972,50	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 26.972,50
9.5.1.9	BUCHA DE REDUÇÃO, CURTA, PVC, SOLDÁVEL, DN 32 X 25 MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	278,80	0,00		0,00	278,80	R\$ 8,36	R\$ 2.330,76	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 2.330,76
9.5.1.10	BUCHA DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM X 32MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	69,70	0,00		0,00	69,70	R\$ 8,54	R\$ 595,23	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 595,23
9.5.1.11	BUCHA DE REDUÇÃO, LONGA, PVC, SOLDÁVEL, DN 40 X 25 MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	118,90	0,00		0,00	118,90	R\$ 10,51	R\$ 1.249,63	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.249,63
9.5.1.12	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	6824,45	0,00		0,00	6.824,45	R\$ 6,17	R\$ 42.106,85	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 42.106,85
9.5.1.13	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	984,00	0,00		0,00	984,00	R\$ 17,06	R\$ 16.787,04	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 16.787,04
9.5.1.14	JOELHO DE REDUÇÃO, 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32 MM X 25 MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	73,80	0,00		0,00	73,80	R\$ 17,84	R\$ 1.316,59	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.316,59
9.5.1.15	LUVA DE CORRER, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	360,80	0,00		0,00	360,80	R\$ 54,11	R\$ 19.522,88	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 19.522,88
9.5.1.16	FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO PVC RÍGIDO SOLDÁVEL, ÁGUA FRIA, DN 25 MM (3/4"), INCLUSIVE CONEXÕES	m	5588,30	0,00		0,00	5.588,30	R\$ 27,70	R\$ 154.795,91	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 154.795,91
9.5.1.17	FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO PVC RÍGIDO SOLDÁVEL, ÁGUA FRIA, DN 32 MM (1"), INCLUSIVE CONEXÕES	m	51,66	0,00		0,00	51,66	R\$ 39,19	R\$ 2.024,55	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 2.024,55
9.5.1.18	FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO PVC RÍGIDO SOLDÁVEL, ÁGUA FRIA, DN 40 MM (1.1/4"), INCLUSIVE CONEXÕES	m	794,58	0,00		0,00	794,58	R\$ 48,71	R\$ 38.703,99	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 38.703,99
9.5.1.19	TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM X 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	139,40	0,00		0,00	139,40	R\$ 23,69	R\$ 3.302,38	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 3.302,38
9.5.1.20	TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM X 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	213,20	0,00		0,00	213,20	R\$ 29,54	R\$ 6.297,92	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 6.297,92
9.5.1.21	JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25 MM, X 3/4 INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016	UN	1230,00	0,00		0,00	1.230,00	R\$ 12,15	R\$ 14.944,50	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 14.944,50
9.5.1.22	JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, X 1/2 INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	761,00	0,00		0,00	761,00	R\$ 16,79	R\$ 12.777,19	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 12.777,19
9.5.1.23	KIT CAVALETE PARA MEDIÇÃO DE ÁGUA, INSTALADO SOBRE PISO, EM AÇO GALVANIZADO DN 25MM (3/4") - PADRÃO CONCESSIONÁRIA	un	328,00	0,00		0,00	328,00	R\$ 388,65	R\$ 127.477,20	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 127.477,20
9.5.1.24	HIDRÔMETRO DN 25 (1/2), 5,0 M³/H FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016	UN	328,00	0,00		0,00	328,00	R\$ 256,21	R\$ 84.036,88	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 84.036,88
9.5.1.25	CAIXA D'ÁGUA EM POLIETILENO, 2000 LITROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2021	UN	100,00	0,00		0,00	100,00	R\$ 1.339,09	R\$ 133.909,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 133.909,00
9.5.1.26	CAIXA D'ÁGUA EM POLIETILENO, 2500 LITROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2021 - BASEADO EM SINAPI (102615)	UN	32,00	0,00		0,00	32,00	R\$ 3.004,29	R\$ 96.137,28	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 96.137,28
9.5.2	ÁGUA FRIA (ENTERRADA)												
9.5.2.1	FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO PVC RÍGIDO SOLDÁVEL, ÁGUA FRIA, DN 25 MM (3/4"), INCLUSIVE CONEXÕES	m	3987,05	0,00		0,00	3.987,05	R\$ 27,70	R\$ 110.441,14	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 110.441,14
9.5.2.2	FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO PVC RÍGIDO SOLDÁVEL, ÁGUA FRIA, DN 40 MM (1.1/4"), INCLUSIVE CONEXÕES	m	2951,918	0,00		0,00	2.951,92	R\$ 48,71	R\$ 143.787,92	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 143.787,92
10	LIMPEZA FINAL DE OBRA												

ITEM	DESCRIÇÃO	QUANTITATIVOS						VALORES					
		UNIDADE	QUANTITATIVO PREVISTO	ACUM. ANTERIOR	EXECUTADO REALIZADO	ACUM. FATURADO	SALDO A EXECUTAR	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL PREVISTO	ACUM. ANTERIOR	MEDIDO EXECUTADO	ACUM. FATURADO	SALDO A EXECUTAR
10.1	LIMPEZA FINAL												
10.1.1	LIMPEZA FINAL												
10.1.1.1	LIMPEZA FINAL PARA ENTREGA DA OBRA	m2	40824,52	0,00		0,00	40.824,52	R\$ 7,84	R\$ 320.064,23	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 320.064,23
11	PRIMEIRO TERMO ADITIVO												
1	ESCAVAÇÃO E CARGA MECANIZADA DE MATERIAL DE 2ª CATEGORIA	M³	30647,85	22842,63	166,01	23008,64	7.639,21	R\$ 11,02	R\$ 337.739,31	R\$ 251.725,78	R\$ 1.829,43	R\$ 253.555,21	R\$ 84.184,10
2	ESCAVAÇÃO EM MATERIAL DE 3ª CATEGORIA - RESISTÊNCIA À COMPRESSÃO ACIMA DE 110 MPa - COM ESCAVADEIRA E ROMPEDOR HIDRÁULICO 1.700 KG	M³	20295,5722	12353,67	773,84	13127,51	7.168,06	R\$ 146,36	R\$ 2.970.459,95	R\$ 1.808.082,55	R\$ 113.259,66	R\$ 1.921.342,21	R\$ 1.049.117,74
TOTAL GERAL									R\$ 99.413.312,58	R\$ 6.365.876,47	R\$ 861.876,25	R\$ 7.227.752,72	R\$ 92.185.559,86

COMISSÃO PERMANENTE DE MEDIÇÕES DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA, OBRAS E VERIFICAÇÃO DE ESPECIFICAÇÕES NOMEADA PELA PORTARIA Nº PMC/91 DE 10 DE JANEIRO DE 2022 E DEMAIS ALTERÇÕES

Sandra Raquel Lacerda Magre (Presidente)

Ederston Vieira Gonçalves (Membro)

Mikael Sousa Guimarães (Membro)

Junio Faier Lima Barbosa (Membro)

COMISSÃO PERMANENTE DE MEDIÇÕES DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA, OBRAS E VERIFICAÇÃO DE ESPECIFICAÇÕES NOMEADA PELA PORTARIA Nº PMC/91 DE 10 DE JANEIRO DE 2022 E DEBATS ALTERÇÕES.

Sandra Raquel Lapenda Miliage (Presidente)

Ederson Vieira Gonçalves (Membro)

Mikael Sousa Guimarães (Membro)

Junio Fátima Barbosa (Membro)



PREFEITURA DE CONGONHAS

SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO - 11º MEDIÇÃO

Contratada: Consórcio CH Goiabeiras (Conata Engenharia, Sinarco Engenharia e Infracon Engenharia .)

Contrato: PMC/344/2023 de 20/11/2023, Concorrência Pública nº PMC 006/2023, PRC086/2023 Processo.

Período: 01/09/2024 a 30/09/2024

Fiscal: Ivan Lopes

Objeto: Execução de 328 moradias, sendo 82 prédios, compostos de 2 apartamentos por pavimento e 2 pavimentos, no loteamento Goiabeiras, Congonhas MG.

Etapa: Foto 1

Escavação, carga e transporte material de primeira categoria.

FOTO 1

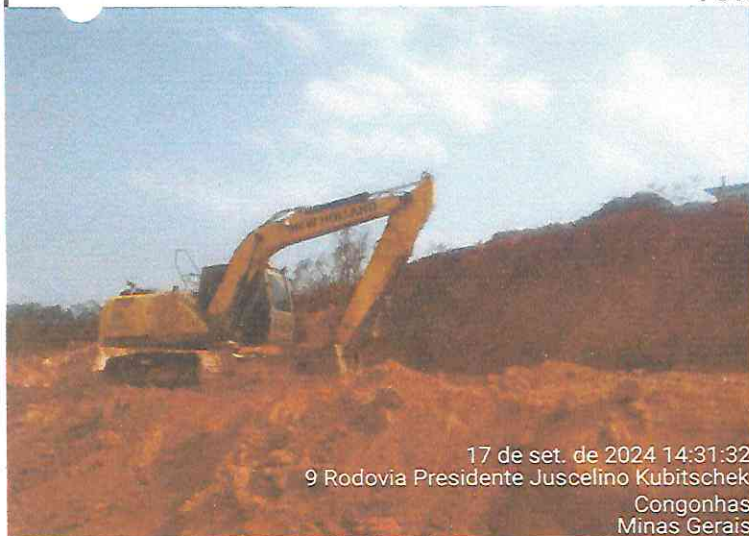


FOTO 2



Descrição do serviço: Foto 1 e 2 -Escavação, carga e transporte material de primeira categoria.. Veiculos de placas: HHK3E10, HBN0J01,GXS9368,OPT3J71,RNE6130,GMQ2158.

Ivan Lopes Fernandes
Engenheiro Fiscal - SEMOBI

Ivan Lopes Fernandes
Eng. Civil
CREA 220760/D

Filipe H. Alves Modesto da Silva Modesto CREA 228225/D
CONSÓRCIO CH GOIABEIRAS LTDA



PREFEITURA DE CONGONHAS

SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO - 11º MEDIÇÃO

Contratada: Consórcio CH Goiabeiras (Conata Engenharia, Sinarco Engenharia e Infracon Engenharia .)

Contrato: PMC/344/2023 de 20/11/2023, Concorrência Pública nº PMC 006/2023, PRC086/2023 Processo.

Período: 01/09/2024 a 30/09/2024

Fiscal: Ivan Lopes

Objeto: Execução de 328 moradias, sendo 82 prédios, compostos de 2 apartamentos por pavimento e 2 pavimentos, no loteamento Goiabeiras, Congonhas MG.

Etapas: Foto 1

Escavação, carga e transporte material de segunda e terceira categoria.

FOTO 1



FOTO 2



Descrição do serviço: Foto 1 e 2 -Escavação, carga e transporte material de segunda e terceira categoria.. Veiculos de placas: HHK3E10, HBN0J01,GXS9368,OPT3J71,RNE6130,GMQ2158.

Ivan Lopes Fernandes
Engenheiro Fiscal - SEMOBI

Ivan Lopes Fernandes
Eng. Civil
CREA 228708/D

Designed by:
FIUPE

Filipe H. Alves Modesto da Silva Modesto CREA 228225/D
CONSÓRCIO CH GOIABEIRAS LTDA

PREFEITURA DE CONGONHAS

SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO - 11º MEDIÇÃO

Contratada: Consórcio CH Goiabeiras (Conata Engenharia, Sinarco Engenharia e Infracon Engenharia .)

Contrato: PMC/344/2023 de 20/11/2023, Concorrência Pública nº PMC 006/2023, PRC086/2023 Processo.

Período: 01/09/2024 a 30/09/2024

Fiscal: Ivan Lopes

Objeto: Execução de 328 moradias, sendo 82 prédios, compostos de 2 apartamentos por pavimento e 2 pavimentos, no loteamento Goiabeiras, Congonhas MG.

Etapa: Foto 1 - Locação Topográfica.

FOTO 1



FOTO 2



Descrição do serviço: Foto 2 - Locação Topográfica.

Ivan Lopes Fernandes
Engenheiro Fiscal - SEMOBI

Ivan Lopes Fernandes
Eng. Civil
CREA 220760/D

Filipe H. Alves Modesto da Silva Modesto CREA 228225/D
CONSÓRCIO CH GOIABEIRAS LTDA



PREFEITURA DE CONGONHAS
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA
RELATÓRIO FOTOGRÁFICO - 11º MEDIÇÃO

Contratada: Consórcio CH Goiabeiras (Conata Engenharia, Sinarco Engenharia e Infracon Engenharia .)
Contrato: PMC/344/2023 de 20/11/2023, Concorrência Pública nº PMC 006/2023, PRC086/2023 Processo.
Período: 01/09/2024 a 30/09/2024
Fiscal: Ivan Lopes
Objeto: Execução de 328 moradias, sendo 82 prédios, compostos de 2 apartamentos por pavimento e 2 pavimentos, no loteamento Goiabeiras, Congonhas MG.

FOTO 1



FOTO 2



Descrição do serviço: Mobilização de escritório, Banheiro com ducha

Ivan Lopes Fernandes
Engenheiro Fiscal - SEMOBI

DocuSigned by:
FILIPE
Filipe H. Alves Modesto da Silva Modesto CREA 228225/D
CONSÓRCIO CH GOIABEIRAS LTDA

Ivan Lopes Fernandes
Eng. Civil
CREA 220760/D



PREFEITURA DE CONGONHAS
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA
RELATÓRIO FOTOGRÁFICO - 11º MEDIÇÃO

Contratada: Consórcio CH Goiabeiras (Conata Engenharia, Sinarco Engenharia e Infracon Engenharia .)
Contrato: PMC/344/2023 de 20/11/2023, Concorrência Pública nº PMC 006/2023, PRC086/2023 Processo.
Período: 01/09/2024 a 30/09/2024
Fiscal: Ivan Lopes
Objeto: Execução de 328 moradias, sendo 82 prédios, compostos de 2 apartamentos por pavimento e 2 pavimentos, no loteamento Goiabeiras, Congonhas MG.

Etapa: Foto 1 - Container e banheiro disponível na portaria

FOTO 1

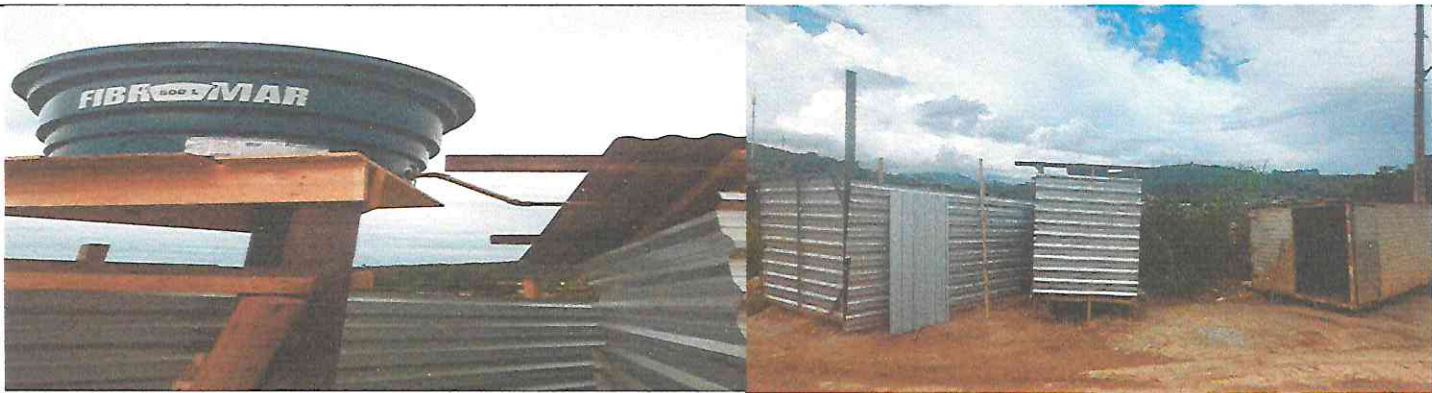


FOTO 2



Descrição do serviço: Mobilização do banheiro, ligação provisória, fossa (portaria) e foto interna do container

Ivan Lopes Fernandes
Engenheiro Fiscal - SEMOBI

DocuSigned by:
FUIPE
Filipe H. Alves Modesto da Silva Modesto CREA 228225/D
CONSÓRCIO CH GOIABEIRAS LTDA

Ivan Lopes Fernandes
Eng. Civil
CREA 220760/D



PREFEITURA DE CONGONHAS

SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO - 11ª MEDIÇÃO

Contratada: Consórcio CH Goiabeiras (Conata Engenharia, Sinarco Engenharia e Infracon Engenharia .)

Contrato: PMC/344/2023 de 20/11/2023, Concorrência Pública nº PMC 006/2023, PRC086/2023 Processo.

Período: 01/09/2024 a 30/09/2024

Fiscal: Ivan Lopes

Objeto: Execução de 328 moradias, sendo 82 prédios, compostos de 2 apartamentos por pavimento e 2 pavimentos, no loteamento Goiabeiras, Congonhas MG.

Etapas: Foto 1

Aterro dos platôs

FOTO 1




3 de set. de 2024 09:29:32
6 Rua Constant Gaggiato
Congonhas
Minas Gerais




07/09/2024 09:48
Rua Constant Gaggiato Congonhas
36415-000
20.515 43.84 W

FOTO 2

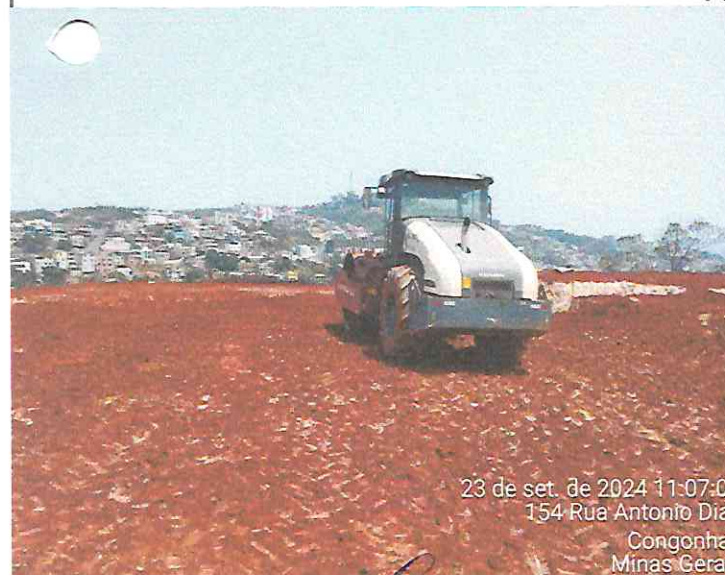

23 de set. de 2024 11:07:04
154 Rua Antonio Dias
Congonhas
Minas Gerais

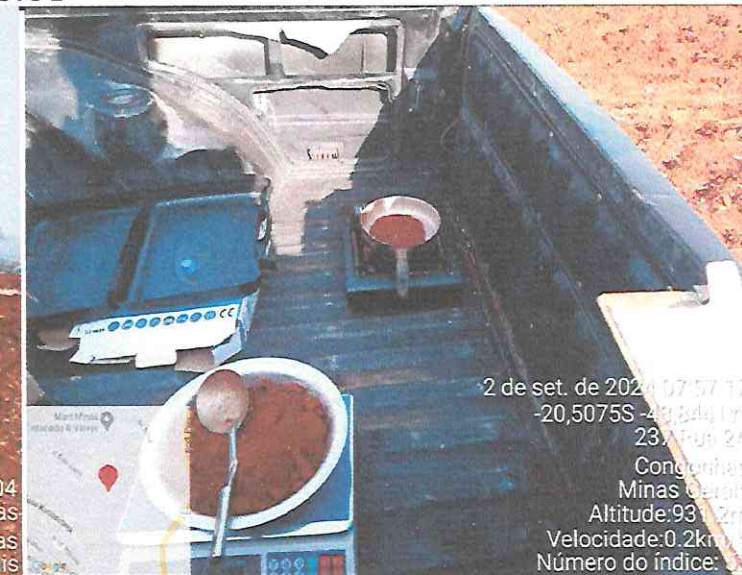

2 de set. de 2024 07:57:17
-20,5075S -43,8419W
23/9/24
Congonhas
Minas Gerais
Altitude: 937,2m
Velocidade: 0.2km/h
Número do índice: 1

Ivan Lopes Fernandes
Engenheiro Fiscal - SEMOBI

Ivan Lopes Fernandes
Eng. Civil
CPF: 0.220.784.10

Filipe H. Alves Modesto da Silva Modesto CREA 228225/D
CONSÓRCIO CH GOIABEIRAS LTDA

PREFEITURA DE CONGONHAS

SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO - 11ª MEDIÇÃO

Contratada: Consórcio CH Goiabeiras (Conata Engenharia, Sinarco Engenharia e Infracon Engenharia .)

Contrato: PMC/344/2023 de 20/11/2023, Concorrência Pública nº PMC 006/2023, PRC086/2023 Processo.

Período: 01/09/2024 a 30/09/2024

Fiscal: Ivan Lopes

Objeto: Execução de 328 moradias, sendo 82 prédios, compostos de 2 apartamentos por pavimento e 2 pavimentos, no loteamento Goiabeiras, Congonhas MG.

Etapas: Foto 1

Escavação de material de terceira categoria.

FOTO 1



FOTO 2



Descrição do serviço: Foto 1 e 2 - Transporte de material de terceira categoria . Veículos de placas: HHK3E10, HBN0J01,GXS9368,OPT3J71,RNE6130,GMQ2158.

Ivan Lopes Fernandes
Engenheiro Fiscal - SEMOBI

Ivan Lopes Fernandes
Eng. Civil
CREA 226760/D

DocuSigned by:
FILIPE

Filipe H. Alves Modesto da Silva Modesto CREA 228225/D
CONSÓRCIO CH GOIABEIRAS LTDA

PREFEITURA DE CONGONHAS

SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO - 11ª MEDIÇÃO

Contratada: Consórcio CH Goiabeiras (Conata Engenharia, Sinarco Engenharia e Infracon Engenharia .)

Contrato: PMC/344/2023 de 20/11/2023, Concorrência Pública nº PMC 006/2023, PRC086/2023 Processo.

Período: 01/09/2024 a 30/09/2024

Fiscal: Ivan Lopes

Objeto: Execução de 328 moradias, sendo 82 prédios, compostos de 2 apartamentos por pavimento e 2 pavimentos, no loteamento Goiabeiras, Congonhas MG.


Etapas: Foto 1

Carga e transporte material de segunda e terceira categoria.

FOTO 1



FOTO 2

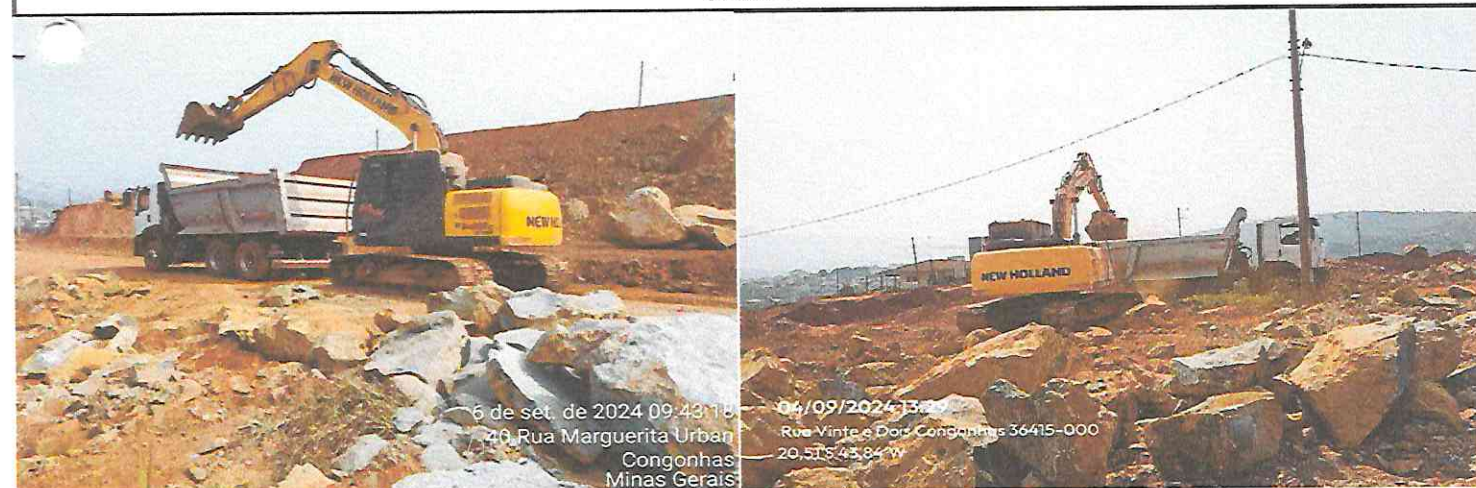

Descrição do serviço: Foto 1 e 2 - Carga e transporte material de segunda e terceira categoria. Veículos de placas: HHK3E10, HBN0J01,GXS9368,OPT3J71,RNE6130,GMQ2158.

Ivan Lopes Fernandes
Engenheiro Fiscal - SEMOBI

Filipe H. Alves Modesto da Silva Modesto CREA 228225/D
CONSÓRCIO CH GOIABEIRAS LTDA

Ivan Lopes Fernandes
Eng. Civil
CREA 220760/D



PREFEITURA DE CONGONHAS

SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO - 11º MEDIÇÃO

Contratada: Consórcio CH Goiabeiras (Conata Engenharia, Sinarco Engenharia e Infracon Engenharia .)

Contrato: PMC/344/2023 de 20/11/2023, Concorrência Pública nº PMC 006/2023, PRC086/2023 Processo.

Período: 01/09/2024 a 30/09/2024

Fiscal: Ivan Lopes

Objeto: Execução de 328 moradias, sendo 82 prédios, compostos de 2 apartamentos por pavimento e 2 pavimentos, no loteamento Goiabeiras, Congonhas MG.

Etapas: Foto 1

Escavação de material de terceira categoria.

FOTO 1



FOTO 2



Descrição do serviço: Foto 1 e 2 - Escavação de material de terceira categoria.

Ivan Lopes Fernandes
Engenheiro Fiscal - SEMOB
Ivan Lopes Fernandes
Eng. Civil
CREA 228760/D

Filipe H. Alves Modesto da Silva Modesto CREA 228225/D
CONSÓRCIO CH GOIABEIRAS LTDA

PREFEITURA DE CONGONHAS

SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO - 11º MEDIÇÃO

Contratada: Consórcio CH Goiabeiras (Conata Engenharia, Sinarco Engenharia e Infracon Engenharia .)

Contrato: PMC/344/2023 de 20/11/2023, Concorrência Pública nº PMC 006/2023, PRC086/2023 Processo.

Período: 01/09/2024 a 30/09/2024

Fiscal: Ivan Lopes

Objeto: Execução de 328 moradias, sendo 82 prédios, compostos de 2 apartamentos por pavimento e 2 pavimentos, no loteamento Goiabeiras, Congonhas MG.

Etapa: Foto 1

Escavação de material de terceira categoria.

FOTO 1



FOTO 2



Descrição do serviço: Foto 2 - Transporte de material de terceira categoria. Veículos de placas: HHK3E10, HBN0J01,GXS9368,OPT3J71,RNE6130,GMQ2158.

Ivan Lopes Fernandes
Engenheiro Fiscal - SEMOB

Ivan Lopes Fernandes
Eng. Civil
CREA 220760/D

Filipe H. Alves Modesto da Silva Modesto CREA 228225/D
CONSÓRCIO CH GOIABEIRAS LTDA



PREFEITURA DE CONGONHAS

SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO - 11ª MEDIÇÃO

Contratada: Consórcio CH Goiabeiras (Conata Engenharia, Sinarco Engenharia e Infracon Engenharia.)

Contrato: PMC/344/2023 de 20/11/2023, Concorrência Pública nº PMC 006/2023, PRC086/2023 Processo.

Período: 01/09/2024 a 30/09/2024

Fiscal: Ivan Lopes

Objeto: Execução de 328 moradias, sendo 82 prédios, compostos de 2 apartamentos por pavimento e 2 pavimentos, no loteamento Goiabeiras, Congonhas MG.

Etapa: Foto 1

Escavação de material de terceira categoria.

FOTO 1

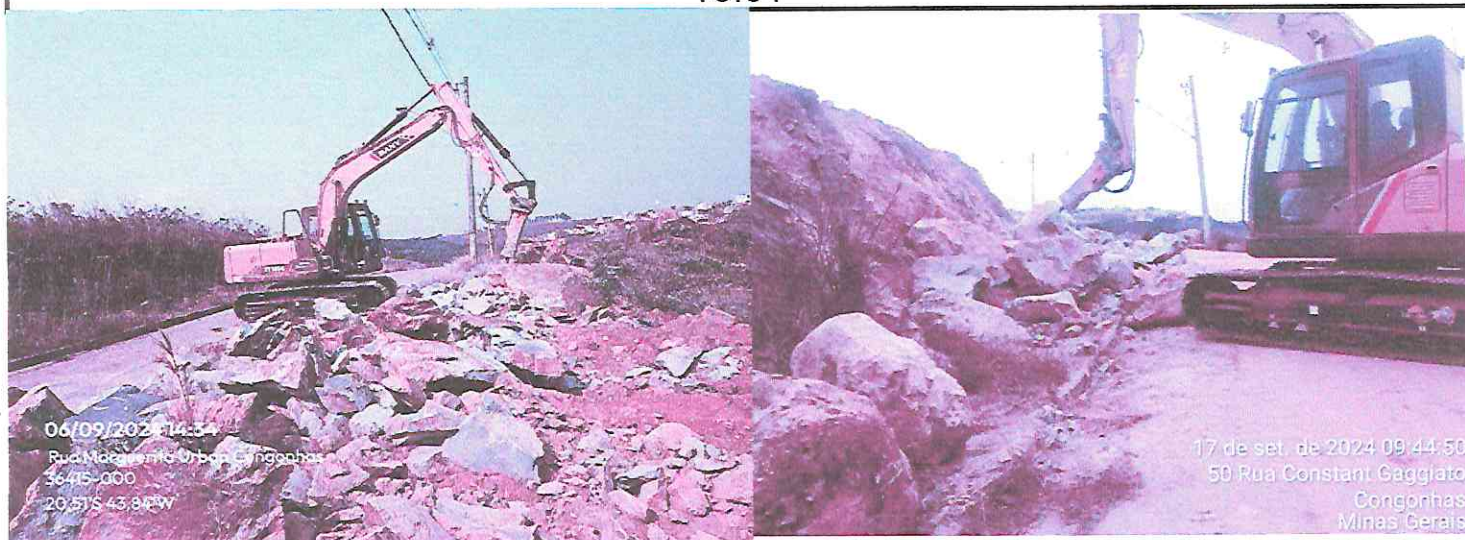


FOTO 2



Descrição do serviço: Foto 1 e 2 - Carga e transporte material de terceira categoria. Veículos de placas: HHK3E10, HBN0J01, GXS9368, OPT3J71, RNE6130, GMQ2158.

Ivan Lopes Fernandes
Engenheiro Fiscal - SEMOBI

Ivan Lopes Fernandes
Eng. Civil
CREA 220760/D

Assinado por:
FIUPE

Filipe H. Alves Modesto da Silva Modesto CREA 228225/D
CONSÓRCIO CH GOIABEIRAS LTDA

			SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA DE MINAS GERAIS		
CERTIDÃO DE DÉBITOS TRIBUTÁRIOS Negativa			CERTIDÃO EMITIDA EM: 28/10/2024		
			CERTIDÃO VALIDA ATÉ: 26/01/2025		
NOME/NOME EMPRESARIAL: CONSORCIO CH GOIABEIRAS					
INSCRIÇÃO ESTADUAL: 004892630.00-13		CNPJ/CPF: 52.383.860/0001-55		SITUAÇÃO: Ativo	
LOGRADOURO: R URANO				NÚMERO: 145	
COMPLEMENTO:		BAIRRO: SANTA LUCIA		CEP: 30350580	
DISTRITO/POVOADO:		MUNICÍPIO: BELO HORIZONTE		UF: MG	
Ressalvado o direito de a Fazenda Pública Estadual cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que: 1. Não constam débitos relativos a tributos administrados pela Fazenda Pública Estadual e/ou Advocacia Geral do Estado; 2. No caso de utilização para lavratura de escritura pública ou registro de formal de partilha, de carta de adjudicação expedida em autos de inventário ou de arrolamento, de sentença em ação de separação judicial, divórcio, ou de partilha de bens na união estável e de escritura pública de doação de bens imóveis, esta certidão somente terá validade se acompanhada da Certidão de Pagamento / Desoneração do ITCD, prevista no artigo 39 do Decreto 43.981/2005. Certidão válida para todos os estabelecimentos da empresa, alcançando débitos tributários do sujeito passivo em Fase Administrativa ou inscritos em Dívida Ativa.					
IDENTIFICAÇÃO		NÚMERO DO PTA		DESCRIÇÃO	
A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada no sítio da Secretaria de Estado de Fazenda de Minas Gerais em www.fazenda.mg.gov.br => certidão de débitos tributários => certificar documentos					
CÓDIGO DE CONTROLE DE CERTIDÃO:2024000814537031					



Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

Declaração

Declaramos para os fins exigidos na legislação, conforme documentação registrada no SICAF, que a situação do fornecedor no momento é a seguinte:

Dados do Fornecedor

CNPJ: 52.383.860/0001-55
Razão Social: CONSORCIO CH GOIABEIRAS
Nome Fantasia:
Situação do Fornecedor: Credenciado Data de Vencimento do Cadastro: 19/12/2024
Natureza Jurídica: CONSÓRCIO DE SOCIEDADES
MEI: Não
Porte da Empresa: Demais

Ocorrências e Impedimentos

Ocorrência: Nada Consta
Impedimento de Licitar: Nada Consta

Níveis cadastrados:

Automática: a certidão foi obtida através de integração direta com o sistema emissor. Manual: a certidão foi inserida manualmente pelo fornecedor.

I - Credenciamento

II - Habilitação Jurídica

III - Regularidade Fiscal e Trabalhista Federal

Receita Federal e PGFN	Validade:	16/04/2025	Automática
FGTS	Validade:	25/11/2024	Automática
Trabalhista (http://www.tst.jus.br/certidao)	Validade:	26/04/2025	Automática

IV - Regularidade Fiscal Estadual/Distrital e Municipal

Receita Estadual/Distrital	Validade:	26/01/2025
Receita Municipal	Validade:	27/11/2024

V - Qualificação Técnica

VI - Qualificação Econômico-Financeira

Validade: 31/05/2025

Esta declaração é uma simples consulta e não tem efeito legal

Emitido em: 28/10/2024 15:36

1 de 1

CPF: 889.XXX.XXX-68 Nome: GUSTAVO BUENO CAMATTA

Ass: _____



Prefeitura de Belo Horizonte
Secretaria Municipal de Fazenda
Subsecretaria da Receita Municipal

**DOCUMENTO AUXILIAR DA
CERTIDÃO DE QUITACAO PLENA PESSOA JURIDICA**

REGISTROS DE ACESSO

Codigo de Controle: **ADFLGKLJQK**

Documento/Certidão nº **28.955.311** Exercício: **2024**

Emissão em: **28/10/2024**

Requerimento em: **15:10:47**

Validade: **27/11/2024**

Nome: **CONSORCIO CH GOIABEIRAS**

CNPJ: **52.383.860.0001.55**

Ressalvando a Prefeitura Municipal de Belo Horizonte o direito de cobrar debitos posteriormente apurados, a Diretoria de Arrecadação, Cobranca e Divida Ativa da Secretaria Municipal de Fazenda, no uso de suas atribuições legais, certifica que o Contribuinte acima encontra-se regular com a Fazenda Publica Municipal, em relação aos Tributos, Multas e Precos inscritos ou não em divida ativa.

Nos termos do Decreto 15.927/2015 este documento auxiliar é a representação gráfica da certidão de débitos e situação fiscal, não substituindo a certidão, que será obtida no Portal da PBH, por meio da autenticação dos registros de acesso deste documento.

DOCUMENTO GRATUITO - http://cndonline.siatu.pbh.gov.br

DOCUMENTO GRATUITO - http://cndonline.siatu.pbh.gov.br



MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

**CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS
FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO**

Nome: CONSORCIO CH GOIABEIRAS
CNPJ: 52.383.860/0001-55

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que:

1. constam débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional (CTN), ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal, ou ainda não vencidos; e
2. não constam inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) na Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Conforme disposto nos arts. 205 e 206 do CTN, este documento tem os mesmos efeitos da certidão negativa.

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <<http://rfb.gov.br>> ou <<http://www.pgfn.gov.br>>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.

Emitida às 16:11:03 do dia 03/09/2024 <hora e data de Brasília>.

Válida até 02/03/2025.

Código de controle da certidão: **3DCF.BFAA.180B.3B02**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

Voltar

Imprimir



**Certificado de Regularidade
do FGTS - CRF**

Inscrição: 52.383.860/0001-55

Razão Social: CONSORCIO CH GOIABEIRAS

Endereço: R URANO 145 / SANTA LUCIA / BELO HORIZONTE / MG / 30350-580

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS.


O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade: 27/10/2024 a 25/11/2024

Certificação Número: 2024102702156132862355

Informação obtida em 28/10/2024 14:52:06

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa:
www.caixa.gov.br



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: CONSORCIO CH GOIABEIRAS (MATRIZ E FILIAIS)

CNPJ: 52.383.860/0001-55

Certidão nº: 74799819/2024

Expedição: 28/10/2024, às 14:55:56

Validade: 26/04/2025 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **CONSORCIO CH GOIABEIRAS (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **52.383.860/0001-55**, **NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022. Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.

No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.

A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (<http://www.tst.jus.br>).

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho, Comissão de Conciliação Prévia ou demais títulos que, por disposição legal, contiver força executiva.



Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ 52.383.860/0001-55	Razão Social CONSORCIO CH GOIABEIRAS	Pagar este documento até 18/10/2024
Período de Apuração Setembro/2024	Data de Vencimento 18/10/2024	Número do Documento 07.16.24276.5878209-4
Observações Nº Recibo Declaração: 50000268548956		Valor Total do Documento 4.940,84

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO 01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO PA:09/2024 Vencimento:18/10/2024	1.220,86			1.220,86
1138	CONTRIB PREVIDENCIÁRIA EMPRESA/EMPREGADOR 01 CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS PA:09/2024 Vencimento:18/10/2024 CNO:90.017.43559/72	2.583,33			2.583,33
1646	CONTRIB PREV RISCO AMBIENTAL/APOSENT ESPECIAL 01 CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO PA:09/2024 Vencimento:18/10/2024 CNO:90.017.43559/72	387,50			387,50
1170	CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO 01 CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO PA:09/2024 Vencimento:18/10/2024 CNO:90.017.43559/72	322,91			322,91
1176	CP TERCEIROS - INCRA 01 CP TERCEIROS - INCRA PA:09/2024 Vencimento:18/10/2024 CNO:90.017.43559/72	25,83			25,83
1181	CP TERCEIROS - SENAI 01 CP TERCEIROS - SENAI PA:09/2024 Vencimento:18/10/2024 CNO:90.017.43559/72	129,16			129,16
1184	CP TERCEIROS - SESI 01 CP TERCEIROS - SESI PA:09/2024 Vencimento:18/10/2024 CNO:90.017.43559/72	193,75			193,75
1200	CP TERCEIROS - SEBRAE 01 CP TERCEIROS - SEBRAE PA:09/2024 Vencimento:18/10/2024	77,50			77,50

SENDA (Versão:5.2.0)

Página: 1 / 2

02/10/2024 11:59:32

85810000049 8 40840385242 1 92071624276 3 58782094775 7

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85810000049 8 40840385242 1 92071624276 3 58782094775 7



CNPJ: 52.383.860/0001-55
Número: 07.16.24276.5878209-4
Pagar até: 18/10/2024
Valor: 4.940,84

Pague com o PIX





Receita Federal

Documento de Arrecadação
de Receitas Federais

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
	CNO:90.017.43559/72				
	Totais	4.940,84			4.940,84



Comprovante de pagamento QR Code

dados da conta debitada:

nome do pagador: **CONSORCIO CH GOIABEIRAS**
CPF / CNPJ do pagador: **52.383.860/0001-55**
instituição: **341**
agência/conta: **6590 / 00996143**
tipo de conta: **Conta Corrente**

dados do recebedor:

nome do recebedor: **RECEITA FEDERAL**
CPF / CNPJ do recebedor: *******460005-****
chave: **4ebab128-53ba-4afa-ac0e-8b54725f1d73**
instituição: **BCO DO BRASIL S A**

dados da transação:

tipo da transação: **PIX QR CODE**
nome do devedor: **CONSORCIO CH GOIABEIRAS**
CPF / CNPJ do devedor: **52.383.860/0001-55**
data de vencimento: **18/10/2024**
data de validade: **18/10/2024**
valor do documento: **4.940,84**
desconto: **0,00**
abatimento: **0,00**
juros: **0,00**
multa: **0,00**
valor final: **4.940,84**
valor da transação: **4.940,84**
mensagem do recebedor: **Solicitacao Pix**
identificação no extrato:
identificador do QR Code: **07162427658782094048865546**

autenticação do comprovante:

5CE0F10066528DE09DDDADEC86DC930740D37990
ID da transação:
E60701190202410181502DY5SJCMKSHJ
controle:
007452990968136

Pagamento efetuado em 18/10/2024 às 12:02:06 via Sispag.

CPF/CNPJ do Empregador
52.383.860

Nome/Razão Social do Empregador
CONSORCIO CH GOIABEIRAS

Núm. de Pág.
1

Identificador
0124100230898975-9

Tag
52383860 09/2024 MENSAL

Pagar este documento até
18/10/2024
às 21:59:59 (Brasília)

Observações

Valor a recolher

1.033,33

Composição do Documento

Competência	Quantidade Trabalhadores	FGTS Mensal	FGTS Rescisório	Indenização Compensatória	Encargos FGTS	Total
09/2024	4	1.033,33	0,00	0,00	0,00	1.033,33
Total Geral:		1.033,33	0,00	0,00	0,00	1.033,33

Data de geração da Guia: 02/10/2024 às 11:58:35 - Página 1/1

O detalhamento da guia pode ser consultado através do endereço <https://fgtsdigital.sistema.gov.br>



PIX Copia e Cola:

0002010102122690014br.gov.bcb.pix2568pix-qrcode.caixa.gov.br/api/v2/cobv/db18dd0130be4dcab0b62d591ccf96535204000053039865802BR5923CAIXA ECONOMICA FEDERAL60088bras111a62070503***63048B91

Payload Location:

pix-qrcode.caixa.gov.br/api/v2/cobv/db18dd0130be4dcab0b62d591ccf9653



Comprovante de pagamento QR Code

dados da conta debitada:

nome do pagador: **CONSORCIO CH GOIABEIRAS**
CPF / CNPJ do pagador: **52.383.860/0001-55**
instituição: **341**
agência/conta: **6590 / 00996143**
tipo de conta: **Conta Corrente**

dados do recebedor:

nome do recebedor: **CEF MATRIZ**
CPF / CNPJ do recebedor: *******305000-****
chave: **c75e4ec6-9881-4240-a2f3-3672b7fe56c1**
instituição: **CAIXA ECONOMICA FEDERAL**

dados da transação:

tipo da transação: **PIX QR CODE**
nome do devedor: **CONSORCIO CH GOIABEIRAS**
CPF / CNPJ do devedor: **52.383.860/0001-55**
data de vencimento: **18/10/2024**
data de validade: **18/10/2024**
valor do documento: **1.033,33**
desconto: **0,00**
abatimento: **0,00**
juros: **0,00**
multa: **0,00**
valor final: **1.033,33**
valor da transação: **1.033,33**
mensagem do recebedor:
identificação no extrato:
identificador do QR Code: **a9ca2d3d478642a4845453898e9057f2**

autenticação do comprovante:

1F2A81D8F3DB4480C357F25236842D7B5C644544

ID da transação:

E60701190202410181502DY5006ONR1S

controle:

007452990968094

Pagamento efetuado em 18/10/2024 às 12:02:06 via Sispag.



Receita Federal

Documento de Arrecadação
de Receitas Federais

CNPJ 52.383.860/0001-55	Razão Social CONSORCIO CH GOIABEIRAS		
Período de Apuração Setembro/2024	Data de Vencimento 18/10/2024	Número do Documento 07.16.24276.5878592-1	Pagar este documento até 18/10/2024
Observações Nº Recibo Declaração: 50000268548956			Valor Total do Documento 584,37

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
0561	IRRF - RENDIMENTO DO TRABALHO ASSALARIADO	584,37			584,37
	07 IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS				
	PA:09/2024 Vencimento:18/10/2024				
	Totais	584,37			584,37

SENDA (Versão:5.2.0)

Página: 1 / 1

02/10/2024 11:59:39

85800000005 4 84370385242 0 92071624276 3 58785921160 3

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85800000005 4 84370385242 0 92071624276 3 58785921160 3



CNPJ: 52.383.860/0001-55
Número: 07.16.24276.5878592-1
Pagar até: 18/10/2024
Valor: 584,37

Pague com o PIX



MINISTÉRIO DA FAZENDA	
SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	
Recibo de Entrega da Declaração de Débitos e Créditos Tributários Federais Previdenciários - DCTFWeb	
CNPJ/CPF	52.383.860/0001-55
Nome	CONSORCIO CH GOIABEIRAS
Período de apuração	09/2024
Declaração Retificadora	Não
Identificação da apuração de débitos	28176281730 / eSocial

Totalização dos tributos apurados no período		
Tributos	Débitos Apurados	Saldo a Pagar
Contribuição Previdenciária Segurados	R\$ 1.245,68	R\$ 1.220,86
Contribuição Previdenciária Patronal	R\$ 2.970,83	R\$ 2.970,83
Contribuição para Outras Entidades e Fundos	R\$ 749,15	R\$ 749,15
IRRF	R\$ 584,37	R\$ 584,37
COFINS	R\$ 0,00	R\$ 0,00
PIS	R\$ 0,00	R\$ 0,00
CSRF	R\$ 0,00	R\$ 0,00
COSIRF	R\$ 0,00	R\$ 0,00
TOTAL	R\$ 5.550,03	R\$ 5.525,21

O presente Recibo de Entrega da DCTFWeb contém a transcrição da Ficha Resumo da referida declaração, que constitui confissão de dívida, de forma irrevogável, dos tributos declarados. Fica o declarante ciente de que os tributos declarados na DCTFWeb e não pagos serão enviados para inscrição em Dívida Ativa da União, conforme o disposto no parágrafo 2º do artigo 5º do Decreto-Lei nº 2.124, de 13 de junho de 1984, combinado com a Portaria MF nº 118, de 28 de junho de 1984, estando o declarante sujeito ainda a:

- 1) Sobre os tributos não pagos ou não recolhidos nos prazos legais incidirão multa e juros de mora, nos termos do art. 61 da Lei nº 9.430, de 27 de dezembro de 1996, combinado com o art. 35 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991;
- 2) inclusão no Cadastro Informativo de Créditos não Quitados do Setor Público Federal (CADIN), impedindo operações de crédito com recursos públicos, a concessão de incentivos fiscais e financeiros e a celebração de convênios e similares que envolvam desembolso de recursos públicos e respectivos aditamentos (Lei nº 10.522, de 19 de julho de 2002);
- 3) encaminhamento ao Ministério Público Federal de Representação Fiscal para Fins Penais nos casos que, em tese, tenha ocorrido crime contra a ordem tributária ou contra a previdência social, por deixar de recolher, no prazo legal, valor de tributo ou de contribuição social, descontado ou cobrado, na qualidade de sujeito passivo de obrigação e que deveria recolher aos cofres públicos (Lei nº 8.137, de 27 de dezembro de 1990 e Código Penal).

No caso de falta de apresentação ou de apresentação de declaração com incorreções ou omissões, o contribuinte ficará sujeito às multas previstas no artigo 32-A da Lei nº 8.212, de 1991, e no art. 7º da Lei nº 10.426, de 24 de abril de 2002.

Não surtirão efeitos as retificações de informações prestadas na DCTFWeb que pretendam excluir ou reduzir débitos:

- enviados para inscrição em Dívida Ativa da União, sejam eles saldos a pagar ou valores apurados em procedimento de auditoria interna;
- incluídos em parcelamento deferido;
- que tenham sido objeto de declaração de compensação não passível de retificação ou cancelamento.

Também não surtirão efeitos as retificações de débitos de tributos em relação aos quais o sujeito passivo tenha sido objeto de procedimento fiscal e/ou nos casos em que a apresentação da declaração ocorra após o prazo decadencial.

Dados do Representante da Pessoa Jurídica	
Nome	GUSTAVO BUENO CAMATTA
CPF	889.703.296-68
Telefone	3282-5499

Recibo de Entrega da DCTFWeb	
DCTFWeb recebida via Internet pelo Agente Receptor SERPRO em	02/10/2024 11:58:54
Nº do recibo de entrega	0000050000268548956
DCTFWeb transmitida com assinatura de certificado digital por	52.383.860/0001-55

MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
RELATÓRIO DA DECLARAÇÃO COMPLETA - DCTFWeb

Nome do Contribuinte	CONSORCIO CH GOIABEIRAS	CNPJ	52.383.860/0001-55
Período apuração	09/2024	Número do Recibo	50000268548956
Data/Hora da Transmissão	02/10/2024 11:58:54	Identificação da Apuração de Débitos	28176281730 / eSocial

Dados Iniciais

Classificação Tributária	99-Pessoas Jurídicas em Geral
Missão Diplomática ou Repartição Consular	0 - Sem acordo
Ausência de Fatos Geradores	Não

Endereço

Logradouro	URANO	Número	145
Complemento	-	Bairro/Distrito	SANTA LUCIA
Município	BELO HORIZONTE	UF	MG
CEP	30350580	Telefone	3132825499
Correio Eletrônico	PACCIOLI.SOC@GMAIL.COM		

Dados do Representante do Contribuinte e do Responsável pelo Preenchimento

Representante	GUSTAVO BUENO CAMATTA	CPF	88970329668
Telefone	32825499		
Correio Eletrônico	-		
Responsável pelo Preenchimento	-		
CPF	-	CRC	-
UF	-	Telefone	-
Correio Eletrônico	-		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1082-01	Descrição	CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO
Período Apuração Débito	09/2024		
Débito Apurado	1.245,68		
Deduções	Salário Família: 24,82		
Saldo a Pagar	1.220,86		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1170-01	Descrição	CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO
CNO	90.017.43559/72	CNPJ Prestador Serviço	-
Período Apuração Débito	09/2024		
Débito Apurado	322,91		
Saldo a Pagar	322,91		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1181-01	Descrição	CP TERCEIROS - SENAI
CNO	90.017.43559/72	CNPJ Prestador Serviço	-
Período Apuração Débito	09/2024		
Débito Apurado	129,16		
Saldo a Pagar	129,16		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1184-01	Descrição	CP TERCEIROS - SESI
CNO	90.017.43559/72	CNPJ Prestador Serviço	-
Período Apuração Débito	09/2024		
Débito Apurado	193,75		
Saldo a Pagar	193,75		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1176-01	Descrição	CP TERCEIROS - INCRA
CNO	90.017.43559/72	CNPJ Prestador Serviço	-
Período Apuração Débito	09/2024		
Débito Apurado	25,83		
Saldo a Pagar	25,83		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1200-01	Descrição	CP TERCEIROS - SEBRAE
CNO	90.017.43559/72	CNPJ Prestador Serviço	-
Período Apuração Débito	09/2024		
Débito Apurado	77,50		
Saldo a Pagar	77,50		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1646-01	Descrição	CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO
CNO	90.017.43559/72	CNPJ Prestador Serviço	-
Período Apuração Débito	09/2024		
Débito Apurado	387,50		
Saldo a Pagar	387,50		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1138-01	Descrição	CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS
CNO	90.017.43559/72	CNPJ Prestador Serviço	-
Período Apuração Débito	09/2024		
Débito Apurado	2.583,33		
Saldo a Pagar	2.583,33		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	0561-07	Descrição	IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS
Período Apuração Débito	09/2024		
Débito Apurado	584,37		
Saldo a Pagar	584,37		

MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
RELATÓRIO DE CRÉDITOS - DCTFWeb

Nome do Contribuinte	CONSORCIO CH GOIABEIRAS	CNPJ	52.383.860/0001-55
Período de Apuração	09/2024	Número do Recibo	0000050000268548956
Data/Hora da Transmissão	02/10/2024 11:58:54	Identificação da Apuração de Débitos	28176281730 / eSocial

Relatório por Crédito - Dedução Salário Família (Valor Informado: 24,82 - Valor Utilizado: 24,82 = Saldo Disponível: 0,00)

Ohra:	Descrição do Débito			Descrição do Crédito	
	Código Receita	PA Débito	Débito Declarado	Valor Utilizado	
108201 - CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO		09/2024	1.245,68	24,82	

MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
RELATÓRIO RESUMO DE DÉBITOS - DCTFWeb

Nome do Contribuinte	CONSORCIO CH GOIABEIRAS	CNPJ	52.383.860/0001-55
Período de Apuração	09/2024	Número do Recibo	0000050000268548956
Data/Hora da Transmissão	02/10/2024 11:58:54	Identificação da Apuração de Débitos	28176281730 / eSocial

Grupo: CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA SEGURADOS

Código	Descrição	PA Débito	Valor Original	Créditos Vinculados	Saldo Devedor
1082-01	CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO	09/2024	1.245,68	24,82	1.220,86

Grupo: IRRF

Código	Descrição	PA Débito	Valor Original	Créditos Vinculados	Saldo Devedor
0561-07	IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS	09/2024	584,37	0,00	584,37

Obra: 90.017.43559/72

Grupo: CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL

Código	Descrição	PA Débito	Valor Original	Créditos Vinculados	Saldo Devedor
1138-01	CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS	09/2024	2.583,33	0,00	2.583,33
1646-01	CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO	09/2024	387,50	0,00	387,50

Obra: 90.017.43559/72


Grupo: CONTRIBUIÇÃO PARA OUTRAS ENTIDADES E FUNDOS

Código	Descrição	PA Débito	Valor Original	Créditos Vinculados	Saldo Devedor
1170-01	CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO	09/2024	322,91	0,00	322,91
1176-01	CP TERCEIROS - INCRA	09/2024	25,83	0,00	25,83
1181-01	CP TERCEIROS - SENAI	09/2024	129,16	0,00	129,16
1184-01	CP TERCEIROS - SESI	09/2024	193,75	0,00	193,75
1200-01	CP TERCEIROS - SEBRAE	09/2024	77,50	0,00	77,50

MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
RELATÓRIO RESUMO DE CRÉDITOS - DCTFWeb

Nome do Contribuinte	CONSORCIO CH GOIABEIRAS	CNPJ	52.383.860/0001-55
Período de Apuração	09/2024	Número do Recibo	0000050000268548956
Data/Hora da Transmissão	02/10/2024 11:58:54	Identificação da Apuração de Débitos	28176281730 / eSocial

Descrição	Valor Informado/Importado	Valor Vinculado a Débito	Saldo disponível
Salário Família	24,82	24,82	0,00



Detalhe da Guia a Ser Emitida

Empregador: 52.383.860

Nome Empregador: 4 Origem: Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 18/10/2024

Total Parcelado: 0,00

Total da Guia (FGTS): 1.033,33

Relação de Trabalhadores

Estabelecimento: 90.017.43559/72				Tomador: 90.017.43559/72									
Comp. Apuração	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
09/2024		GLADYSON DE FARIA DUARTE	000002	108.429.966-64	101	18/10/2024	Mensal	816,67	65,33	0,00	0,00	0,00	65,33
09/2024		MARLON COSTA SILVA	000009	016.122.506-37	101	18/10/2024	Mensal	5.800,00	464,00	0,00	0,00	0,00	464,00
09/2024		PATRICK PETERSON CARDOSO	000007	131.038.206-90	101	18/10/2024	Mensal	2.800,00	224,00	0,00	0,00	0,00	224,00
09/2024		RAQUEL BERNARDO PEIXOTO	000008	039.199.406-55	101	18/10/2024	Mensal	3.500,00	280,00	0,00	0,00	0,00	280,00
				Total do Tomador		90.017.43559/72		12.916,67	1.033,33	0,00	0,00	0,00	1.033,33
				Total do Estabelecimento		90.017.43559/72		12.916,67	1.033,33	0,00	0,00	0,00	1.033,33
						Total FGTS		12.916,67	1.033,33	0,00	0,00	0,00	1.033,33

Qtd. Trabalhadores FGTS:	4	Origem: Gestão de Guias
0.00	Total da Guia (FGTS):	1.033,33

Relação de Categorias

Descrição das categorias:

Página 2 de 5



Detalhe da Guia a Ser Emitida

Empregador: 52.383.860 Nome Empregador:
Vencimento da Guia: 18/10/2024

Qtd. Trabalhadores FGTS: 4 Origem: Gestão de Guias
Total da Guia (FGTS): 1.033,33

Total Parcelado:

Relação de Estabelecimentos

Comp. Apuração	Estabelecimento	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
09/2024	90.017.43559/72	4	12.916,67	1.033,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.033,33
		Total FGTS	12.916,67	1.033,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.033,33



Empregador: 52.383.860 Nome Empregador:
Vencimento da Guia: 18/10/2024

Detalhe da Guia a Ser Emitida

Total Parcelado: 0,00 Qtd. Trabalhadores FGTS: 4 Origem: Gestão de Guias
Total da Guia (FGTS): 1.033,33

Relação de Tipos de Valor

Estabelecimento: 90.017.43559/72										
Comp. Apuração	Tipo de Valor	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
09/2024	11 - FGTS mensal	4	12.500,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
09/2024	12 - FGTS 13º salário	1	416,67	33,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,33
Total FGTS			12.916,67	1.033,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.033,33



Detalhe da Guia a Ser Emitida

Empregador: 52.383.860 Nome Empregador:
Vencimento da Guia: 18/10/2024

Qtd. Trabalhadores FGTS: 4 Origem: Gestão de Guias
Total Parcelado: 0,00 Total da Guia (FGTS): 1.033,33

Relação de Tomadores de Serviço

Tomador: 90.017.43559/72

Comp. Apuração	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração	Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
09/2024	4	12.916,67	12.916,67	1.033,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.033,33
	Total FGTS		12.916,67	1.033,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.033,33

DOC ou TED Eletrônico

Debitado

Agência 1793-0
Conta corrente 54293-8 PREF CONG ROYALT

Creditado

Banco 743 BANCO SEMEAR
Agência (sem DV) 1 MATRIZ - BELO HORIZONTE
Conta corrente (com DV) 11313546
CNPJ 52.383.860/0001-55
Nome favorecido CONSORCIO CH GOIABEIRAS
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 112.502
Valor 808,439,92
Destinação 0
Data transferência 25/11/2024

"C" - CNPJ diferente

Autenticação SISBB 709B38AEFFCC923A

Assinada por JF608240 CAMILA VASCONCELOS SIQUEIRA CIANNI

25/11/2024 11:54:46

J9101504 FERNANDA SANTANA RODRIGUES

25/11/2024 13:14:42

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J9101504 FERNANDA SANTANA RODRIGUES.
