



**PREFEITURA MUNICIPAL DE CONGONHAS**  
**CIDADE DOS PROFETAS**

Ofício n.º PMC/SEGOV/GAB/136/2026.

Congonhas, 11 de maio de 2026.

Exm. Sr.

Averaldo Pereira da Silva,

Presidente de Mesa Diretora da Câmara Municipal de Congonhas.

**ASSUNTO:** Resposta a Requerimento

Câmara Municipal de Congonhas



PROTOCOLO GERAL 950/2026  
Data: 12/05/2026 - Horário: 07:34  
Legislativo - OFPMC 238/2026

Prezado Senhor,

Em atenção ao Requerimento 97/2026, encaminhado por meio do Ofício 44/2026/Secretaria, encaminhamos a V.Exa. a Comunicação Interna abaixo relacionada, juntamente com os anexos, na qual a devida secretaria presta os esclarecimentos necessários em relação ao requerimento:

- SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
- SECRETARIA MUNICIPAL DE ZELADORIA URBANA

Aproveitamos a oportunidade para reiterar a Vossa Excelência e aos demais pares nossos votos de elevada estima e consideração.

**ROSANE MOREIRA DA CRUZ**

**Secretária Adjunta de Governo**



**Assinantes**

✓ ROSANE MOREIRA DA CRUZ

Assinou em 11/05/2026 às 17:53:31 com o certificado avançado da Betha Sistemas e possui a identidade verificada com o CPF \*\*\*.323.296-\*\*

Eu, ROSANE MOREIRA DA CRUZ, estou ciente das normas descritas na Lei nº 14.063/2020, no que se refere aos tipos de assinaturas consideradas como válidas para a prática de atos e interações pelos Entes Públicos.

---

**Veracidade do documento**

Documento assinado digitalmente.

Verifique a veracidade utilizando o QR Code ao lado ou acesse

o site **verificador-assinaturas.plataforma.betha.cloud** e insira o código abaixo:

**O7Q    KL9    NNV    JWY**

**COMUNICAÇÃO INTERNA SEFIN/13/2026**

De: Sandro César Cordeiro – Secretaria Municipal de Finanças

Para: Cássio Emanuel Fernandes Seabra – Secretaria Municipal de Governo

Data: 11/05/2026

Prezado Senhor,

Em atenção ao Requerimento nº 97/2026, encaminhado pela Câmara Municipal de Congonhas, apresentamos os esclarecimentos a seguir em relação ao item 3 do referido requerimento, e de competência desta Secretaria:

3.1 - Informamos que a localidade mencionada está inserida em área classificada como urbana, conforme o zoneamento estabelecido pelo Plano Diretor Municipal.

3.2 - O lançamento do IPTU é realizado em observância à legislação tributária municipal e às disposições do Código Tributário Nacional, considerando, entre outros elementos, o enquadramento urbanístico da área, a existência de infraestrutura e serviços públicos, bem como os parâmetros definidos na Planta Genérica de Valores vigente.

3.3 - No que se refere aos melhoramentos previstos no art. 32 do Código Tributário Nacional, esclarecemos que a localidade é atendida por abastecimento de água e por rede de energia elétrica já implantada, além de possuir expansão em andamento. Ademais, a região conta com equipamentos públicos de saúde, incluindo Unidade Básica de Saúde e Hospital, bem como unidade escolar, localizados em raio aproximado de 3 km, conforme demonstrado no mapa anexo. Dessa forma, verifica-se a presença dos requisitos mínimos previstos na legislação federal, especialmente quanto à existência de melhoramentos indicados em pelo menos dois dos incisos do art. 32 do CTN, evidenciando a compatibilidade da localidade com o enquadramento urbano adotado pelo Município.

Sem mais para o momento, permanecemos à disposição para prestar quaisquer esclarecimentos adicionais que se façam necessários.

Atenciosamente,

**Sandro César Cordeiro**  
**Secretário Municipal de Finanças**



## Comunicação Interna

**DE:** Frederico Alexandre Oliveira Vasconcelos – Secretário Municipal de Obras

**PARA:** Cássio Emanuel Fernandes Seabra – Secretário Municipal de Governo

**Assunto:** Resposta à CI 11919/2026 – Requerimento CMC 97/2026

Considerando o requerimento nº 97/2026, expedido pela Câmara Municipal de Vereadores, no qual são solicitadas informações sobre a execução de serviços de infraestrutura no Água Boa, esclarecemos o seguinte:

**Item 1:** Os serviços determinados na Ordem de Serviço anexa ao requerimento foram devidamente executados, conforme documentos que seguem, extraídos de medições referentes ao Contrato PMC/078/2020.

**Item 2:** Conforme depreende-se dos documentos que seguem em anexo, os serviços programados foram devidamente executados. Sendo assim, deixamos de apresentar termo de suspensão, paralisação ou cancelamento.

No que trata das datas relevantes à execução dos serviços previstos na Ordem de Serviços ora discutida, informamos que se encontram todas devidamente registradas nos documentos que seguem (execução dos serviços e medições a eles referentes).

Quanto aos responsáveis pelas decisões, principalmente aquelas pertinentes à execução, são aqueles que acompanharam os serviços conforme documentos que seguem em anexo.

Deixamos de apresentar fundamentação técnica e jurídica tendo em vista que a Ordem de Serviços em análise não foi cancelada.

**Item 3:** A resposta atinente ao item 3 cabe à Secretaria Municipal de Finanças, conforme já esclarecido anteriormente.

**Itens 4 e 5:** Considerando que referidos itens tratam de tema que compete à Diretoria de Concessões Públicas (Secretaria Municipal de Zeladoria), informamos que devem ser tratados com referida Secretaria, conforme anteriormente esclarecido.

[www.congonhas.mg.gov.br](http://www.congonhas.mg.gov.br)

**Item 6:** No que se refere à apresentação de cronograma atualizado para a execução de obras de infraestrutura na região, informamos que a Administração reconhece as demandas existentes na localidade. Contudo, as intervenções necessárias encontram-se atualmente em fase de levantamento e estudos técnicos, etapa indispensável para a elaboração de um cronograma adequado, visando garantir maior eficiência na futura execução dos serviços.

Coloco-me à disposição para demais esclarecimentos que se fizerem necessários.

Congonhas, 06 de maio de 2026.

Frederico Alexandre Oliveira Vasconcelos  
Secretário Municipal de Obras

[www.congonhas.mg.gov.br](http://www.congonhas.mg.gov.br)



prefeituradecongonhas



Canal Congonhas-MG



PrefeituradeCongonhas



**Prefeitura de Congonhas**  
**Secretaria Municipal de Obras**



**ORDEM DE SERVIÇO**

Fica a contratada, **LOCADORA TERRAMARES LTDA**, situada na Rua Sardenha, nº. 315, Bairro Jardim Vila Andreza, na cidade Congonhas - MG, inscrita no CNPJ sob o nº. 05.371.926/0001-07, autorizada a dar início na execução de obras para pavimentação asfáltica e serviços complementares, com fornecimento de materiais e mão de obra Município de Congonhas – MG.

- **Contrato N° PMC/078/2020 de 20/02/2020**, Concorrência Pública nº PMC/012/2019, PRC/193/2019 e Processo Administrativo nº PMC/9275/2019.
- **Vigência do Contrato:** O prazo para a execução dos serviços será de 12 (doze) meses, contados a partir do recebimento da ordem de serviços e o prazo do contrato será de 16 (dezesesseis) meses, contados a partir da data de sua assinatura.
- **Serviços:** Execução dos serviços de pavimentação asfáltica e serviços complementares nas ruas do bairro Água Boa.
- **Prazo:** Os serviços serão iniciados em 25 / 03 / 2020 e com prazo de execução de 90 dias.

*Rosemary Aparecida B. B.*  
Rosemary Aparecida Bedito  
**Secretária Municipal de Obras**

*Maris Stela Seabra da Mata*  
Maris Stela Seabra da Mata  
**Locadora Terrmares Ltda**



**PREFEITURA DE CONGONHAS  
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS  
PLANILHA DE MEDIÇÃO - DÉCIMA TERCEIRA MEDIÇÃO CONSIDERANDO 1º TERMO ADITIVO**

BDI: 24,67%

**OBJETO:** Execução de obras para pavimentação asfáltica e serviços complementares, com fornecimento de materiais e mão de obra, no Município de Congonhas - MG.  
**CONTRATADA:** Locadora Terramares Ltda  
**ORDEN DE SERVIÇOS:** 02/03/2020  
**PRAZOS:** 12 MESES PARA A OBRA - 16 MESES PARA O CONTRATO  
**PREVISÃO DE TÉRMINO DE OBRA:** 04/08/2021  
**PREVISÃO DE TÉRMINO DE CONTRATO:** 20/09/2021  
**LOCAL:** ÁGUA BOA

**CONTRATO Nº:** PMC/07/18/2020 de 20/02/2020  
**PRC Nº:** 193/2019  
**CONCORRÊNCIA Nº:** PMC/01/12/2019  
**PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº:** PMC/9275/2019  
**NOTA FISCAL Nº:** 2167 - 19/07/2021  
**Período:** 03/05/2021 A 31/05/2021

**VALOR DO CONTRATO:** R\$ 15.659.433,05  
**MEDIDO FATURADO:** R\$ 401.295,61  
**ACUMULADO FATURADO:** R\$ 12.050.271,66  
**SALDO A MEDIR:** R\$ 3.609.161,39

100,00%  
2,86%  
76,95%  
23,05%

FOLHAS DE 01 A 03

ITEM	DESCRIÇÃO	QUANTITATIVOS				VALORES				SALDO A EXECUTAR			
		UNIDADE	QUANTITATIVO O PREVISTO	ACUM. ANTERIOR	EXECUTADO REALIZADO	ACUM. FATURADO	SALDO A EXECUTAR	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL PREVISTO		ACUM. ANTERIOR	MEDIDO EXECUTADO	ACUM. FATURADO
<b>1</b>	<b>MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO</b>												
1.1	MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DA OBRA	%	0,50	0,00	0,00014	0,003889	0,496111	R\$ 13.578.338,64	R\$ 67.891,69	R\$ 50.936,13	R\$ 1.866,12	R\$ 52.802,25	R\$ 15.089,45
<b>2</b>	<b>INSTALAÇÃO DA OBRA</b>												
2.1	ESCRITÓRIO DA FISCALIZAÇÃO TIPO I - P. SUDECAP	UN	1,00	1,00		1,00	0,00	R\$ 2.829,47	R\$ 2.829,47	R\$ 2.829,47	R\$ -	R\$ 2.829,47	R\$ -
2.2	ESCRITÓRIO DA EMPREITEIRA TIPO I - P. SUDECAP	UN	1,00	1,00		1,00	0,00	R\$ 2.829,47	R\$ 2.829,47	R\$ 2.829,47	R\$ -	R\$ 2.829,47	R\$ -
2.3	VESTIÁRIO TIPO II - P. SUDECAP	UN	1,00	1,00		1,00	0,00	R\$ 4.350,05	R\$ 4.350,05	R\$ 4.350,05	R\$ -	R\$ 4.350,05	R\$ -
2.4	DEPÓSITO E FERRAMENTARIA TIPO I - P. SUDECAP	UN	1,00	1,00		1,00	0,00	R\$ 1.940,11	R\$ 1.940,11	R\$ 1.940,11	R\$ -	R\$ 1.940,11	R\$ -
2.5	INSTALAÇÃO SANITÁRIA TIPO II - P. SUDECAP	UN	1,00	1,00		1,00	0,00	R\$ 2.987,58	R\$ 2.987,58	R\$ 2.987,58	R\$ -	R\$ 2.987,58	R\$ -
2.6	REFEITÓRIO TIPO II - P. SUDECAP	UN	1,00	1,00		1,00	0,00	R\$ 2.067,91	R\$ 2.067,91	R\$ 2.067,91	R\$ -	R\$ 2.067,91	R\$ -
2.7	PLACA DE OBRA EM LONA IMPRESSÃO DIGITAL - PADRÃO SUDECAP	M2	48,00	24,00		24,00	24,00	R\$ 151,65	R\$ 7.279,20	R\$ 3.639,60	R\$ -	R\$ 3.639,60	R\$ 3.639,60
2.8	BANHEIRO QUÍMICO (2 UN) COM MANUTENÇÃO	MÉS	12,00	2,50		2,50	9,50	R\$ 385,23	R\$ 4.622,76	R\$ 963,08	R\$ -	R\$ 963,08	R\$ 3.659,69
<b>3</b>	<b>TERRAPLENAGEM</b>												
3.1	DESMATAMENTO, DESTOCAMENTO E LIMPEZA, EXCL., TRANSPORTE ATÉ 50 M	M2	78.929,27	81910,47		81910,47	2981,20	R\$ 0,52	R\$ 41.043,22	R\$ 42.593,44	R\$ -	R\$ 42.593,44	R\$ 1.550,22
3.2	ESCAVAÇÃO E CARGA DE MATERIAL DE 1ª CATEGORIA	M3	44.173,92	48987,14		48987,14	4813,22	R\$ 4,00	R\$ 178.695,68	R\$ 195.948,57	R\$ -	R\$ 195.948,57	R\$ 19.262,89
3.3	TRANSPORTE DE MATERIAL DE QUALQUER NATUREZA, 1 KM < DMT <= 2 KM	M3	11.016,00	5648,68		5648,68	5367,32	R\$ 2,90	R\$ 31.946,40	R\$ 16.381,17	R\$ -	R\$ 16.381,17	R\$ 15.565,23
3.4	TRANSPORTE DE MATERIAL DE QUALQUER NATUREZA DMT > 5 KM	M3XXM	280.000,00	238058,42		238058,42	41941,58	R\$ 1,37	R\$ 383.600,00	R\$ 326.140,04	R\$ -	R\$ 326.140,04	R\$ 57.459,96
3.5	ATERRO COMPACTADO COM ROLO VIBRATORIO	M3	10.400,00	4249,37		4249,37	6150,63	R\$ 3,99	R\$ 41.496,00	R\$ 16.954,97	R\$ -	R\$ 16.954,97	R\$ 24.541,03
3.6	ESCAVAÇÃO MECÂNICA DE VALAS COM DESCARGA LATERAL H <= 1,5 M	M3	1.900,00	1293,27		1293,27	606,73	R\$ 4,29	R\$ 8.151,00	R\$ 5.548,13	R\$ -	R\$ 5.548,13	R\$ 2.602,87
3.7	REATERRO DE VALA MANUAL	M3	220,00	0,00		0,00	220,00	R\$ 51,16	R\$ 11.255,20	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 11.255,20
3.8	REATERRO DE VALA COMPACTADO COM EQUIP. PLACA VIBRATORIA OUEQUIVALENTE	M3	693,09	720,09		720,09	-27,00	R\$ 22,90	R\$ 15.871,76	R\$ 16.490,14	R\$ -	R\$ 16.490,14	R\$ 619,38
3.9	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE TERRENO COM PLACA VIBRATORIA	M3	583,16	583,16		583,16	0,00	R\$ 4,75	R\$ 2.770,01	R\$ 2.770,01	R\$ -	R\$ 2.770,01	R\$ -
3.10	REATERRO DE VALA COM AREIA (COM ADENSAMENTO HIDRAULICO)	M3	145,00	0,00		0,00	145,00	R\$ 111,22	R\$ 16.126,90	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 16.126,90

*Frederico de Jesus*

*Quaresma*




*D. J.*

*Quaresma*

3262  
Quaresma

ITEM	DESCRIÇÃO	QUANTITATIVOS					VALORES					
		UNIDADE	QUANTITATIV O PREVISTO	ACUM. ANTERIOR	EXECUTADO REALIZADO	ACUM. FATURADO	SALDO A EXECUTAR	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL PREVISTO	ACUM. ANTERIOR	MEDIDO EXECUTADO	ACUM. FATURADO
3.11	TRANSPORTE DE MATERIAL DE QUALQUER NATUREZA DMT = 25 KM	M3XKM	2.150,00	0,00		0,00	2150,00	R\$ 1,37	R\$ 2.945,50	R\$ -	R\$ -	R\$ 2.945,50
4	<b>PAVIMENTAÇÃO</b>											
4.1	CAPINA E VARRIÇÃO DE PAVIMENTO	M2	450,00	0,00		0,00	450,00	R\$ 2,84	R\$ 1.278,00	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.278,00
4.2	ESCAVAÇÃO E CARGA DE MATERIAL DE 1ª CATEGORIA PARA REFORÇO DE SUBLEITO	M3	74.400,00	255,17		255,17	74144,83	R\$ 2,64	R\$ 196.416,00	R\$ 673,65	R\$ 673,65	R\$ 195.742,35
4.3	REFORÇO DO SUBLEITO COMPACTADO EXCL. ESCAVE E CARGA COMPACTADO (PROCTOR INTERMEDIÁRIO)	M3	33.000,00	756,42		756,42	32241,58	R\$ 6,12	R\$ 201.960,00	R\$ 4.641,53	R\$ 4.641,53	R\$ 197.318,47
4.4	TRANSPORTE DE MATERIAL DE QUALQUER NATUREZA DMT > 5 KM	M3XKM	372.000,00	10084,65		10084,65	361915,35	R\$ 1,37	R\$ 509.640,00	R\$ 13.815,97	R\$ 13.815,97	R\$ 495.824,03
4.5	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DO SUBLEITO	M2	106.352,79	123368,40		123368,40	-17015,61	R\$ 1,48	R\$ 157.402,13	R\$ 182.585,23	R\$ 182.585,23	R\$ 25.188,10
4.6	SUB-BASE ESTAB. GRANUL. ENERGIA PROCTOR INTERMED. COM CANGA DE MINÉRIO DE FERRO E=0,125 M	M3	14.310,97	3734,84		3734,84	10576,13	R\$ 74,84	R\$ 1.071.032,99	R\$ 279.515,09	R\$ 279.515,09	R\$ 791.517,91
4.7	BASE ESTAB. GRANUL. ENERGIA PROCTOR INTERMEDIÁRIO COM CANGA DE MINÉRIO DE FERRO E = 0,125 M	M3	14.310,97	8279,88		8279,88	6031,09	R\$ 76,02	R\$ 1.087.919,94	R\$ 629.436,44	R\$ 629.436,44	R\$ 458.483,50
4.8	BASE ESTAB. GRANUL., COMP. ENEG. PROCTOR MODIF. COM BRITA BICA CORRIDA	M3	8.351,95	11647,96		11647,96	-3298,01	R\$ 132,49	R\$ 1.106.549,86	R\$ 1.543.238,22	R\$ 1.543.238,22	R\$ 436.688,36
4.9	TRANSPORTE DE MATERIAL DE BASE DMT <=22KM	TXKM	1.100.000,00	744980,25		744980,25	355039,75	R\$ 0,60	R\$ 660.000,00	R\$ 446.976,15	R\$ 446.976,15	R\$ 213.023,85
4.10	IMPRIMAÇÃO COM CM-30	M2	106.352,79	106050,26		106050,26	302,84	R\$ 6,74	R\$ 716.817,80	R\$ 714.778,72	R\$ 714.778,72	R\$ 2.039,09
4.11	PINTURA DE LIGAÇÃO COM RR-1C	M2	106.352,79	105731,30		105731,30	821,49	R\$ 1,70	R\$ 180.799,74	R\$ 179.743,21	R\$ 179.743,21	R\$ 1.056,53
4.12	CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE FAIXA C CAP 50/70	TON	12.021,21	11155,62		11155,62	865,59	R\$ 445,73	R\$ 5.358.213,93	R\$ 4.972.396,73	R\$ 4.972.396,73	R\$ 385.817,21
4.13	CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE FAIXA C CAP 50/70 ESP MANUAL, COMPACT. PLACA VIBRAT.(QUEBRA MOLA)	TON	135,00	51,27		51,27	83,73	R\$ 569,66	R\$ 76.769,10	R\$ 29.155,20	R\$ 29.155,20	R\$ 47.613,90
4.14	TRANSPORTE DE CBUQ DMT <=100 KM	TXKM	1.202.121,48	979941,61		979941,61	222179,87	R\$ 0,60	R\$ 721.272,89	R\$ 587.964,96	R\$ 587.964,96	R\$ 133.307,92
5	<b>DRENAGEM</b>											
5.1	REDE TUB. CONCRETO CIMENTO ARI PLUS RS CLASSE PA-1 DN= 400 MM	M	403,80	346,94		346,94	56,86	R\$ 110,59	R\$ 44.656,24	R\$ 38.368,09	R\$ 38.368,09	R\$ 6.288,15
5.2	REDE TUB. CONCRETO CIMENTO ARI PLUS RS CLASSE PA-1 DN= 600 MM	M	398,35	139,40		139,40	250,95	R\$ 189,68	R\$ 75.160,68	R\$ 26.301,99	R\$ 26.301,99	R\$ 47.273,77
5.3	CONCRETO PARA BERÇO DE REDE TUBULAR TRAÇO 1:3:6, INCLUSIVE LANÇAMENTO	M3	214,77	82,02		83,52	131,25	R\$ 377,25	R\$ 81.021,98	R\$ 30.942,23	R\$ 31.508,11	R\$ 49.513,88
5.4	FORMA PARA BERÇO EM TABUA, INCLUSIVE DESFORMA	M2	186,00	0,00		6,36	179,64	R\$ 16,37	R\$ 3.044,82	R\$ -	R\$ 104,11	R\$ 2.940,71
5.5	ALA DE REDE TUBULAR D= 600 MM	UN	6,00	1,00		2,00	4,00	R\$ 993,07	R\$ 5.958,42	R\$ 993,07	R\$ 1.986,14	R\$ 3.972,28
5.6	CAIXA DE PASSAGEM TIPO B - PADRAO SUDECAP, D= 600 MM	UN	7,00	6,50		7,50	-0,50	R\$ 1.769,50	R\$ 12.386,50	R\$ 11.501,75	R\$ 13.271,25	R\$ 884,75
5.7	DISSIPADOR DE ENERGIA P. DNIT DEB 02	UN	48,00	0,00		0,00	48,00	R\$ 545,26	R\$ 26.172,48	R\$ -	R\$ -	R\$ 26.172,48
5.8	SAIDA D'ÁGUA SIMPLES, EM TALUDE DE ATERRO - TIPO 01 - SSA - 01	UN	221,00	0,00		0,00	221,00	R\$ 470,29	R\$ 103.934,09	R\$ -	R\$ -	R\$ 103.934,09
5.9	SARJETA TRIANGULAR DE CONCRETO STC02	M	640,00	0,00		0,00	640,00	R\$ 70,74	R\$ 45.273,60	R\$ -	R\$ -	R\$ 45.273,60
5.10	SARJETA TRIANGULAR DE CONCRETO STC04	M	960,00	880,36		906,17	53,83	R\$ 48,76	R\$ 46.809,60	R\$ 42.926,35	R\$ 44.184,85	R\$ 2.624,75
5.11	SARJETA DE CONCRETO EM ATERRO, TIPO DR SCA-XY, LARGURA = 60 CM, TIPO 30/20 (EXECUÇÃO INCLUINDO ESCAVAÇÃO, FORNECIMENTO E TRANSPORTE DE TODOS OS MATERIAIS)	M	152,00	0,00		0,00	152,00	R\$ 50,45	R\$ 7.668,40	R\$ -	R\$ -	R\$ 7.668,40

3263  
Dama

Francisco

ITEM	DESCRIÇÃO	QUANTITATIVOS					VALORES					
		UNIDADE	QUANTITATIVO PREVISTO	ACUM. ANTERIOR	EXECUTADO REALIZADO	ACUM. FATURADO	SALDO A EXECUTAR	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL PREVISTO	ACUM. ANTERIOR	MEDIDO EXECUTADO	ACUM. FATURADO
5.12	SARJETA DE CONCRETO EM ATERRO, TIPO DR.SCA-XY, LARGURA = 70 CM TIPO 40/20 (EXECUÇÃO INCLUINDO ESCAVAÇÃO, FORNECIMENTO E TRANSPORTE DE TODOS OS MATERIAIS)	M	1.100,00	0,00		0,00	1100,00	R\$ 52,49	R\$ 57.739,00	R\$ -	R\$ -	R\$ 57.739,00
5.13	SARJETA DE CONCRETO EM ATERRO, TIPO DR.SCA-XY, LARGURA = 80 CM TIPO 50/20 (EXECUÇÃO, INCLUINDO ESCAVAÇÃO, FORNECIMENTO E TRANSPORTE DE TODOS OS MATERIAIS)	M	1.490,00	1128,10		1128,10	361,90	R\$ 60,59	R\$ 90.279,10	R\$ 68.351,58	R\$ 68.351,58	R\$ 21.927,52
5.14	SARJETA DE CONCRETO EM ATERRO, TIPO DR.SCA-XY, LARGURA = 80 CM TIPO 50/30 (EXECUÇÃO, INCLUINDO ESCAVAÇÃO, FORNECIMENTO E TRANSPORTE DE TODOS OS MATERIAIS)	M	2.369,00	940,90		940,90	1428,10	R\$ 75,80	R\$ 179.570,20	R\$ 71.320,22	R\$ 71.320,22	R\$ 108.249,98
5.15	SARJETA DE CONCRETO EM ATERRO, TIPO DR.SCA-XY, LARGURA = 90 CM TIPO 60/30 (EXECUÇÃO, INCLUINDO ESCAVAÇÃO, FORNECIMENTO E TRANSPORTE DE TODOS OS MATERIAIS)	M	134,00	0,00		0,00	134,00	R\$ 83,99	R\$ 11.254,66	R\$ -	R\$ -	R\$ 11.254,66
5.16	SARJETA DE CONCRETO EM ATERRO, TIPO DR.SCA-XY, LARGURA = 100 CM TIPO 70/30 (EXECUÇÃO, INCLUINDO ESCAVAÇÃO, FORNECIMENTO E TRANSPORTE DE TODOS OS MATERIAIS)	M	1.065,00	0,00		0,00	1065,00	R\$ 87,21	R\$ 92.878,65	R\$ -	R\$ -	R\$ 92.878,65
5.17	CAIXA PARA BOCA DE LOBO SIMPLES	UN	36,00	39,00		39,00	-3,00	R\$ 870,12	R\$ 31.324,32	R\$ 33.934,68	R\$ 33.934,68	R\$ 2.610,36
5.18	CAIXA PARA BOCA DE LOBO DUPLA	UN	6,00	0,00		1,00	5,00	R\$ 1.606,20	R\$ 9.637,20	R\$ -	R\$ 1.606,20	R\$ 8.031,00
5.19	CONJUNTO QUADRO E GRELHA PARA BOCA DE LOBO TIPO B (CONCRETO) - PADRÃO SUDECAP	UN	42,00	39,00		41,00	1,00	R\$ 235,30	R\$ 9.882,60	R\$ 9.176,70	R\$ 9.647,30	R\$ 235,30
5.20	CANTONEIRA PARA BOCA DE LOBO TIPO B (CONCRETO) - PADRÃO SUDECAP	UN	42,00	39,00		41,00	1,00	R\$ 97,02	R\$ 4.074,84	R\$ 3.783,78	R\$ 3.977,82	R\$ 97,02
5.21	DRENO PROFUNDO COM AREIA, SEM SELO, COM 1,50X0,40 M E TUBO DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE PERFORADO, DE 100 MM ENVOLVIDO EM MANTA GEOTÉXIL NÃO TECIDA, TIPO DR.DP. 02	M	1.480,00	0,00		0,00	1480,00	R\$ 100,36	R\$ 148.532,80	R\$ -	R\$ -	R\$ 148.532,80
5.22	TRANSPORTE DE AGREGADOS PARA CONSERVAÇÃO. DISTÂNCIA MÉDIA DE TRANSPORTE > 50,10 KM	M3xKM	48.650,00	0,00		0,00	48650,00	R\$ 1,37	R\$ 66.650,50	R\$ -	R\$ -	R\$ 66.650,50
6	OBRAS COMPLEMENTARES											
6.1	MEIO FIO CONCRETO TIPO A - PADRÃO SUDECAP (12X16,7X39)CM	M	8.389,94	5604,90		6495,72	-3710,68	R\$ 38,67	R\$ 324.438,98	R\$ 216.741,48	R\$ 467.930,98	R\$ 143.492,00
6.2	FORNECIMENTO E LANÇAMENTO DE CONCRETO FCK = 15 MPa PARA CONFINAMENTO MEIO-FIO	M	2.750,00	2849,70		6495,72	-5565,42	R\$ 17,44	R\$ 47.960,00	R\$ 49.698,77	R\$ 113.285,36	R\$ 115.024,12
6.3	PASSEIOS DE CONCRETO 15 MPa E = 6 CM JUNTA SECA 3M MANUAL	M2	500,00	0,00		0,00	500,00	R\$ 40,14	R\$ 20.070,00	R\$ -	R\$ -	R\$ 20.070,00
6.4	LANÇAMENTO E ESPALHAMENTO DE MATERIAIS EM PASSEIO	M3	100,00	0,00		0,00	100,00	R\$ 17,05	R\$ 1.705,00	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.705,00
7	ADMINISTRAÇÃO LOCAL											
7.1	ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA ( CONFORME ACORDAO 2622/2013)	%	7,49730	0,06		0,001922	7,44	R\$ 13.644.389,08	R\$ 1.022.960,65	R\$ 764.644,35	R\$ 26.217,93	R\$ 232.098,36
<b>PRIMEIRO TERMO ADITIVO - SERVIÇOS NOVOS</b>												
1.0	DESCIDA											
1.1	DESCIDA D'ÁGUA TIPO DEGRAU DN 500	M	15,00	0,00		0,00	15,00	R\$ 447,95	R\$ 6.719,25	R\$ -	R\$ -	R\$ 6.719,25
2.0	SARJETA - PADRAO SUDECAP											
2.1	TIPO A - (60X10)CM - DES-R01	M	6.383,00	0,00		0,00	6383,00	R\$ 18,43	R\$ 117.638,69	R\$ -	R\$ -	R\$ 117.638,69
3.0	DRENO - PADRAO SUDECAP											
3.1	TIPO B-MANTA DRENANTE, BRITA 3, TUBO POROSO, L=50CM	M	65,00	0,00		0,00	65,00	R\$ 87,52	R\$ 5.688,80	R\$ -	R\$ -	R\$ 5.688,80

3264  
Pauze

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*


*[Handwritten signature]*  
opk

3265  
Cam

ITEM	DESCRIÇÃO	QUANTITATIVOS						VALORES					
		UNIDADE	QUANTITATIV O PREVISTO	ACUM. ANTERIOR	EXECUTADO REALIZADO	ACUM. FATURADO	SALDO A EXECUTAR	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL PREVISTO	ACUM. ANTERIOR	MEDIDO EXECUTADO	ACUM. FATURADO	SALDO A EXECUTAR
4.0	POÇO DE VISITA TIPO A - PADRAO SUDECAP	UNIDADE	25,00	0,00	0,00	0,00	25,00	R\$ 1.454,82	R\$ 36.370,50	R\$ -	R\$ -	R\$ 36.370,50	
4.1	D= 600 MM												
5.0	ARMAÇÃO INCL. CORTE, DOBRA E COLOCAÇÃO EM FUNDAÇÃO												
5.1	AÇO CA-50/60	KG	577,51	0,00	24,10	553,41	7,88	R\$ 4.550,78	R\$ -	R\$ 189,91	R\$ 189,91	R\$ 4.360,87	
6.0	CHAMINE DE POÇO DE VISITA - PADRAO SUDECAP												
6.1	TIPO BANEL CONCRETO CA-1, C/DEGRAUS EM AÇO CA 25	M	0,78	0,00	0,00	0,78	282,60	R\$ 220,43	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 220,43	
7.0	TAMPAO DE POÇO DE VISITA												
7.1	FERRO FUNDIDO NODULAR	UNID.	25,00	0,00	0,00	25,00	701,68	R\$ 17.542,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 17.542,00	
8.0	OBRAS COMPLEMENTARES E MEIO AMBIENTE												
8.1	DEFENSA SINGELA SEMI-MALEÁVEL SV-DSM-02 (EXECUÇÃO, INCLUINDO FORNECIMENTO, COLOCAÇÃO E TRANSPORTE DE TODOS OS MATERIAIS)	M	100,00	0,00	0,00	100,00	248,85	R\$ 24.885,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 24.885,00	
<b>TOTAL GERAL</b>								R\$ 15.659.433,06	R\$ 11.648.976,05	R\$ 401.295,61	R\$ 12.090.271,66	R\$ 3.609.161,39	
<b>TOTAL GERAL</b>								R\$ 15.659.433,06	R\$ 11.648.976,05	R\$ 401.295,61	R\$ 12.090.271,66	R\$ 3.609.161,39	

Comissão Permanente de Medições de Serviços de Engenharia, Obras e Verificações de Especificações Nomeada pela Portaria n.º PMC/121 de 08 de janeiro 2021, Alterada pela Portaria n.º PMC/374 de 12/04/2021 e Portaria 471 de 11/06/2021.

  
Daniel Aparecido Santos Lima (Presidente)

  
Raquel Lacerda Magre (Membro)

  
Franciele Indianara Santos Silva (Membro)

  
Jéssica Cristina Chaves Ramalho (Membro)

  
Carlos José Verêncio (Membro)

# TERRAMARES

3305  
Dama

<b>RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA</b>			DATA	03/05/2021
EMPRESA:	<b>LOCADORA TERRAMARES LTDA</b>		DATA INICIAL	02/03/2020
OBRA:	PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA E SERVIÇOS COMPLEMENTARES, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MÃO DE OBRA, NO MUNICÍPIO DE CONGONHAS-MG.	CONTRATO:	PMC/078/2020	RDO Nº: 427

DIA DA SEMANA							
2ª	3ª	4ª	5ª	6ª	SÁB	DOM	
X							
EFETIVO TOTAL:						9	
PRESENTES:		9	AUSENTES:		0		

CONDIÇÕES DO TEMPO			DADOS CONTRATUAIS		
	MANHÃ	TARDE	NOITE	PRAZO CONTRATUAL:	578
BOM	X	X	X	DIAS CORRIDOS:	427
CHUVA				DIAS RESTANTES:	151
m/m					


	DESCRIÇÃO	QUANT		DESCRIÇÃO	QUANT		DESCRIÇÃO	QUANT.	
		PRES.	AUSEN.		PRES.	AUSEN.		PRES.	AUSEN.
EFETIVO	ENGENHEIRO	0		OP. DE MINI ESCAVADEIRA	0		AJUDANTE	5	
	ENCARREGADO	0		OPERADOR DE ESPARGIDOR	0		OPERADOR BOBCAT	1	
	OPERADOR DE PATROL	0		OPERADOR DE VIBROACABADORA	0			0	
	OPERADOR DE ESCAVADEIRA	0		OPERADOR ROLO PNEU	0				
	OPERADOR DE ROLO (PÉ DE CARNEIRO)	0		OPERADOR ROLO LISO	0				
	MOTORISTA CAMINHÃO PIPA	0		MOTORISTA	0				
	OPERADOR DE TRATOR AGRÍCOLA	0		PEDREIRO	3		TOTAL	9	0

	DESCRIÇÃO	QUANT		DESCRIÇÃO	QUANT		DESCRIÇÃO	QUANT.	
		PRES.	AUSEN.		PRES.	AUSEN.		PRES.	AUSEN.
EQUIPAMENTOS	PATROL	0		MINI ESCAVADEIRA	1		CAMINHÃO TRAÇADO	0	
	ESCAVADEIRA	0		CAMINHÃO ESPARGIDOR	0		CAMINHÃO TRUCADO	0	
	ROLO COMPACTADOR (PÉ DE CARNEIRO)	0		VIBROACABADORA	0		CAMINHÃO TOCO	0	
	CAMINHÃO PIPA	0		ROLO PNEU	0		BOBCAT	1	
	TRATOR AGRÍCOLA	0		ROLO LISO	0		TOTAL	2	0

ITEM	DISCRIMINAÇÃO DAS ATIVIDADES
1	* ORDEM DE REINÍCIO DO CONTRATO - A PARTIR DO DIA 03/05/2021.
2	* EXECUÇÃO DE CAIXA DE PASSAGEM - ÁGUA BOA
3	* EXECUÇÃO / ASSENTAMENTO DE MEIO FIO - ÁGUA BOA
4	* EXECUÇÃO / CONCRETAGEM DE CONFINAMENTO DE MEIO FIO - ÁGUA BOA
5	* EXECUÇÃO DE ESCAVAÇÃO PARA SARJETA TRIANGULAR - RUA EDUARDO CARDOSO RESENDE - MONJOLOS
6	* EXECUÇÃO DE ATERRO PARA EXECUÇÃO DE CANALETAS - RUA EDUARDO CARDOSO RESENDE - MONJOLOS
7	* EXECUÇÃO DE ATERRO ATRÁS DOS MEIOS FIOS - RUA BRÍGIDO DANTAS - PIRES
8	* EXECUÇÃO DE MEIA CANA - SAÍDA DO LAGUINHO (SEGUINDO ORIENTAÇÕES DA PMC) - RUA BRÍGIDO DANTAS - PIRES

ITEM	OBSERVAÇÃO
1	
2	
3	
4	
5	
6	

<b>GALERIA DE FOTOS</b>	

ASSINATURAS:  
  
 Cláudia Maria de Jesus Rodrigues

CONTRATADA  


CONTRATANTE  Daniel Aparecido Santos Lima  
 Diretor de Obras

# TERRAMARES

3302  
Cam

<b>RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA</b>			DATA	04/06/2021
EMPRESA:	LOCADORA TERRAMARES LTDA		DATA INICIAL	02/03/2020
OBRA:	PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA E SERVIÇOS COMPLEMENTARES, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MÃO DE OBRA, NO MUNICÍPIO DE CONGONHAS-MG.	CONTRATO:	PMC/078/2020	RDO Nº: 428

DIA DA SEMANA						
2ª	3ª	4ª	5ª	6ª	SÁB	DOM
	X					
EFETIVO TOTAL: 9						
PRESENTES: 9			AUSENTES: 0			

CONDIÇÕES DO TEMPO			DADOS CONTRATUAIS		
	MANHÃ	TARDE	NOITE	PRAZO CONTRATUAL:	578
BOM	X	X	X	DIAS CORRIDOS:	428
CHUVA				DIAS RESTANTES:	150
mm					

	DESCRIÇÃO	QUANT		DESCRIÇÃO	QUANT		DESCRIÇÃO	QUANT.	
		PRES.	AUSEN.		PRES.	AUSEN.		PRES.	AUSEN.
EFETIVO	ENGENHEIRO	0		OP. DE MINI ESCAVADEIRA	0		AJUDANTE	5	
	ENCARREGADO	0		OPERADOR DE ESPARGIDOR	0		OPERADOR BOBCAT	1	
	OPERADOR DE PATROL	0		OPERADOR DE VIBROACABADORA	0			0	
	OPERADOR DE ESCAVADEIRA	0		OPERADOR ROLO PNEU	0				
	OPERADOR DE ROLO (PÉ DE CARNEIRO)	0		OPERADOR ROLO LISO	0				
	MOTORISTA CAMINHÃO PIPA	0		MOTORISTA	0				
	OPERADOR DE TRATOR AGRÍCOLA	0		PEDREIRO	3		TOTAL	9	0

	DESCRIÇÃO	QUANT		DESCRIÇÃO	QUANT		DESCRIÇÃO	QUANT.	
		PRES.	AUSEN.		PRES.	AUSEN.		PRES.	AUSEN.
EQUIPAMENTOS	PATROL	0		MINI ESCAVADEIRA	0		CAMINHÃO TRAÇADO	0	
	ESCAVADEIRA	0		CAMINHÃO ESPARGIDOR	0		CAMINHÃO TRUCADO	0	
	ROLO COMPACTADOR (PÉ DE CARNEIRO)	0		VIBROACABADORA	0		CAMINHÃO TOCO	0	
	CAMINHÃO PIPA	0		ROLO PNEU	0		BOBCAT	1	
	TRATOR AGRÍCOLA	0		ROLO LISO	0		TOTAL	1	0

ITEM	DISCRIMINAÇÃO DAS ATIVIDADES
1	* EXECUÇÃO DE ALA - ÁGUA BOA
2	* EXECUÇÃO / ASSENTAMENTO DE MEIO FIO - ÁGUA BOA
3	* EXECUÇÃO DE ESCAVAÇÃO PARA SARJETA TRIANGULAR - RUA EDUARDO CARDOSO RESENDE - MONJOLOS
4	* EXECUÇÃO DE REDE DE DRENAGEM Ø600mm - ÁGUA BOA
5	
6	
7	
8	

ITEM	OBSERVAÇÃO
1	
2	
3	
4	
5	
6	

GALERIA DE FOTOS	

Cláudia Maria de Jesus Rodrigues  
 ASSASSINATURAS:  
 CONTRATADA: 
 CONTRATANTE:

Daniel Aparecido Santos Lima  
Diretor de Obras

# TERRAMARES

3303  
Cam

RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA						DATA	05/05/2021					
EMPRESA:				LOCADORA TERRAMARES LTDA		DATA INICIAL	02/03/2020					
OBRA:	PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA E SERVIÇOS COMPLEMENTARES, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MÃO DE OBRA, NO MUNICÍPIO DE CONGONHAS-MG.			CONTRATO:	PMC/078/2020	RDO Nº:	429					
DIA DA SEMANA												
2ª	3ª	4ª	5ª	6ª	SÁB	DOM						
		X										
EFETIVO TOTAL: 9												
PRESENTES: 9      AUSENTES: 0												
CONDIÇÕES DO TEMPO												
			MANHÃ			TARDE		NOITE				
			X			X		X				
BOM								PRAZO CONTRATUAL: 578				
CHUVA								DÍAS CORRIDOS: 429				
mm								DÍAS RESTANTES: 149				
DADOS CONTRATUAIS												
PRAZO CONTRATUAL: 578												
DÍAS CORRIDOS: 429												
DÍAS RESTANTES: 149												
ELETIVO												
ELETIVO	DESCRIÇÃO		QUANT		DESCRIÇÃO		QUANT		DESCRIÇÃO		QUANT.	
			PRES.	AUSEN.			PRES.	AUSEN.			PRES.	AUSEN.
	ENGENHEIRO		0		OP. DE MINI ESCAVADEIRA		0		AJUDANTE		5	
	ENCARREGADO		0		OPERADOR DE ESPARGIDOR		0		OPERADOR BOBCAT		1	
	OPERADOR DE PATROL		0		OPERADOR DE VIBROACABADORA		0				0	
	OPERADOR DE ESCAVADEIRA		0		OPERADOR ROLO PNEU		0					
	OPERADOR DE ROLO (PÊ DE CARNEIRO)		0		OPERADOR ROLO LISO		0					
	MOTORISTA CAMINHÃO PIPA		0		MOTORISTA		0					
OPERADOR DE TRATOR AGRÍCOLA		0		PEDREIRO		3		TOTAL		9	0	
EQUIPAMENTOS												
EQUIPAMENTOS	DESCRIÇÃO		QUANT		DESCRIÇÃO		QUANT		DESCRIÇÃO		QUANT.	
			PRES.	AUSEN.			PRES.	AUSEN.			PRES.	AUSEN.
	PATROL		0		MINI ESCAVADEIRA		0		CAMINHÃO TRAÇADO		0	
	ESCAVADEIRA		0		CAMINHÃO ESPARGIDOR		0		CAMINHÃO TRUCADO		0	
	ROLO COMPACTADOR (PÊ DE CARNEIRO)		0		VIBROACABADORA		0		CAMINHÃO TOCO		0	
	CAMINHÃO PIPA		0		ROLO PNEU		0		BOBCAT		1	
	TRATOR AGRÍCOLA		0		ROLO LISO		0		TOTAL		1	0
DISCRIMINAÇÃO DAS ATIVIDADES												
PRODUÇÃO		ITEM										
		1	* EXECUÇÃO DE ALA - ÁGUA BOA									
		2	* EXECUÇÃO / ASSENTAMENTO DE MEIO FIO - ÁGUA BOA									
		3	* EXECUÇÃO DE ESCAVAÇÃO PARA SARJETA TRIANGULAR - RUA EDUARDO CARDOSO RESENDE - MONJOLOS									
		4	* EXECUÇÃO DE CAIXA DE PASSAGEM - ÁGUA BOA									
		5										
		6										
		7										
		8										
OBSERVAÇÃO		ITEM										
		1										
		2										
		3										
		4										
		5										
		6										
GALERIA DE FOTOS												

*Cláudia Maria de Jesus Rodrigues*  
Assessor IV

*[Assinatura]*  
CONTRATADA

*[Assinatura]*  
CONTRATANTE

**Daniel Aparecido Santos Lima**  
Diretor de Obras

# TERRAMARES

3304  
Lima

## RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA

EMPRESA: <b>LOCADORA TERRAMARES LTDA</b>		DATA: <b>06/06/2021</b>
OBRA: <b>PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA E SERVIÇOS COMPLEMENTARES, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MÃO DE OBRA, NO MUNICÍPIO DE CONGONHAS-MG.</b>		DATA INICIAL: <b>02/03/2020</b>
CONTRATO: <b>PMC.078/2020</b>	RDO Nº: <b>430</b>	

DIA DA SEMANA						
2ª	3ª	4ª	5ª	6ª	SÁB	DOM
			X			
EFETIVO TOTAL: <b>8</b>						
PRESENTES: <b>8</b>			AUSENTES: <b>0</b>			

CONDIÇÕES DO TEMPO			DADOS CONTRATUAIS		
	MANHÃ	TARDE	NOITE	PRAZO CONTRATUAL:	578
BOM	X	X	X	DIAS CORRIDOS:	430
CHUVA				DIAS RESTANTES:	148
mm					

	DESCRIÇÃO	QUANT		DESCRIÇÃO	QUANT		DESCRIÇÃO	QUANT.	
		PRES.	AUSEN.		PRES.	AUSEN.		PRES.	AUSEN.
EFETIVO	ENGENHEIRO	0		OP. DE MINI ESCAVADEIRA	0		AJUDANTE	5	
	ENCARREGADO	0		OPERADOR DE ESPARGIDOR	0			0	
	OPERADOR DE PATROL	0		OPERADOR DE VIBROACABADORA	0			0	
	OPERADOR DE ESCAVADEIRA	0		OPERADOR ROLO PNEU	0				
	OPERADOR DE ROLO (PÉ DE CARNEIRO)	0		OPERADOR ROLO LISO	0				
	MOTORISTA CAMINHÃO PIPA	0		MOTORISTA	0				
	OPERADOR DE TRATOR AGRÍCOLA	0		PEGREIRO	3		TOTAL	8	0

	DESCRIÇÃO	QUANT		DESCRIÇÃO	QUANT		DESCRIÇÃO	QUANT.	
		PRES.	AUSEN.		PRES.	AUSEN.		PRES.	AUSEN.
EQUIPAMENTOS	PATROL	0		MINI ESCAVADEIRA	0		CAMINHÃO TRAÇADO	0	
	ESCAVADEIRA	0		CAMINHÃO ESPARGIDOR	0		CAMINHÃO TRUCADO	0	
	ROLO COMPACTADOR (PÉ DE CARNEIRO)	0		VIBROACABADORA	0		CAMINHÃO TOCO	0	
	CAMINHÃO PIPA	0		ROLO PNEU	0		CARRETAS	0	
	TRATOR AGRÍCOLA	0		ROLO LISO	0		TOTAL	0	0

ITEM	DISCRIMINAÇÃO DAS ATIVIDADES
1	* EXECUÇÃO DE ALA - ÁGUA BOA
2	* EXECUÇÃO / ASSENTAMENTO DE MEIO FIO - ÁGUA BOA
3	* EXECUÇÃO DE SARJETA TRIANGULAR - RUA EDUARDO CARDOSO RESENDE - MONJOLOS
4	* EXECUÇÃO DE SARJETA TRIANGULAR - ÁGUA BOA
5	
6	
7	
8	

ITEM	OBSERVAÇÃO
1	
2	
3	
4	
5	
6	

**GALERIA DE FOTOS**

OPS: BARRO MONJOLOS MANILHAS DE TRAVESSIA JÁ ESTAVAM ASSENTADAS, NÃO FIZEMOS TRAVESSIA NESTA ÚLTIMA.

ASSINATURAS:

CONTRATADA: *[Assinatura]*

CONTRATANTE: *[Assinatura]* Daniel Aparecido Santos Lima  
Diretor de Obras

# TERRAMARES

3305  
Dante

## RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA

EMPRESA: <b>LOCADORA TERRAMARES LTDA</b>		DATA: <b>07/06/2021</b>
OBRA: <b>PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA E SERVIÇOS COMPLEMENTARES, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MÃO DE OBRA, NO MUNICÍPIO DE CONGONHAS-MG.</b>		DATA INICIAL: <b>02/03/2020</b>
CONTRATO: <b>PMC/078/2020</b>	RDO Nº: <b>431</b>	

DIA DA SEMANA						
2ª	3ª	4ª	5ª	6ª	SÁB	DOM
				X		
EFETIVO TOTAL: <b>8</b>						
PRESENTES: <b>8</b>			AUSENTES: <b>0</b>			

CONDIÇÕES DO TEMPO			DADOS CONTRATUAIS		
	MANHÃ	TARDE	NOITE	PRAZO CONTRATUAL:	578
BOM	X	X	X	DIAS CORRIDOS:	431
CHUVA				DIAS RESTANTES:	147
mm					

EFETIVO	DESCRIÇÃO	QUANT		DESCRIÇÃO	QUANT		DESCRIÇÃO	QUANT.	
		PRES.	AUSEN.		PRES.	AUSEN.		PRES.	AUSEN.
	ENGENHEIRO	0		OP. DE MINI ESCAVADEIRA	0		AJUDANTE	5	
	ENCARREGADO	0		OPERADOR DE ESPARGIDOR	0			0	
	OPERADOR DE PATROL	0		OPERADOR DE VIBROACABADORA	0			0	
	OPERADOR DE ESCAVADEIRA	0		OPERADOR ROLO PNEU	0				
	OPERADOR DE ROLO (PÊ DE CARNEIRO)	0		OPERADOR ROLO LISO	0				
	MOTORISTA CAMINHÃO PIPA	0		MOTORISTA	0				
	OPERADOR DE TRATOR AGRÍCOLA	0		PEDREIRO	3		TOTAL	8	0

EQUIPAMENTOS	DESCRIÇÃO	QUANT		DESCRIÇÃO	QUANT		DESCRIÇÃO	QUANT.	
		PRES.	AUSEN.		PRES.	AUSEN.		PRES.	AUSEN.
	PATROL	0		MINI ESCAVADEIRA	1		CAMINHÃO TRAÇADO	0	
	ESCAVADEIRA	0		CAMINHÃO ESPARGIDOR	0		CAMINHÃO TRUCADO	0	
	ROLO COMPACTADOR (PÊ DE CARNEIRO)	0		VIBROACABADORA	0		CAMINHÃO TOCO	0	
	CAMINHÃO PIPA	0		ROLO PNEU	0		CARRETAS	0	
	TRATOR AGRÍCOLA	0		ROLO LISO	0		TOTAL	1	0

ITEM	DISCRIMINAÇÃO DAS ATIVIDADES
1	* EXECUÇÃO DE ATERRO ATRÁS DOS MEIOS FIOS - ÁGUA BOA
2	* EXECUÇÃO / ASSENTAMENTO DE MEIO FIO - ÁGUA BOA
3	* EXECUÇÃO DE SARJETA TRIANGULAR - RUA EDUARDO CARDOSO RESENDE - MONJOLOS
4	
5	
6	
7	
8	

ITEM	OBSERVAÇÃO
1	OBS.: FOI REALIZADO UMA VISITA AO MONJOLOS PELA EQUIPE TÉCNICA DA CONTRATADA JUNTO AO SR. DIRETOR DE OBRAS DANIEL APARECIDO SANTOS LIMA, ONDE FOI DEFINIDOS OS PONTOS DE EXECUÇÃO DE SARJETA, MEIO FIO, ALA E CAIXA DE PASSAGEM;
2	
3	É IMPORTANTE RESSALTAR QUE HÁ UM PONTO QUE POSSUI A NECESSIDADE DA CONSTRUÇÃO DE UM MURO DE GABIÃO. O SR. DANIEL, DIRETOR DE OBRAS, FICOU DE VERIFICAR COMO SERÁ CONSTRUÍDO ESSE GABIÃO.
4	
5	
6	
8	

### GALERIA DE FOTOS

OBS: BARRIO MONJOLOS MANILHAS DE TRAVESSIA JÁ ESTAVAM ASSENTADAS / POSICIONADAS. NÃO FIZEMOS TRAVESSIAS NESTA ETAPA.

ASSINATURA: Jesus Rodrigues  
Assessor IV

CONTRATADA

CONTRATANTE

Daniel Aparecido Santos Lima  
Diretor de Obras

# TERRAMARES

3306  
Davi

## RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA

EMPRESA:		LOCADORA TERRAMARES LTDA		DATA:	08/06/2021
OBRA:		PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA E SERVIÇOS COMPLEMENTARES, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MÃO DE OBRA, NO MUNICÍPIO DE CONGONHAS-MG.		DATA INICIAL:	02/03/2020
		CONTRATO:	PMC/078/2020	RDO Nº:	432

DIA DA SEMANA						
2ª	3ª	4ª	5ª	6ª	SÁB	DOM
					X	
EFETIVO TOTAL: 0						
PRESENTES: 0			AUSENTES: 0			

CONDIÇÕES DO TEMPO			DADOS CONTRATUAIS		
	MANHÃ	TARDE	NOITE	PRAZO CONTRATUAL:	578
BOM	X	X	X	DIAS CORRIDOS:	432
CHUVA				DIAS RESTANTES:	146
mm					

EFETIVO	DESCRIÇÃO	QUANT		DESCRIÇÃO	QUANT		DESCRIÇÃO	QUANT.	
		PRES.	AUSEN.		PRES.	AUSEN.		PRES.	AUSEN.
	ENGENHEIRO	0		OP. DE MINI ESCAVADEIRA	0		AJUDANTE	0	
	ENCARREGADO	0		OPERADOR DE ESPARGIDOR	0			0	
	OPERADOR DE PATROL	0		OPERADOR DE VIBROACABADORA	0			0	
	OPERADOR DE ESCAVADEIRA	0		OPERADOR ROLO PNEU	0				
	OPERADOR DE ROLO (PÉ DE CARNEIRO)	0		OPERADOR ROLO LISO	0				
	MOTORISTA CAMINHÃO PIPA	0		MOTORISTA	0				
	OPERADOR DE TRATOR AGRÍCOLA	0		PEDREIRO	0		TOTAL	0	0


EQUIPAMENTOS	DESCRIÇÃO	QUANT		DESCRIÇÃO	QUANT		DESCRIÇÃO	QUANT.	
		PRES.	AUSEN.		PRES.	AUSEN.		PRES.	AUSEN.
	PATROL	0		MINI ESCAVADEIRA	0		CAMINHÃO TRAÇADO	0	
	ESCAVADEIRA	0		CAMINHÃO ESPARGIDOR	0		CAMINHÃO TRUCADO	0	
	ROLO COMPACTADOR (PÉ DE CARNEIRO)	0		VIBROACABADORA	0		CAMINHÃO TOCO	0	
	CAMINHÃO PIPA	0		ROLO PNEU	0		CARRETAS	0	
	TRATOR AGRÍCOLA	0		ROLO LISO	0		TOTAL	0	0

### ITEM DISCRIMINAÇÃO DAS ATIVIDADES

ITEM	DISCRIMINAÇÃO DAS ATIVIDADES
1	* NÃO HOUE EXECUÇÃO DE ATIVIDADES - SÁBADO
2	
3	
4	
5	
6	
7	
8	

ITEM	OBSERVAÇÃO
1	
2	
3	
4	
5	
6	

### GALERIA DE FOTOS



ASSINATURAS:  
Cláudia Maria de Jesus  
Assessor IV

CONTRATADA  
CONTRATANTE  
Daniel Aparecido Santos Lima  
Diretor de Obras

# TERRAMARES

3307  
*[Handwritten Signature]*

## RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA

EMPRESA: <b>LOCADORA TERRAMARES LTDA</b>		DATA: <b>09/05/2021</b>
OBRA: <b>PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA E SERVIÇOS COMPLEMENTARES, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MÃO DE OBRA, NO MUNICÍPIO DE CONGONHAS-MG.</b>		DATA INICIAL: <b>02/03/2020</b>
CONTRATO: <b>PMC/078/2020</b>	RDO Nº: <b>433</b>	

DIA DA SEMANA						
2ª	3ª	4ª	5ª	6ª	SÁB	DOM
						X
EFETIVO TOTAL: 0						
PRESENTES: 0			AUSENTES: 0			

CONDIÇÕES DO TEMPO			DADOS CONTRATUAIS		
	MANHÃ	TARDE	NOITE	PRAZO CONTRATUAL:	576
BOM	X	X	X	DIAS CORRIDOS:	433
CHUVA				DIAS RESTANTES:	145
mm					

	DESCRIÇÃO	QUANT		DESCRIÇÃO	QUANT		DESCRIÇÃO	QUANT.	
		PRES.	AUSEN.		PRES.	AUSEN.		PRES.	AUSEN.
EFETIVO	ENGENHEIRO	0		OP. DE MINI ESCAVADEIRA	0		AJUDANTE	0	
	ENCARREGADO	0		OPERADOR DE ESPARGIDOR	0			0	
	OPERADOR DE PATROL	0		OPERADOR DE VIBROACABADORA	0			0	
	OPERADOR DE ESCAVADEIRA	0		OPERADOR ROLO PNEU	0				
	OPERADOR DE ROLO (PÉ DE CARNEIRO)	0		OPERADOR ROLO LISO	0				
	MOTORISTA CAMINHÃO PIPA	0		MOTORISTA	0				
	OPERADOR DE TRATOR AGRÍCOLA	0		PEDREIRO	0		TOTAL	0	0


	DESCRIÇÃO	QUANT		DESCRIÇÃO	QUANT		DESCRIÇÃO	QUANT.	
		PRES.	AUSEN.		PRES.	AUSEN.		PRES.	AUSEN.
EQUIPAMENTOS	PATROL	0		MINI ESCAVADEIRA	0		CAMINHÃO TRAÇADO	0	
	ESCAVADEIRA	0		CAMINHÃO ESPARGIDOR	0		CAMINHÃO TRUCADO	0	
	ROLO COMPACTADOR (PÉ DE CARNEIRO)	0		VIBROACABADORA	0		CAMINHÃO TOCO	0	
	CAMINHÃO PIPA	0		ROLO PNEU	0		CARRETAS	0	
	TRATOR AGRÍCOLA	0		ROLO LISO	0		TOTAL	0	0

### ITEM DISCRIMINAÇÃO DAS ATIVIDADES

ITEM	DISCRIMINAÇÃO DAS ATIVIDADES
1	* NÃO HOUVE EXECUÇÃO DE ATIVIDADES - DOMINGO
2	
3	
4	
5	
6	
7	
8	

ITEM	OBSERVAÇÃO
1	
2	
3	
4	
5	
6	

### GALERIA DE FOTOS



ASSINATURAS:

*[Handwritten Signature]*  
 Cláudia Maria de Jesus Rodrigues  
 Assessor IV

CONTRATADA

*[Handwritten Signature]*

CONTRATANTE

*[Handwritten Signature]*  
 Daniel Aparecido Santos Lima  
 Diretor de Obras

# TERRAMARES

3308  
Dama

## RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA

EMPRESA: <b>LOCADORA TERRAMARES LTDA</b>		DATA: <b>10/05/2021</b>
OBRA: <b>PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA E SERVIÇOS COMPLEMENTARES, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MÃO DE OBRA, NO MUNICÍPIO DE CONGONHAS-MG.</b>		DATA INICIAL: <b>02/03/2020</b>
CONTRATO: <b>PMC/078/2020</b>	RDO Nº: <b>434</b>	

DIA DA SEMANA							
2ª	3ª	4ª	5ª	6ª	SÁB	DOM	
X							
EFETIVO TOTAL: <b>8</b>							
PRESENTES: <b>8</b>				AUSENTES: <b>0</b>			

CONDIÇÕES DO TEMPO			DADOS CONTRATUAIS		
	MANHÃ	TARDE	NOITE	PRAZO CONTRATUAL:	576
BOM	X	X	X	DIAS CORRIDOS:	434
CHUVA				DIAS RESTANTES:	144
mm					

EFETIVO	DESCRIÇÃO	QUANT		DESCRIÇÃO	QUANT		DESCRIÇÃO	QUANT.	
		PRES.	AUSEN.		PRES.	AUSEN.		PRES.	AUSEN.
	ENGENHEIRO	0		OP. DE MINI ESCAVADEIRA	0		AJUDANTE	3	
	ENCARREGADO	0		OPERADOR DE ESPARGIDOR	0				
	OPERADOR DE PATROL	0		OPERADOR DE VIBROACABADORA	0				
	OPERADOR DE ESCAVADEIRA	0		OPERADOR ROLO PNEU	0				
	OPERADOR DE ROLO (PÉ DE CARNEIRO)	0		OPERADOR ROLO LISO	0				
	MOTORISTA CAMINHÃO PIPA	0		MOTORISTA	0				
	OPERADOR DE TRATOR AGRÍCOLA	0		PEDREIRO	5		TOTAL	8	0


EQUIPAMENTOS	DESCRIÇÃO	QUANT		DESCRIÇÃO	QUANT		DESCRIÇÃO	QUANT.	
		PRES.	AUSEN.		PRES.	AUSEN.		PRES.	AUSEN.
	PATROL	0		MINI ESCAVADEIRA	0		CAMINHÃO TRAÇADO	0	
	ESCAVADEIRA	0		CAMINHÃO ESPARGIDOR	0		CAMINHÃO TRUCADO	0	
	ROLO COMPACTADOR (PÉ DE CARNEIRO)	0		VIBROACABADORA	0		CAMINHÃO TOCO	0	
	CAMINHÃO PIPA	0		ROLO PNEU	0		CARRETAS	0	
	TRATOR AGRÍCOLA	0		ROLO LISO	0		TOTAL	0	0


ITEM	DISCRIMINAÇÃO DAS ATIVIDADES
1	* EXECUÇÃO DE MEIO FIO IN LOCO - ÁGUA BOA
2	* EXECUÇÃO / CONCRETAGEM DE CONFINAMENTO EM MEIO FIO - ÁGUA BOA
3	
4	
5	
6	
7	
8	

ITEM	OBSERVAÇÃO
1	OBS.: FOI DEFINIDO JUNTAMENTE AO SR. DANIEL APARECIDO SANTOS LIMA, DIRETOR DE OBRAS, OS SEGUINTEIS ITENS:
2	• OS LOCAIS ONDE NÃO É POSSÍVEL ASSENTAR MEIOS FIOS PRÉ MOLDADOS;
3	• OS LOCAIS A SEREM EXECUTADOS MEIOS FIOS IN LOCO. OS MEIOS FIOS MOLDADOS IN LOCO, SERÃO COBRADOS COMO FORMA, AÇO E CONCRETO, CONFORME ACORDADO COM O DIRETOR DANIEL.
4	
5	
6	

GALERIA DE FOTOS	

ASSINATURAS:  
  
 Cláudia Maria de Jesus Rodrigues  
 Assessor IV

CONTRATADA  


CONTRATANTE  
  
 Daniel Aparecido Santos Lima  
 Diretor de Obras

# TERRAMARES

3309  
Dama

<b>RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA</b>		DATA	11/05/2021	
EMPRESA:	<b>LOCADORA TERRAMARES LTDA</b>		DATA INICIAL	02/03/2020
OBRA:	PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA E SERVIÇOS COMPLEMENTARES, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MÃO DE OBRA, NO MUNICÍPIO DE CONGONHAS-MG.	CONTRATO:	PMC/078/2020 RDO Nº: 435	

DIA DA SEMANA						
2ª	3ª	4ª	5ª	6ª	SÁB	DOM
X						
EFETIVO TOTAL: 4						
PRESENTES: 4			AUSENTES: 0			

CONDIÇÕES DO TEMPO			DADOS CONTRATUAIS		
	MANHÃ	TARDE	NOITE	PRAZO CONTRATUAL:	578
BOM	X	X	X	DIAS CORRIDOS:	435
CHUVA				DIAS RESTANTES:	143
mm					

	DESCRIÇÃO	QUANT		DESCRIÇÃO	QUANT		DESCRIÇÃO	QUANT.	
		PRES.	AUSEN.		PRES.	AUSEN.		PRES.	AUSEN.
EFETIVO	ENGENHEIRO	0		OP. DE MINI ESCAVADEIRA	0		AJUDANTE	2	
	ENCARREGADO	0		OPERADOR DE ESPARGIDOR	0				
	OPERADOR DE PATROL	0		OPERADOR DE VIBROCABADORA	0				
	OPERADOR DE ESCAVADEIRA	0		OPERADOR ROLO PNEU	0				
	OPERADOR DE ROLO (PÉ DE CARNEIRO)	0		OPERADOR ROLO LISO	0				
	MOTORISTA CAMINHÃO PIPA	0		MOTORISTA	0				
	OPERADOR DE TRATOR AGRÍCOLA	0		PEDREIRO	2		TOTAL	4	0

	DESCRIÇÃO	QUANT		DESCRIÇÃO	QUANT		DESCRIÇÃO	QUANT.	
		PRES.	AUSEN.		PRES.	AUSEN.		PRES.	AUSEN.
EQUIPAMENTOS	PATROL	0		MINI ESCAVADEIRA	1		CAMINHÃO TRAÇADO	0	
	ESCAVADEIRA	0		CAMINHÃO ESPARGIDOR	0		CAMINHÃO TRUCADO	0	
	ROLO COMPACTADOR (PÉ DE CARNEIRO)	0		VIBROCABADORA	0		CAMINHÃO TOCO	0	
	CAMINHÃO PIPA	0		ROLO PNEU	0		CARRETAS	0	
	TRATOR AGRÍCOLA	0		ROLO LISO	0		TOTAL	1	0

ITEM	DISCRIMINAÇÃO DAS ATIVIDADES	
1	* EXECUÇÃO DE BOCA DE LOBO DUPLA - ÁGUA BOA	
2	* EXECUÇÃO DE SARJETA EM V - MONJOLOS	
3	* EXECUÇÃO DE ESCAVAÇÃO PARA EXECUÇÃO DE SARJETA EM "V" - MONJOLOS	
4		
5		
6		
7		
8		

ITEM	OBSERVAÇÃO
1	/
2	
3	
4	
5	
6	

GALERIA DE FOTOS	
/	

ASSINATURAS:

*Claudia Maria de Jesus Rodrigues*  
Assessor IV

CONTRATADA

CONTRATANTE

*Daniel Aparecido Santos Lima*  
Diretor de Obras

# TERRAMARES

3310  
Obra

## RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA

EMPRESA: <b>LOCADORA TERRAMARES LTDA</b>		DATA: <b>12/05/2021</b>
OBRA: <b>PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA E SERVIÇOS COMPLEMENTARES, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MÃO DE OBRA, NO MUNICÍPIO DE CONGONHAS-MG.</b>		DATA INICIAL: <b>02/03/2020</b>
CONTRATO: <b>PMC/078/2020</b>	RDO Nº: <b>436</b>	

DIA DA SEMANA						
2ª	3ª	4ª	5ª	6ª	SÁB	DOM
		X				
EFETIVO TOTAL: <b>8</b>						
PRESENTES: <b>8</b>			AUSENTES: <b>0</b>			


CONDIÇÕES DO TEMPO			DADOS CONTRATUAIS		
	MANHÃ	TARDE	NOITE	PRAZO CONTRATUAL:	578
BOM	X	X	X	DÍAS CORRIDOS:	436
CHUVA				DÍAS RESTANTES:	142
mm					

EFETIVO	DESCRIÇÃO	QUANT		DESCRIÇÃO	QUANT		DESCRIÇÃO	QUANT.	
		PRES.	AUSEN.		PRES.	AUSEN.		PRES.	AUSEN.
	ENGENHEIRO	0		OP. DE MINI ESCAVADEIRA	0		AJUDANTE	4	
	ENCARREGADO	0		OPERADOR DE ESPARGIDOR	0				
	OPERADOR DE PATROL	0		OPERADOR DE VIBROACABADORA	0				
	OPERADOR DE ESCAVADEIRA	0		OPERADOR ROLO PNEU	0				
	OPERADOR DE ROLO (PÉ DE CARNEIRO)	0		OPERADOR ROLO LISO	0				
	MOTORISTA CAMINHÃO PIPA	0		MOTORISTA	0				
	OPERADOR DE TRATOR AGRÍCOLA	0		PEDREIRO	4		TOTAL	8	0



EQUIPAMENTOS	DESCRIÇÃO	QUANT		DESCRIÇÃO	QUANT		DESCRIÇÃO	QUANT.	
		PRES.	AUSEN.		PRES.	AUSEN.		PRES.	AUSEN.
	PATROL	0		MINI ESCAVADEIRA	0		CAMINHÃO TRAÇADO	0	
	ESCAVADEIRA	0		CAMINHÃO ESPARGIDOR	0		CAMINHÃO TRUCADO	0	
	ROLO COMPACTADOR (PÉ DE CARNEIRO)	0		VIBROACABADORA	0		CAMINHÃO TOCO	0	
	CAMINHÃO PIPA	0		ROLO PNEU	0		CARRETAS	0	
	TRATOR AGRÍCOLA	0		ROLO LISO	0		TOTAL	0	0

ITEM	DISCRIMINAÇÃO DAS ATIVIDADES
1	* EXECUÇÃO DE BOCA DE LOBO DUPLA - ÁGUA BOA
2	* EXECUÇÃO DE SARJETA EM V - MONJOLOS
3	
4	
5	
6	
7	
8	

ITEM	OBSERVAÇÃO
1	
2	
3	
4	
5	
6	



ASSINATURAS:

CONTRATADA: **Claudia Maria de Jesus Rodrigues** Assessor IV  
 CONTRATANTE: **Daniel Aparecido Santos Lima** Diretor de Obras

# TERRAMARES

3311  
Dano

<b>RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA</b>		DATA	13/05/2021		
EMPRESA:	LOCADORA TERRAMARES LTDA		DATA INICIAL	02/03/2020	
OBRA:	PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA E SERVIÇOS COMPLEMENTARES, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MÃO DE OBRA, NO MUNICÍPIO DE CONGONHAS-MG.	CONTRATO:	PMC/078/2020	RDO Nº:	437

DIA DA SEMANA							
2ª	3ª	4ª	5ª	6ª	SÁB	DOM	
			X				
EFETIVO TOTAL: 8							
PRESENTES: 8							
AUSENTES: 0							


CONDIÇÕES DO TEMPO			DADOS CONTRATUAIS		
	MANHÃ	TARDE	NOITE	PRAZO CONTRATUAL:	578
BOM	X	X	X	DIAS CORRIDOS:	437
CHUVA				DIAS RESTANTES:	141
mm					

EFETIVO	DESCRIÇÃO	QUANT		DESCRIÇÃO	QUANT		DESCRIÇÃO	QUANT.	
		PRES.	AUSEN.		PRES.	AUSEN.		PRES.	AUSEN.
	ENGENHEIRO	0		OP. DE MINI ESCAVADEIRA	0		AJUDANTE	4	
	ENCARREGADO	0		OPERADOR DE ESPARGIDOR	0				
	OPERADOR DE PATROL	0		OPERADOR DE VIBROACABADORA	0				
	OPERADOR DE ESCAVADEIRA	0		OPERADOR ROLO PNEU	0				
	OPERADOR DE ROLO (PÊ DE CARNEIRO)	0		OPERADOR ROLO LISO	0				
	MOTORISTA CAMINHÃO PIPA	0		MOTORISTA	0				
	OPERADOR DE TRATOR AGRÍCOLA	0		PEDREIRO	4		TOTAL	8	0


EQUIPAMENTOS	DESCRIÇÃO	QUANT		DESCRIÇÃO	QUANT		DESCRIÇÃO	QUANT.	
		PRES.	AUSEN.		PRES.	AUSEN.		PRES.	AUSEN.
	PATROL	0		MINI ESCAVADEIRA	0		CAMINHÃO TRAÇADO	0	
	ESCAVADEIRA	0		CAMINHÃO ESPARGIDOR	0		CAMINHÃO TRUCADO	0	
	ROLO COMPACTADOR (PÊ DE CARNEIRO)	0		VIBROACABADORA	0		CAMINHÃO TOCO	0	
	CAMINHÃO PIPA	0		ROLO PNEU	0		CARRETAS	0	
	TRATOR AGRÍCOLA	0		ROLO LISO	0		TOTAL	0	0


ITEM	DISCRIMINAÇÃO DAS ATIVIDADES
1	* EXECUÇÃO DE BOCA DE LOBO DUPLA - ÁGUA BOA
2	* EXECUÇÃO DE SARJETA EM V - MONJOLOS
3	* EXECUÇÃO DE MEO FIO IN LOCO - ÁGUA BOA
4	
5	
6	
7	
8	

ITEM	OBSERVAÇÃO
1	
2	
3	
4	
5	
6	



ASSINATURAS:


 Claudia Maria de Jesus Rodriguez  
 Assessor IV


 Daniel Aparecido Santos Lima  
 Diretor de Obras

# TERRAMARES

3312  
Auno

<b>RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA</b>			DATA	14/06/2021
EMPRESA:	LOCADORA TERRAMARES LTDA		DATA INICIAL	02/03/2020
OBRA:	PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA E SERVIÇOS COMPLEMENTARES, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MÃO DE OBRA, NO MUNICÍPIO DE CONGONHAS-MG.	CONTRATO:	PMC/078/2020	RDO Nº: 438

DIA DA SEMANA							
2ª	3ª	4ª	5ª	6ª	SÁB	DOM	
				X			
EFETIVO TOTAL: 11							
PRESENTES: 11				AUSENTES: 0			

CONDIÇÕES DO TEMPO			DADOS CONTRATUAIS		
	MANHÃ	TARDE	NOITE	PRAZO CONTRATUAL:	578
BOM	X	X	X	DIAS CORRIDOS:	438
CHUVA				DIAS RESTANTES:	140
mm					

EFETIVO	DESCRIÇÃO	QUANT		DESCRIÇÃO	QUANT		DESCRIÇÃO	QUANT.	
		PRES.	AUSEN.		PRES.	AUSEN.		PRES.	AUSEN.
	ENGENHEIRO	0		OP. DE MINI ESCAVADEIRA	0		AJUDANTE	6	
	ENCARREGADO	0		OPERADOR DE ESPARGIDOR	0		MOTORISTA CAMINHÃO	1	
	OPERADOR DE PATROL	0		OPERADOR DE VIBROCABADORA	0				
	OPERADOR DE ESCAVADEIRA	0		OPERADOR ROLO PNEU	0				
	OPERADOR DE ROLO (PÉ DE CARNEIRO)	0		OPERADOR ROLO LISO	0				
	MOTORISTA CAMINHÃO PIPA	0		MOTORISTA	0				
	OPERADOR DE TRATOR AGRÍCOLA	0		PEDREIRO	4		TOTAL	11	0



EQUIPAMENTOS	DESCRIÇÃO	QUANT		DESCRIÇÃO	QUANT		DESCRIÇÃO	QUANT.	
		PRES.	AUSEN.		PRES.	AUSEN.		PRES.	AUSEN.
	PATROL	0		MINI ESCAVADEIRA	0		CAMINHÃO TRAÇADO	0	
	ESCAVADEIRA	0		CAMINHÃO ESPARGIDOR	0		CAMINHÃO TRUCADO	0	
	ROLO COMPACTADOR (PÉ DE CARNEIRO)	0		VIBROCABADORA	0		CAMINHÃO TOCO	0	
	CAMINHÃO PIPA	0		ROLO PNEU	0		CAMINHÃO BETONEIRA	1	
	TRATOR AGRÍCOLA	0		ROLO LISO	0		TOTAL	1	0

ITEM	DISCRIMINAÇÃO DAS ATIVIDADES
1	* EXECUÇÃO DE MEIO FIO - ÁGUA BOA
2	* EXECUÇÃO DE MEIO FIO - MONJOLOS
3	* EXECUÇÃO DE SARJETA EM "V" - MONJOLOS
4	* EXECUÇÃO DE MEIO FIO - RUA 14 - LEOPOLDINO BARBOSA
5	
6	
7	
8	

ITEM	OBSERVAÇÃO
1	
2	
3	
4	
5	
6	

GALERIA DE FOTOS

ASSINATURAS:

CONTRATADA: **Claudia Maria de Jesus Rodrigues**  
 Assessor IV

CONTRATANTE: **Daniel Aparecido Santos Lima**  
 Diretor de Obras

# TERRAMARES

3313  
Dano

## RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA

EMPRESA: <b>LOCADORA TERRAMARES LTDA</b>		DATA: <b>15/05/2021</b>
OBRA: <b>PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA E SERVIÇOS COMPLEMENTARES, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MÃO DE OBRA, NO MUNICÍPIO DE CONGONHAS-MG.</b>		DATA INICIAL: <b>02/03/2020</b>
CONTRATO: <b>PMC/078/2020</b>	RDO Nº: <b>439</b>	

DIA DA SEMANA						
2ª	3ª	4ª	5ª	6ª	SÁB	DOM
					X	
EFETIVO TOTAL: 0						
PRESENTES: 0			AUSENTES: 0			

CONDIÇÕES DO TEMPO			DADOS CONTRATUAIS		
	MANHÃ	TARDE	NOITE	PRAZO CONTRATUAL:	576
BOM	X	X	X	DIAS CORRIDOS:	439
CHUVA				DIAS RESTANTES:	139
mm					

	DESCRIÇÃO	QUANT		DESCRIÇÃO	QUANT		DESCRIÇÃO	QUANT.	
		PRES.	AUSEN.		PRES.	AUSEN.		PRES.	AUSEN.
EFETIVO	ENGENHEIRO	0		OP. DE MINI ESCAVADEIRA	0		AJUDANTE	0	
	ENCARREGADO	0		OPERADOR DE ESPARGIDOR	0		MOTORISTA CAMINHÃO	0	
	OPERADOR DE PATROL	0		OPERADOR DE VIBROACABADORA	0				
	OPERADOR DE ESCAVADEIRA	0		OPERADOR ROLO PNEU	0				
	OPERADOR DE ROLO (PÉ DE CARNEIRO)	0		OPERADOR ROLO LISO	0				
	MOTORISTA CAMINHÃO PIPA	0		MOTORISTA	0				
	OPERADOR DE TRATOR AGRÍCOLA	0		PEDREIRO	0		TOTAL	0	0



	DESCRIÇÃO	QUANT		DESCRIÇÃO	QUANT		DESCRIÇÃO	QUANT.	
		PRES.	AUSEN.		PRES.	AUSEN.		PRES.	AUSEN.
EQUIPAMENTOS	PATROL	0		MINI ESCAVADEIRA	0		CAMINHÃO TRAÇADO	0	
	ESCAVADEIRA	0		CAMINHÃO ESPARGIDOR	0		CAMINHÃO TRUCADO	0	
	ROLO COMPACTADOR (PÉ DE CARNEIRO)	0		VIBROACABADORA	0		CAMINHÃO TOCO	0	
	CAMINHÃO PIPA	0		ROLO PNEU	0		CAMINHÃO BETONEIRA	0	
	TRATOR AGRÍCOLA	0		ROLO LISO	0		TOTAL	0	0

ITEM	DISCRIMINAÇÃO DAS ATIVIDADES
1	* NÃO HOUE EXECUÇÃO DE ATIVIDADES - SÁBADO
2	
3	
4	
5	
6	
7	
8	

ITEM	OBSERVAÇÃO
1	
2	
3	
4	
5	
6	

GALERIA DE FOTOS	

ASSINATURAS:

Cláudia Maria de Jesus Rodrigues Assessor IV  
 Daniel Aparecido Santos Lima Diretor de Obras

# TERRAMARES

3336  
Bom

## RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA

EMPRESA: <b>LOCADORA TERRAMARES LTDA</b>		DATA: <b>16/06/2021</b>
OBRA: <b>PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA E SERVIÇOS COMPLEMENTARES, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MÃO DE OBRA, NO MUNICÍPIO DE CONGONHAS-MG.</b>		DATA INICIAL: <b>02/03/2020</b>
CONTRATO: <b>PMC/078/2020</b>	RDO Nº: <b>440</b>	

DIA DA SEMANA						
2ª	3ª	4ª	5ª	6ª	SÁB	DOM
						X
EFETIVO TOTAL: 0						
PRESENTES: 0			AUSENTES: 0			

CONDIÇÕES DO TEMPO			DADOS CONTRATUAIS		
	MANHÃ	TARDE	NOITE	PRAZO CONTRATUAL:	578
BOM	X	X	X	DIAS CORRIDOS:	440
CHUVA				DIAS RESTANTES:	138
mm					

	DESCRIÇÃO	QUANT		DESCRIÇÃO	QUANT		DESCRIÇÃO	QUANT.	
		PRES.	AUSEN.		PRES.	AUSEN.		PRES.	AUSEN.
EFETIVO	ENGENHEIRO	0		OP. DE MINI ESCAVADEIRA	0		AJUDANTE	0	
	ENCARREGADO	0		OPERADOR DE ESPARGIDOR	0		MOTORISTA CAMINHÃO	0	
	OPERADOR DE PATROL	0		OPERADOR DE VIBROACABADORA	0				
	OPERADOR DE ESCAVADEIRA	0		OPERADOR ROLO PNEU	0				
	OPERADOR DE ROLO (PÉ DE CARNEIRO)	0		OPERADOR ROLO LISO	0				
	MOTORISTA CAMINHÃO PIPA	0		MOTORISTA	0				
	OPERADOR DE TRATOR AGRÍCOLA	0		PEDREIRO	0		TOTAL	0	0


	DESCRIÇÃO	QUANT		DESCRIÇÃO	QUANT		DESCRIÇÃO	QUANT.	
		PRES.	AUSEN.		PRES.	AUSEN.		PRES.	AUSEN.
EQUIPAMENTOS	PATROL	0		MINI ESCAVADEIRA	0		CAMINHÃO TRAÇADO	0	
	ESCAVADEIRA	0		CAMINHÃO ESPARGIDOR	0		CAMINHÃO TRUCADO	0	
	ROLO COMPACTADOR (PÉ DE CARNEIRO)	0		VIBROACABADORA	0		CAMINHÃO TOCO	0	
	CAMINHÃO PIPA	0		ROLO PNEU	0		CAMINHÃO BETONEIRA	0	
	TRATOR AGRÍCOLA	0		ROLO LISO	0		TOTAL	0	0

### ITEM DISCRIMINAÇÃO DAS ATIVIDADES

ITEM	DISCRIMINAÇÃO DAS ATIVIDADES
1	* NÃO HOUE EXECUÇÃO DE ATIVIDADES - DOMINGO
2	
3	
4	
5	
6	
7	
8	

ITEM	OBSERVAÇÃO
1	
2	
3	
4	
5	
6	

### GALERIA DE FOTOS



ASSINATURAS:   
 CONTRATADA: *[Signature]*   
 CONTRATANTE: *[Signature]* **Deniel Aparecido Santos Lima**   
 Diretor de Obras

*[Signature]* **Claudia Maria de Jesus Rodrigues**   
 Assessor IV

# TERRAMARES

3335  
@ano

<b>RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA</b>			DATA	17/05/2021
EMPRESA:	<b>LOCADORA TERRAMARES LTDA</b>		DATA INICIAL	02/03/2020
OBRA:	PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA E SERVIÇOS COMPLEMENTARES, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MÃO DE OBRA, NO MUNICÍPIO DE CONGONHAS-MG.	CONTRATO:	PMC/078/2020	RDO Nº: 441

DIA DA SEMANA						
2ª	3ª	4ª	5ª	6ª	SÁB	DOM
X						
EFETIVO TOTAL: 9						
PRESENTES: 9			AUSENTES: 0			

CONDIÇÕES DO TEMPO			DADOS CONTRATUAIS		
	MANHÃ	TARDE	NOITE	PRAZO CONTRATUAL:	576
BOM	X	X	X	DIAS CORRIDOS:	441
CHUVA				DIAS RESTANTES:	137
mm					

	DESCRIÇÃO	QUANT		DESCRIÇÃO	QUANT		DESCRIÇÃO	QUANT.	
		PRES.	AUSEN.		PRES.	AUSEN.		PRES.	AUSEN.
EFETIVO	ENGENHEIRO	0		OP. DE MINI ESCAVADEIRA	0		AJUDANTE	6	
	ENCARREGADO	0		OPERADOR DE ESPARGIDOR	0		MOTORISTA CAMINHÃO	0	
	OPERADOR DE PATROL	0		OPERADOR DE VIBROACABADORA	0				
	OPERADOR DE ESCAVADEIRA	0		OPERADOR ROLO PNEU	0				
	OPERADOR DE ROLO (PÉ DE CARNEIRO)	0		OPERADOR ROLO LISO	0				
	MOTORISTA CAMINHÃO PIPA	0		MOTORISTA	0				
	OPERADOR DE TRATOR AGRÍCOLA	0		PEDREIRO	3		TOTAL	9	0

	DESCRIÇÃO	QUANT		DESCRIÇÃO	QUANT		DESCRIÇÃO	QUANT.	
		PRES.	AUSEN.		PRES.	AUSEN.		PRES.	AUSEN.
EQUIPAMENTOS	PATROL	0		MINI ESCAVADEIRA	0		CAMINHÃO TRAÇADO	0	
	ESCAVADEIRA	0		CAMINHÃO ESPARGIDOR	0		CAMINHÃO TRUCADO	0	
	ROLO COMPACTADOR (PÉ DE CARNEIRO)	0		VIBROACABADORA	0		CAMINHÃO TOCO	0	
	CAMINHÃO PIPA	0		ROLO PNEU	0		CAMINHÃO BETONEIRA	0	
	TRATOR AGRÍCOLA	0		ROLO LISO	0		TOTAL	0	0

ITEM	DISCRIMINAÇÃO DAS ATIVIDADES	
1	* EXECUÇÃO DE MEIO FIO - MONJOLOS	
2	* EXECUÇÃO DE MEIO FIO - ÁGUA BOA	
3	/	
4		
5		
6		
7		
8		

ITEM	DISCRIMINAÇÃO DAS ATIVIDADES
1	Observação: a ala executada no Água Boa, devido interferência do dono do terreno abaixo, teve que ser paralisada de comum acordo com a contratante, ficando assim sem rebocar.
2	/
3	
4	
5	
6	

**GALERIA DE FOTOS**

→ SOLICITADO EM DIVERSAS VEZES DURANTE O MÊS, RESPOSTAS NO TARDIZ DAS MÚLTIPLO E ACESSO DAS MÃOS DE OBRAS / COMPANHIA.

ASSINATURAS:

*Cláudia Maria de Jesus Rodrigues*  
Assessor IV

CONTRATADA

CONTRATANTE

*Daniel Aparecido Santos Lima*  
Diretor de Obras

# TERRAMARES

3324  
Pam

## RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA

EMPRESA: <b>LOCADORA TERRAMARES LTDA</b>		DATA: <b>26/05/2021</b>
OBRA: <b>PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA E SERVIÇOS COMPLEMENTARES, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MÃO DE OBRA, NO MUNICÍPIO DE CONGONHAS-MG.</b>		DATA INICIAL: <b>02/03/2020</b>
CONTRATO: <b>PMC/078/2020</b>	RDO Nº: <b>450</b>	

DIA DA SEMANA						
2ª	3ª	4ª	5ª	6ª	SÁB	DOM
		X				
EFETIVO TOTAL: 10						
PRESENTES: 10			AUSENTES: 0			

CONDIÇÕES DO TEMPO			DADOS CONTRATUAIS		
	MANHÃ	TARDE	NOITE	PRAZO CONTRATUAL:	578
BOM	X	X	X	DIAS CORRIDOS:	450
CHUVA				DIAS RESTANTES:	128
mm					

	DESCRIÇÃO	QUANT		DESCRIÇÃO	QUANT		DESCRIÇÃO	QUANT.	
		PRES.	AUSEN.		PRES.	AUSEN.		PRES.	AUSEN.
EFETIVO	ENGENHEIRO	0		OP. DE MINI ESCAVADEIRA	0		AJUDANTE	6	
	ENCARREGADO	0		OPERADOR DE ESPARGIDOR	0		MOTORISTA CAMINHÃO	1	
	OPERADOR DE PATROL	0		OPERADOR DE VIBROACABADORA	0				
	OPERADOR DE ESCAVADEIRA	0		OPERADOR ROLO PNEU	0				
	OPERADOR DE ROLO (PÉ DE CARNEIRO)	0		OPERADOR ROLO LISO	0				
	MOTORISTA CAMINHÃO PIPA	0		MOTORISTA	0				
	OPERADOR DE TRATOR AGRÍCOLA	0		PEDREIRO	3		TOTAL	10	0



	DESCRIÇÃO	QUANT		DESCRIÇÃO	QUANT		DESCRIÇÃO	QUANT.	
		PRES.	AUSEN.		PRES.	AUSEN.		PRES.	AUSEN.
EQUIPAMENTOS	PATROL	0		MINI ESCAVADEIRA	0		CAMINHÃO TRAÇADO	0	
	ESCAVADEIRA	0		CAMINHÃO ESPARGIDOR	0		CAMINHÃO TRUCADO	0	
	ROLO COMPACTADOR (PÉ DE CARNEIRO)	0		VIBROACABADORA	0		CAMINHÃO TOCO	0	
	CAMINHÃO PIPA	0		ROLO PNEU	0		CAMINHÃO BETONEIRA	1	
	TRATOR AGRÍCOLA	0		ROLO LISO	0		TOTAL	1	0

ITEM	DISCRIMINAÇÃO DAS ATIVIDADES
1	* EXECUÇÃO DE CONCRETAGEM DE SARJETA - RUAS 13,14,15 E 30 (LEOPOLDINO BARBOSA)
2	* EXECUÇÃO DE MEIO FIO - MOJOLOS
3	* EXECUÇÃO DE CONCRETAGEM DE CONFINAMENTO DE MEIO FIO (ÁGUA BOA)
4	
5	
6	
7	
8	

ITEM	OBSERVAÇÃO
1	MONJOLOS: FORAM DEFINIDOS PELA EQUIPE TÉCNICA DA PREFEITURA, OS LOCAIS ONDE SERIAM EXECUTADOS AS DRENAGENS, COMO, MEIO FIO, SARJETA TRIANGULAR, ALAS, CAIXAS DE PASSAGEM E TRAVESSIAS. A EMPRESA FINALIZOU NA DATA DE HOJE 26/05/2021 TODAS AS SOLICITAÇÕES, SENDO AUTORIZADA A DESMOBILIZAÇÃO.
2	
3	ÁGUA BOA: FOI CORTADO DA MEDIÇÃO 11 (ÁGUA BOA) A ÁREA 9 (REGULARIZAÇÃO DE SUBLEITO, BASE E TRANSPORTE DA BASE), AO VOLTARMOS AO BAIRRO PARA A EXECUÇÃO DA ESTRADA DE LIGAÇÃO DOS BAIRROS JARDIM BELA VISTA E ÁGUA BOA, SERÁ REALIZADO O TRATAMENTO DA BASE E RECOMPOSIÇÃO DO MATERIAL PERDIDO, APÓS ISSO, ESSA ÁREA SERÁ COBRADA NAS PRÓXIMAS MEDIÇÕES.
4	
5	
6	

**GALERIA DE FOTOS**

→ ÁGUA BOA IDENTIFICAMOS CROWMIND DE SOLDS EM GRANDES QUANTIDADE, INCLUSIVE TOMOS CONJUNTA NO ORGÃO DE NUNO AMBIENTE DA PMC Nº 183/2021. LOGO, NÃO CONTABILIZAMOS SERVIÇOS DE BASE NUNTO TRUENO -

ASSINATURAS:  CONTRATADA  CONTRATANTE **Daniel Aparecido Santos Lima**  
Diretor de Obras

 Cláudia Maria de Jesus Rodrigues  
Assessor IV

# TERRAMARES

3325  
Dama

## RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA

EMPRESA: <b>LOCADORA TERRAMARES LTDA</b>		DATA: <b>27/06/2021</b>
OBRA: <b>PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA E SERVIÇOS COMPLEMENTARES, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MÃO DE OBRA, NO MUNICÍPIO DE CONGONHAS-MG.</b>		DATA INICIAL: <b>02/03/2020</b>
CONTRATO: <b>PMCA/78/2020</b>	RDO Nº: <b>451</b>	

DIA DA SEMANA						
2ª	3ª	4ª	5ª	6ª	SÁB	DOM
			X			
EFETIVO TOTAL: 4						
PRESENTES: 4			AUSENTES: 0			

CONDIÇÕES DO TEMPO			DADOS CONTRATUAIS		
	MANHÃ	TARDE	NOITE	PRAZO CONTRATUAL:	578
BOM	X	X	X	DIAS CORRIDOS:	451
CHUVA				DIAS RESTANTES:	127
mm					



EFETIVO	DESCRIÇÃO	QUANT		DESCRIÇÃO	QUANT		DESCRIÇÃO	QUANT.	
		PRES.	AUSEN.		PRES.	AUSEN.		PRES.	AUSEN.
	ENGENHEIRO	0		OP. DE MINI ESCAVADEIRA	0		AJUDANTE	2	
	ENCARREGADO	0		OPERADOR DE ESPARGIDOR	0		MOTORISTA CAMINHÃO	0	
	OPERADOR DE PATROL	0		OPERADOR DE VIBROACABADORA	0				
	OPERADOR DE ESCAVADEIRA	0		OPERADOR ROLO PNEU	0				
	OPERADOR DE ROLO (PÉ DE CARNEIRO)	0		OPERADOR ROLO LISO	0				
	MOTORISTA CAMINHÃO PIPA	0		MOTORISTA	0				
	OPERADOR DE TRATOR AGRÍCOLA	0		PEDREIRO	2		<b>TOTAL</b>	<b>4</b>	<b>0</b>

EQUIPAMENTOS	DESCRIÇÃO	QUANT		DESCRIÇÃO	QUANT		DESCRIÇÃO	QUANT.	
		PRES.	AUSEN.		PRES.	AUSEN.		PRES.	AUSEN.
	PATROL	0		MINI ESCAVADEIRA	0		CAMINHÃO TRAÇADO	0	
	ESCAVADEIRA	0		CAMINHÃO ESPARGIDOR	0		CAMINHÃO TRUCADO	0	
	ROLO COMPACTADOR (PÉ DE CARNEIRO)	0		VIBROACABADORA	0		CAMINHÃO TOCO	0	
	CAMINHÃO PIPA	0		ROLO PNEU	0		CAMINHÃO BETONEIRA	0	
	TRATOR AGRÍCOLA	0		ROLO LISO	0		<b>TOTAL</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

ITEM	DISCRIMINAÇÃO DAS ATIVIDADES
1	* EXECUÇÃO DE MEIO FIO - RUAS 13, 14, 15 E 30 - LEOPOLDINO BARBOSA
2	
3	
4	
5	
6	
7	
8	

ITEM	DISCRIMINAÇÃO DAS ATIVIDADES
1	
2	
3	
4	
5	
6	

GALERIA DE FOTOS	

ASSINATURAS:  CONTRATADA  CONTRATANTE **Daniel Aparecido Santos Lima**  
Diretor de Obras


Claudia Maria de Jesus


# TERRAMARES

3326  
Dano

RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA						DATA	28/06/2021					
EMPRESA:		LOCADORA TERRAMARES LTDA				DATA INICIAL	02/03/2020					
OBRA:	PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA E SERVIÇOS COMPLEMENTARES, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MÃO DE OBRA, NO MUNICÍPIO DE CONGONHAS-MG.			CONTRATO:	PMC/078/2020	RDO Nº:	452					
<b>DIA DA SEMANA</b>												
2ª	3ª	4ª	5ª	6ª	SÁB	DOM						
				X								
EFETIVO TOTAL: 9												
PRESENTES:		9		AUSENTES:		0						
<b>CONDIÇÕES DO TEMPO</b>												
			<b>MANHÃ</b>			<b>TARDE</b>			<b>NOITE</b>			
BOM			X			X			X			
CHUVA												
mm												
<b>DADOS CONTRATUAIS</b>												
PRAZO CONTRATUAL:						578						
DIAS CORRIDOS:						452						
DIAS RESTANTES:						126						
<b>EFETIVO</b>												
EFETIVO	DESCRIÇÃO		QUANT		DESCRIÇÃO		QUANT		DESCRIÇÃO		QUANT.	
			PRES. AUSEN.				PRES. AUSEN.				PRES. AUSEN.	
	ENGENHEIRO		0		OP. DE MINI ESCAVADEIRA		0		AJUDANTE		6	
	ENCARREGADO		0		OPERADOR DE ESPARGIDOR		0		MOTORISTA CAMINHÃO		0	
	OPERADOR DE PATROL		0		OPERADOR DE VIBROACABADORA		0					
	OPERADOR DE ESCAVADEIRA		0		OPERADOR ROLO PNEU		0					
	OPERADOR DE ROLO (PÉ DE CARNEIRO)		0		OPERADOR ROLO LISO		0					
	MOTORISTA CAMINHÃO PIPA		0		MOTORISTA		0					
OPERADOR DE TRATOR AGRÍCOLA		0		PEDREIRO		3		<b>TOTAL</b>		<b>9 0</b>		
<b>EQUIPAMENTOS</b>												
EQUIPAMENTOS	DESCRIÇÃO		QUANT		DESCRIÇÃO		QUANT		DESCRIÇÃO		QUANT.	
			PRES. AUSEN.				PRES. AUSEN.				PRES. AUSEN.	
	PATROL		0		MINI ESCAVADEIRA		0		CAMINHÃO TRAÇADO		0	
	ESCAVADEIRA		0		CAMINHÃO ESPARGIDOR		0		CAMINHÃO TRUCADO		0	
	ROLO COMPACTADOR (PÉ DE CARNEIRO)		0		VIBROACABADORA		0		CAMINHÃO TOCO		0	
	CAMINHÃO PIPA		0		ROLO PNEU		0		CAMINHÃO BETONEIRA		0	
TRATOR AGRÍCOLA		0		ROLO LISO		0		<b>TOTAL</b>		<b>0 0</b>		
<b>DISCRIMINAÇÃO DAS ATIVIDADES</b>												
PRODUÇÃO	ITEM											
	1	* EXECUÇÃO DE MEIO FIO - RUAS 13, 14, 15 E 30 (LEOPOLDINO BARBOSA)										
	2	* EXECUÇÃO DE REBOCO EM ALA - ÁGUA BOA										
	3											
	4											
	5											
	6											
	7											
8												
OBSERVAÇÃO	ITEM											
	1	OBS.: NO RDO DO DIA 17/05/2021 FOI CITADO QUE A ALA EXECUTADA NO BAIRRO ÁGUA BOA FICARIA SEM O ACABAMENTO DE REBOCO DEVIDO A INTERVENÇÕES COM MORADORES LOCAIS, PORÉM, EM COMUM ACORDO COM O DIRETOR DANIEL, FOI AUTORIZADO A FINALIZAÇÃO DA MESMA.										
	2											
	3											
	4											
	5											
6												
<b>GALERIA DE FOTOS</b>												

Cláudia Maria de Jesus Rodrigues  
Assessor IV

ASSINATURAS: 

CONTRATADA:   
CONTRATANTE: Daniel Aparecido Santos Lima  
Diretor de Obras

# TERRAMARES

3327  
*[Handwritten Signature]*

<b>RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA</b>				DATA	29/06/2021
EMPRESA:		LOCADORA TERRAMARES LTDA		DATA INICIAL	02/03/2020
OBRA:	PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA E SERVIÇOS COMPLEMENTARES, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MÃO DE OBRA, NO MUNICÍPIO DE CONGONHAS-MG.		CONTRATO:	PMC/078/2020	RDO Nº: 453

DIA DA SEMANA						
2ª	3ª	4ª	5ª	6ª	SÁB	DOM
					X	
EFETIVO TOTAL: 5						
PRESENTES: 5			AUSENTES: 0			


CONDIÇÕES DO TEMPO			DADOS CONTRATUAIS		
	MANHÃ	TARDE	NOITE	PRAZO CONTRATUAL:	578
BOM	X	X	X	DIAS CORRIDOS:	453
CHUVA				DIAS RESTANTES:	125
mm					

	DESCRIÇÃO	QUANT		DESCRIÇÃO	QUANT		DESCRIÇÃO	QUANT.	
		PRES.	AUSEN.		PRES.	AUSEN.		PRES.	AUSEN.
EFETIVO	ENGENHEIRO	0		OP. DE MINI ESCAVADEIRA	0		AJUDANTE	3	
	ENCARREGADO	0		OPERADOR DE ESPARGIDOR	0		MOTORISTA CAMINHÃO	0	
	OPERADOR DE PATROL	0		OPERADOR DE VIBROACABADORA	0				
	OPERADOR DE ESCAVADEIRA	0		OPERADOR ROLO PNEU	0				
	OPERADOR DE ROLO (PÊ DE CARNEIRO)	0		OPERADOR ROLO LISO	0				
	MOTORISTA CAMINHÃO PIPA	0		MOTORISTA	0				
	OPERADOR DE TRATOR AGRÍCOLA	0		PEDREIRO	2		<b>TOTAL</b>	<b>5</b>	<b>0</b>

	DESCRIÇÃO	QUANT		DESCRIÇÃO	QUANT		DESCRIÇÃO	QUANT.	
		PRES.	AUSEN.		PRES.	AUSEN.		PRES.	AUSEN.
EQUIPAMENTOS	PATROL	0		MINI ESCAVADEIRA	0		CAMINHÃO TRAÇADO	0	
	ESCAVADEIRA	0		CAMINHÃO ESPARGIDOR	0		CAMINHÃO TRUCADO	0	
	ROLO COMPACTADOR (PÊ DE CARNEIRO)	0		VIBROACABADORA	0		CAMINHÃO TOCO	0	
	CAMINHÃO PIPA	0		ROLO PNEU	0		CAMINHÃO BETONEIRA	0	
	TRATOR AGRÍCOLA	0		ROLO LISO	0		<b>TOTAL</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

ITEM	DISCRIMINAÇÃO DAS ATIVIDADES
1	* EXECUÇÃO DE MEIO FIO IN LOCO - ÁGUA BOA
2	
3	
4	
5	
6	
7	
8	

ITEM	
1	
2	
3	
4	
5	
6	



ASSINATURAS: \_\_\_\_\_

Cláudia Maria de Jesus Rodrigues  
 Assessor IV  
*[Handwritten Signature]*

CONTRATADA  
*[Handwritten Signature]*

CONTRATANTE  
 Daniel Aparecido Santos Lima  
 Diretor de Obras  
*[Handwritten Signature]*

# TERRAMARES

3328  
Dano

**RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA** DATA: 30/05/2021  
 EMPRESA: LOCADORA TERRAMARES LTDA DATA INICIAL: 02/03/2020  
 OBRA: PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA E SERVIÇOS COMPLEMENTARES, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MÃO DE OBRA, NO MUNICÍPIO DE CONGONHAS-MG. CONTRATO: PMC/079/2020 RDO Nº: 454

DIA DA SEMANA							
2ª	3ª	4ª	5ª	6ª	SÁB	DOM	
						X	
EFETIVO TOTAL:				0			
PRESENTES:				0			
AUSENTES:				0			


CONDIÇÕES DO TEMPO			DADOS CONTRATUAIS		
	MANHÃ	TARDE	NOITE	PRAZO CONTRATUAL:	578
BOM	X	X	X	DIAS CORRIDOS:	454
CHUVA				DIAS RESTANTES:	124
mm					

EFETIVO	DESCRIÇÃO	QUANT		DESCRIÇÃO	QUANT		DESCRIÇÃO	QUANT.	
		PRES.	AUSEN.		PRES.	AUSEN.		PRES.	AUSEN.
	ENGENHEIRO	0		OP. DE MINI ESCAVADEIRA	0		AJUDANTE	0	
	ENCARREGADO	0		OPERADOR DE ESPARGIDOR	0		MOTORISTA CAMINHÃO	0	
	OPERADOR DE PATROL	0		OPERADOR DE VIBROCABADORA	0				
	OPERADOR DE ESCAVADEIRA	0		OPERADOR ROLO PNEU	0				
	OPERADOR DE ROLO (PÉ DE CARNEIRO)	0		OPERADOR ROLO LISO	0				
	MOTORISTA CAMINHÃO PIPA	0		MOTORISTA	0				
	OPERADOR DE TRATOR AGRÍCOLA	0		PEDREIRO	0		TOTAL	0	0

EQUIPAMENTOS	DESCRIÇÃO	QUANT		DESCRIÇÃO	QUANT		DESCRIÇÃO	QUANT.	
		PRES.	AUSEN.		PRES.	AUSEN.		PRES.	AUSEN.
	PATROL	0		MINI ESCAVADEIRA	0		CAMINHÃO TRAÇADO	0	
	ESCAVADEIRA	0		CAMINHÃO ESPARGIDOR	0		CAMINHÃO TRUCADO	0	
	ROLO COMPACTADOR (PÉ DE CARNEIRO)	0		VIBROCABADORA	0		CAMINHÃO TOCO	0	
	CAMINHÃO PIPA	0		ROLO PNEU	0		CAMINHÃO BETONEIRA	0	
	TRATOR AGRÍCOLA	0		ROLO LISO	0		TOTAL	0	0

ITEM		DISCRIMINAÇÃO DAS ATIVIDADES
PRODUÇÃO	1	* NÃO HOUVE EXECUÇÃO DE ATIVIDADES - DOMINGO
	2	
	3	
	4	
	5	
	6	
	7	
	8	

ITEM		DISCRIMINAÇÃO DAS ATIVIDADES
OBSERVAÇÃO	1	
	2	
	3	
	4	
	5	
	6	



ASSINATURAS: CONTRATADA: CONTRATANTE: Daniel Aparecido Santos Lima  
 Diretor de Obras

Claudia Maria de Jesus Rodrigues  
 Assessor IV

# TERRAMARES

3329  
Dano

<b>RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA</b>		DATA	31/05/2021
EMPRESA:	LOCADORA TERRAMARES LTDA	DATA INICIAL	02/03/2020
OBRA:	PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA E SERVIÇOS COMPLEMENTARES, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MÃO DE OBRA, NO MUNICÍPIO DE CONGONHAS-MG.	CONTRATO:	PMC/078/2020 RDO Nº: 455

DIA DA SEMANA							
2ª	3ª	4ª	5ª	6ª	SÁB	DOM	
x							
EFETIVO TOTAL:						6	
PRESENTES:				8		AUSENTES:	
						0	

CONDIÇÕES DO TEMPO			DADOS CONTRATUAIS		
	MANHÃ	TARDE	NOITE	PRAZO CONTRATUAL:	578
BOM	X			DIAS CORRIDOS:	455
CHUVA		X	X	DIAS RESTANTES:	123
mm					

EFETIVO	DESCRIÇÃO	QUANT		DESCRIÇÃO	QUANT		DESCRIÇÃO	QUANT.	
		PRES.	AUSEN.		PRES.	AUSEN.		PRES.	AUSEN.
	ENGENHEIRO	0		OP. DE MINI ESCAVADEIRA	0		AJUDANTE	4	
	ENCARREGADO	0		OPERADOR DE ESPARGIDOR	0		MOTORISTA CAMINHÃO	0	
	OPERADOR DE PATROL	0		OPERADOR DE VIBROACABADORA	0				
	OPERADOR DE ESCAVADEIRA	0		OPERADOR ROLO PNEU	0				
	OPERADOR DE ROLO (PÉ DE CARNEIRO)	0		OPERADOR ROLO LISO	0				
	MOTORISTA CAMINHÃO PIPA	0		MOTORISTA	0				
	OPERADOR DE TRATOR AGRÍCOLA	0		PEDREIRO	2		TOTAL	8	0


EQUIPAMENTOS	DESCRIÇÃO	QUANT		DESCRIÇÃO	QUANT		DESCRIÇÃO	QUANT.	
		PRES.	AUSEN.		PRES.	AUSEN.		PRES.	AUSEN.
	PATROL	0		MINI ESCAVADEIRA	0		CAMINHÃO TRAÇADO	0	
	ESCAVADEIRA	0		CAMINHÃO ESPARGIDOR	0		CAMINHÃO TRUCADO	0	
	ROLO COMPACTADOR (PÉ DE CARNEIRO)	0		VIBROACABADORA	0		CAMINHÃO TOCO	0	
	CAMINHÃO PIPA	0		ROLO PNEU	0		CAMINHÃO BETONEIRA	1	
	TRATOR AGRÍCOLA	0		ROLO LISO	0		TOTAL	1	0






ITEM	DISCRIMINAÇÃO DAS ATIVIDADES
1	* EXECUÇÃO DE MEIO FIO - ÁGUA BOA
2	
3	
4	
5	
6	
7	
8	

ITEM	DISCRIMINAÇÃO DAS ATIVIDADES
1	
2	
3	
4	
5	
6	

GALERIA DE FOTOS	

ASSINATURAS:


CONTRATADA
CONTRATANTE
Daniel Aparecido Santos Lima  
Diretor de Obras

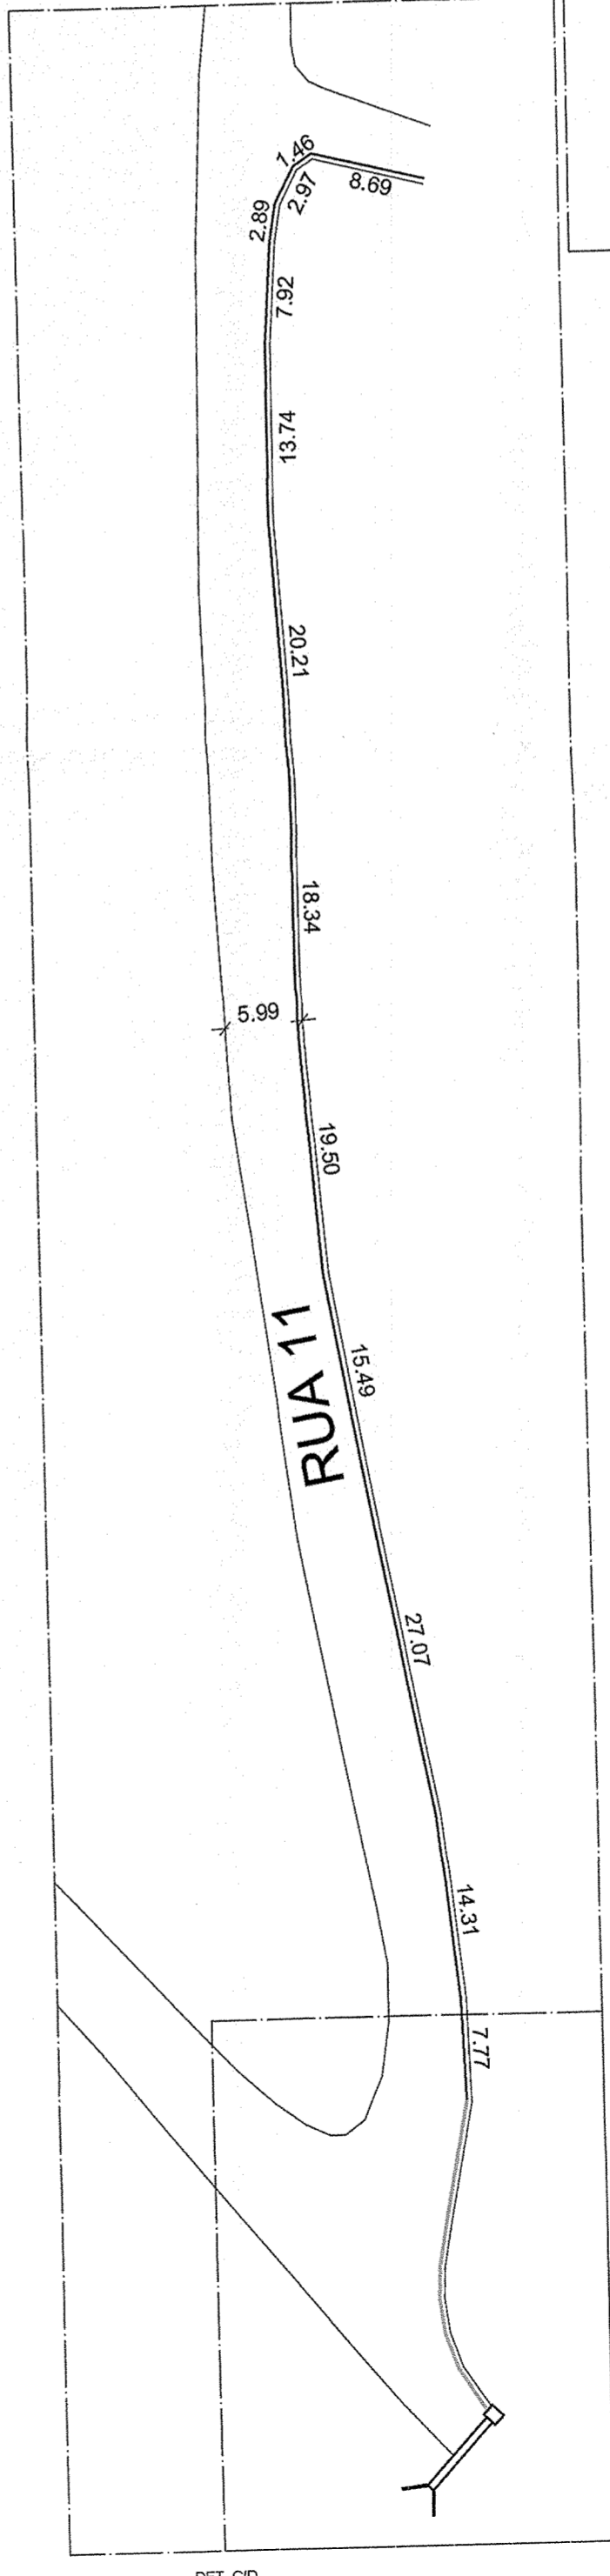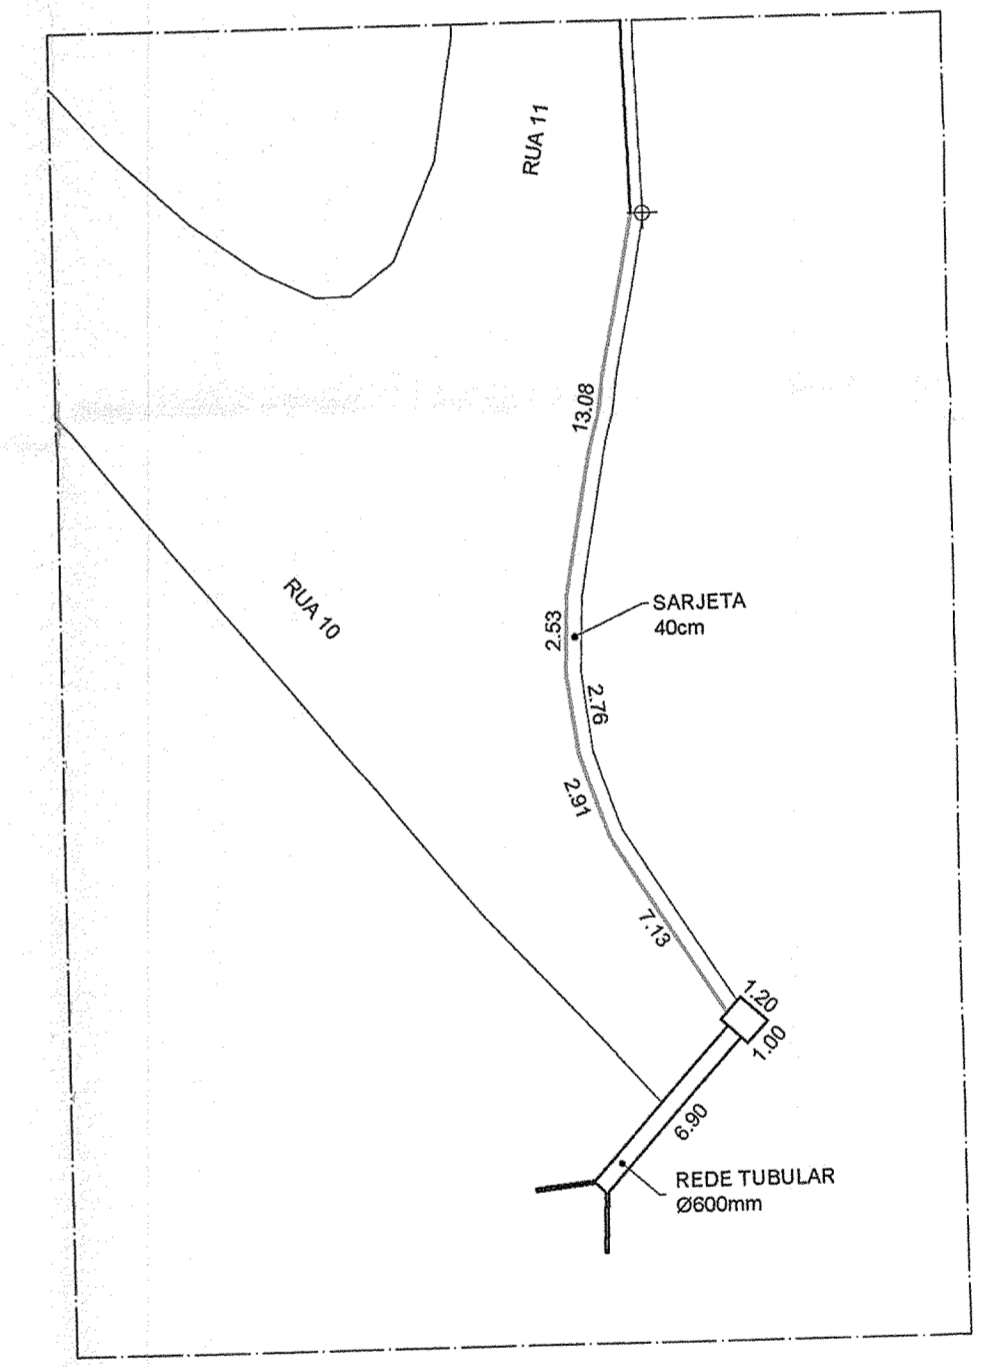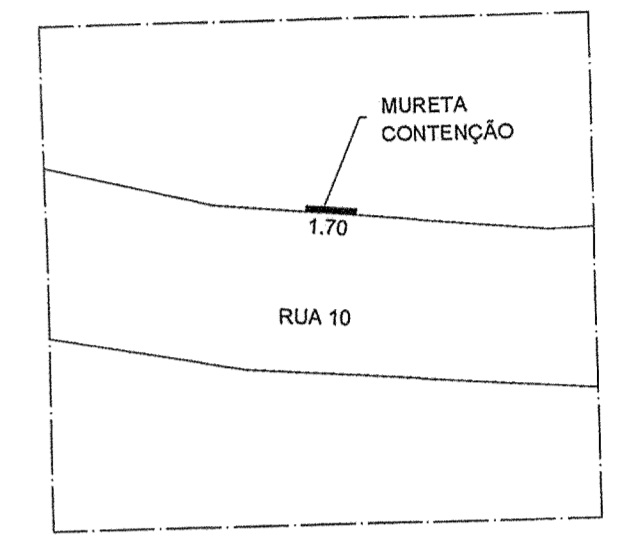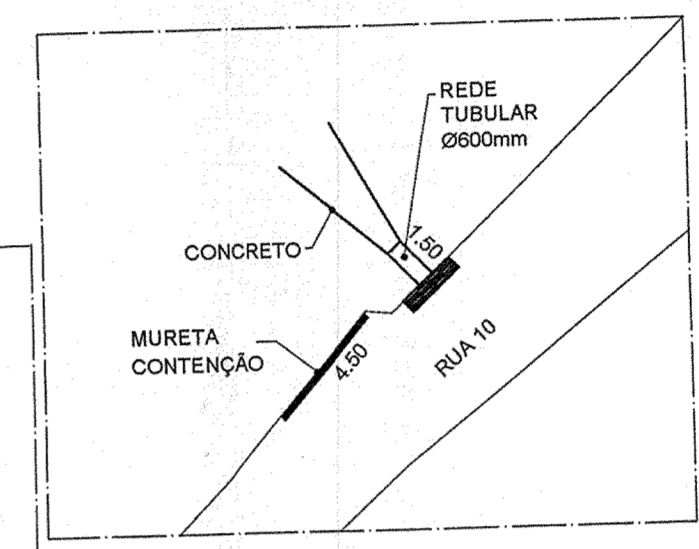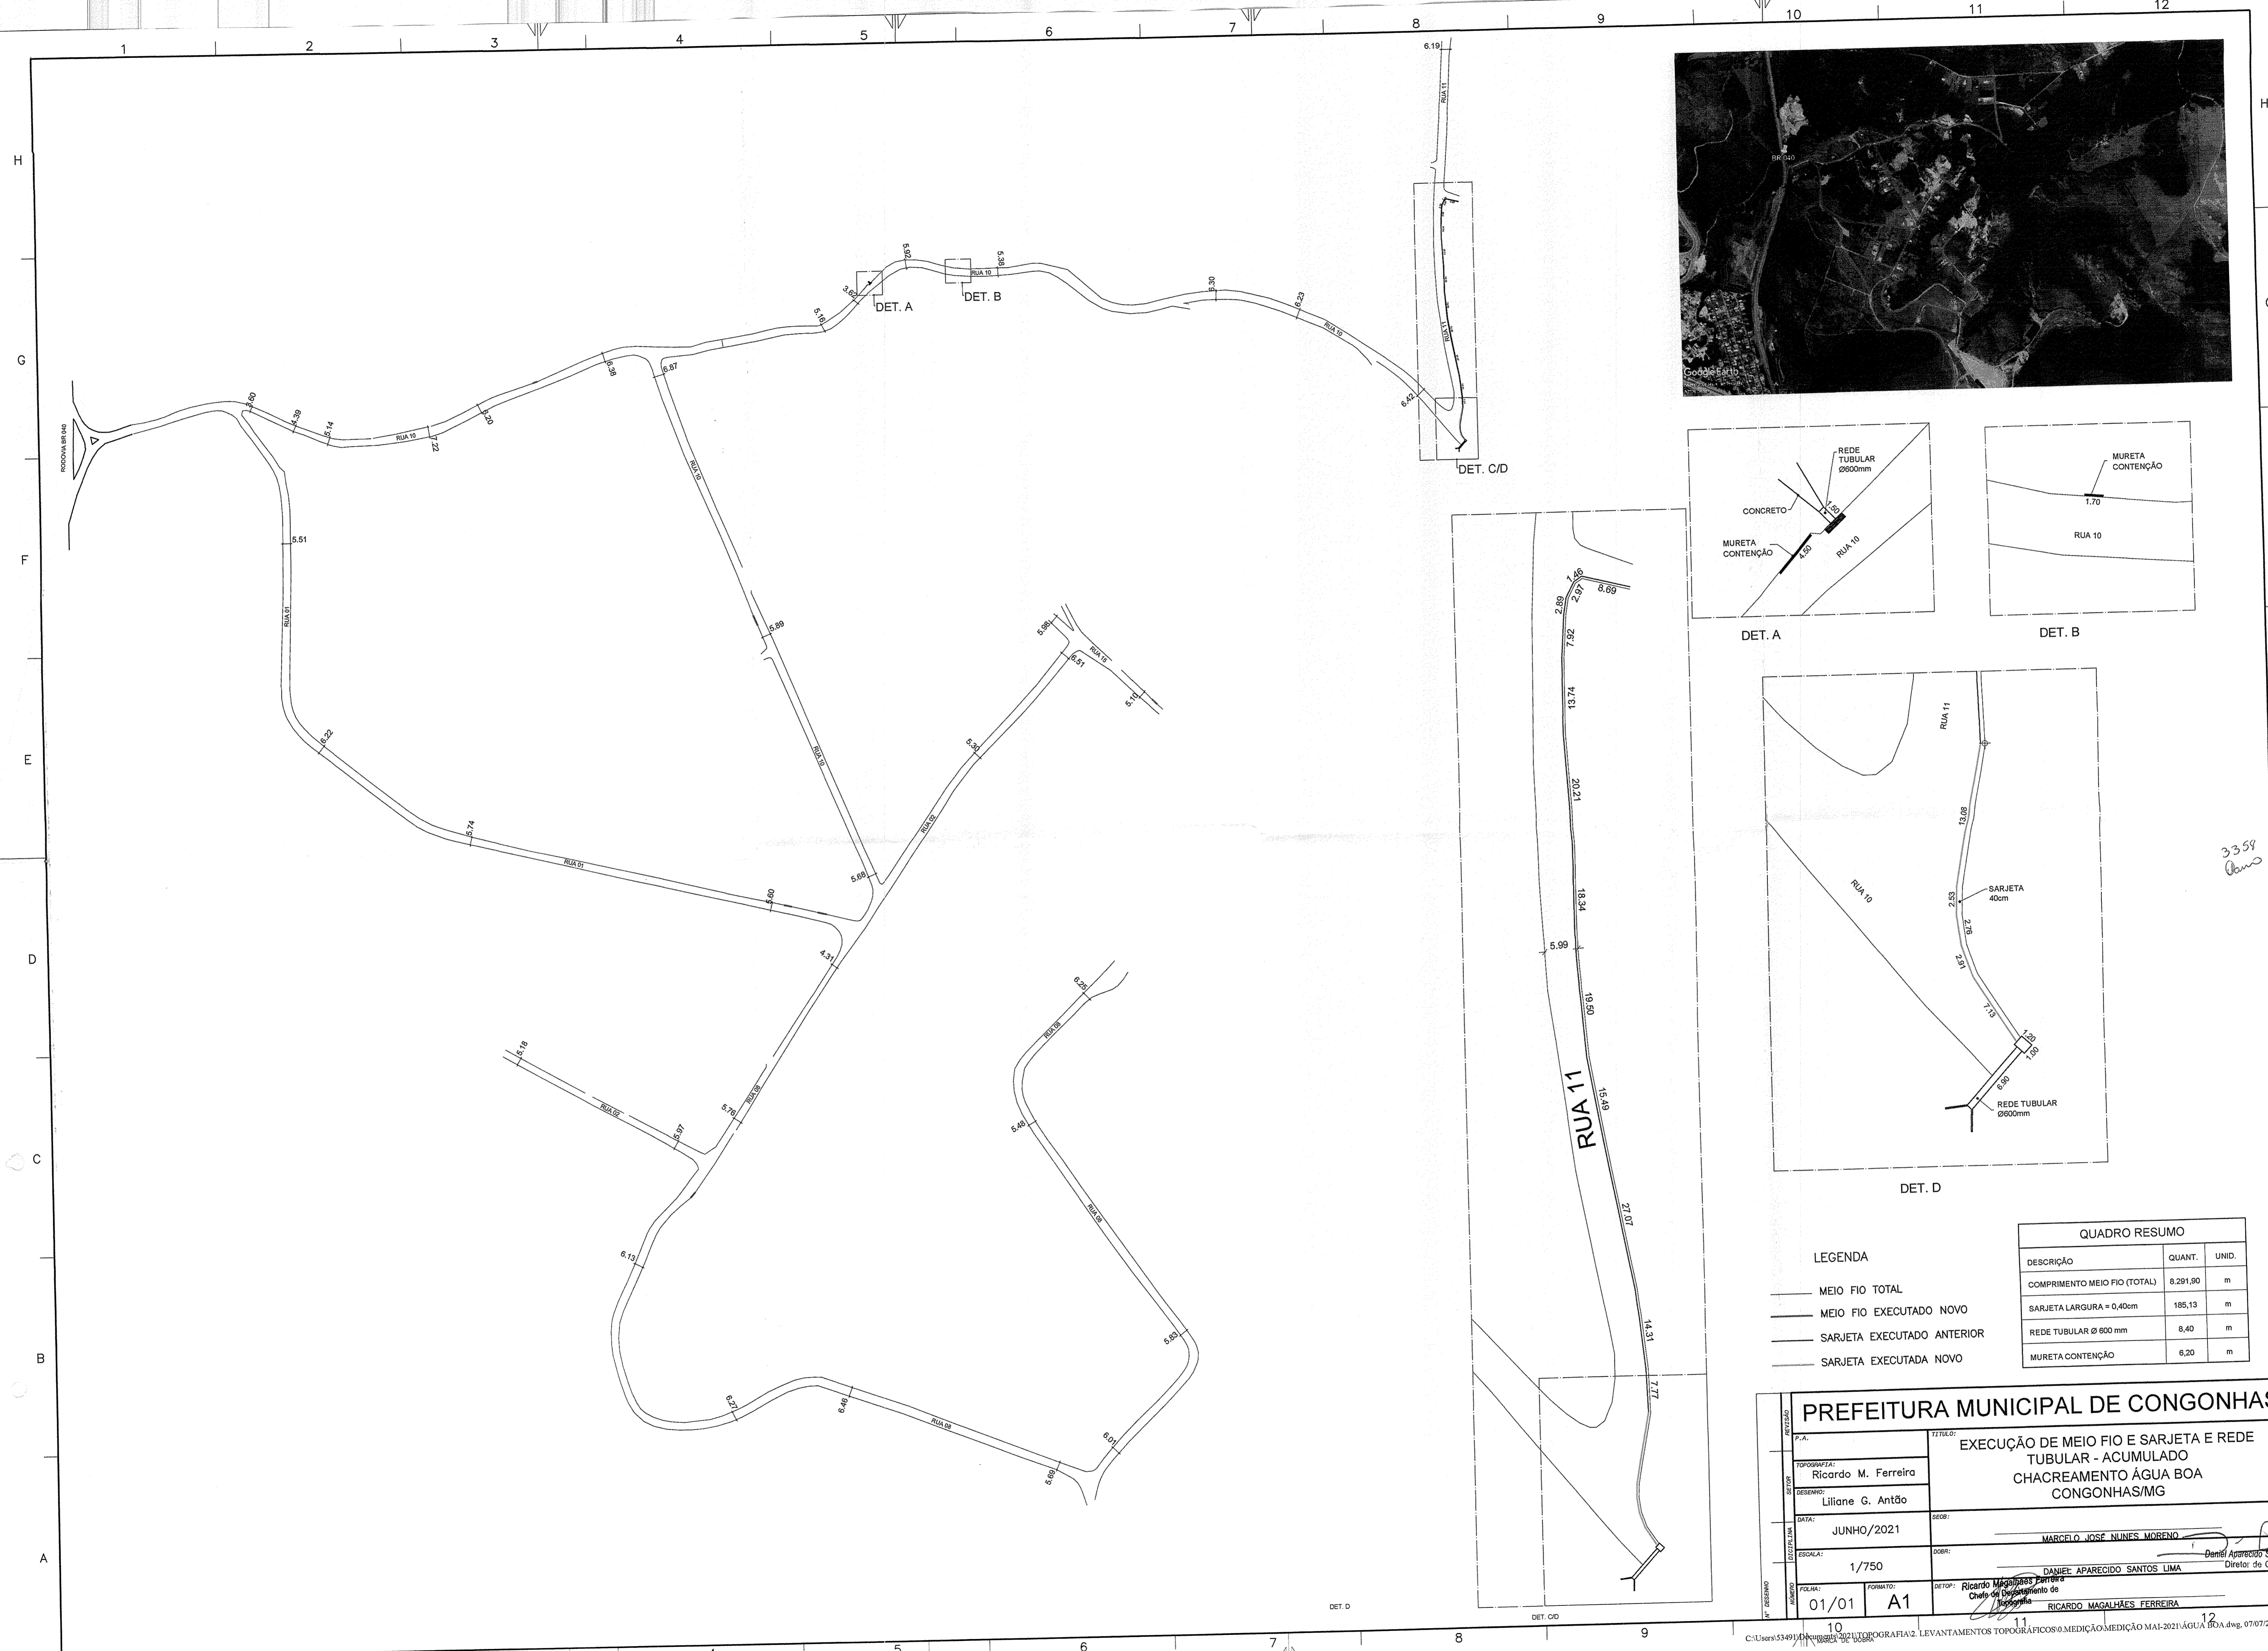

- LEGENDA**
- MEIO FIO TOTAL
  - MEIO FIO EXECUTADO NOVO
  - SARJETA EXECUTADO ANTERIOR
  - SARJETA EXECUTADA NOVO

QUADRO RESUMO		
DESCRIÇÃO	QUANT.	UNID.
COMPRIMENTO MEIO FIO (TOTAL)	8.291,90	m
SARJETA LARGURA = 0,40cm	185,13	m
REDE TUBULAR Ø 600 mm	8,40	m
MURETA CONTENÇÃO	6,20	m

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CONGONHAS**

**TÍTULO: EXECUÇÃO DE MEIO FIO E SARJETA E REDE TUBULAR - ACUMULADO CHACREAMENTO ÁGUA BOA CONGONHAS/MG**

PROJETO: P.A.	PROJETO: Ricardo M. Ferreira
DESENHO: Liliane G. Antão	DESENHO: Ricardo M. Ferreira
DATA: JUNHO/2021	DATA: JUNHO/2021
ESCALA: 1/750	ESCALA: 1/750
FECHAMENTO: 01/01	FECHAMENTO: 01/01
FORMATO: A1	FORMATO: A1

**RICARDO MAGALHÃES FERREIRA**  
Chefe de Departamento

**Daniel Aparecido Santos Lima**  
Diretor de Obras

3359  
Olavo



RELATÓRIO FOTOGRÁFICO

Contratada: LOCADORA TERRAMARES LTDA

Contrato nº: PMC/078/2020

13ª MEDIÇÃO

Data: 31/05/2021

Período: 03/05/2021 À 31/05/2021

Fiscais: Daniel Aparecido Santos Lima / Cláudia M. de Jesus Rodrigues

Objeto:

PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA E SERVIÇOS COMPLEMENTARES, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MÃO DE OBRA, NO MUNICÍPIO DE CONGONHAS-MG.

FOTOGRAFIA



ARMAÇÃO PARA CONTENÇÃO (MEIO FIO IN LOCO) - ÁGUA BOA (RUA 10)



REDE TUBULAR Ø600mm - ÁGUA BOA (RUA 11)

Hugo Seabra da Mata  
Engenheiro Civil  
Crea: 202510 - MG

Contratada

1602  
Daniel Aparecido Santos  
Diretor de Obras

Prefeitura de Congonhas - SEOB

Lima  
Cláudia Maria de Jesus Rodrigues  
Assessor IV



RELATÓRIO FOTOGRÁFICO

Contratada: LOCADORA TERRAMARES LTDA

Contrato nº: PMC/078/2020

13ª MEDIÇÃO

Data: 31/05/2021

Período: 03/05/2021 À 31/05/2021

Fiscais: Daniel Aparecido Santos Lima / Cláudia M. de Jesus Rodrigues

Objeto:

PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA E SERVIÇOS COMPLEMENTARES, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MÃO DE OBRA, NO MUNICÍPIO DE CONGONHAS-MG.

FOTOGRAFIA



REDE DE Ø600mm (próximo a ponte, BL dupla) - ÁGUA BOA (RUA 10)



EXECUÇÃO DE CONTENÇÃO EM CONCRETO (ITEM 01) - ÁGUA BOA (RUA 10)

Hugo Seabra da Mata  
Engenheiro Civil  
Crea: 202516 - MG

402  
Daniel Aparecido Santos Lima  
Diretor de Obras

Cláudia Maria de Jesus Rodrigues  
Assessor IV

Contratada

Prefeitura de Congonhas - SEOB



RELATÓRIO FOTOGRÁFICO

Contratada: **LOCADORA TERRAMARES LTDA**

Contrato nº: **PMC/078/2020**

**13ª MEDIÇÃO**

Data: **31/05/2021**

Período: **03/05/2021 À 31/05/2021**

Fiscais: **Daniel Aparecido Santos Lima / Cláudia M. de Jesus Rodrigues**

**Objeto:**

PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA E SERVIÇOS COMPLEMENTARES, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MÃO DE OBRA, NO MUNICÍPIO DE CONGONHAS-MG.

FOTOGRAFIA



EXECUÇÃO DE CONTENÇÃO EM CONCRETO (ITEM 02) - ÁGUA BOA (RUA 10)



EXECUÇÃO DE CONTENÇÃO EM CONCRETO (ITEM 04) - ÁGUA BOA (RUA 10)

*Hugo Seabra da Mata*  
Engenheiro Civil  
Crea 202510 - MG

Contratada

*Daniel Aparecido Santos Lima*

Prefeitura de Congonhas - SEOB

*Cláudia Maria de Jesus Rodrigues*  
Assessor IV



RELATÓRIO FOTOGRÁFICO

Contratada: LOCADORA TERRAMARES LTDA

Contrato nº: PMC/078/2020

13ª MEDIÇÃO

Data: 31/05/2021

Período: 03/05/2021 À 31/05/2021

Fiscais: Daniel Aparecido Santos Lima / Cláudia M. de Jesus Rodrigues

Objeto:

PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA E SERVIÇOS COMPLEMENTARES, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MÃO DE OBRA, NO MUNICÍPIO DE CONGONHAS-MG.

FOTOGRAFIA



EXECUÇÃO DE CONTENÇÃO EM CONCRETO (ITEM 03) - ÁGUA BOA (RUA 10)



EXECUÇÃO DE CONTENÇÃO EM CONCRETO (ITEM 03) - ÁGUA BOA (RUA 10)

Hugo Seabra da Mata  
Engenheiro Civil  
Crea. 207510 - MG

Contratada

1407

Prefeitura de Congonhas - SEOB

Daniel Aparecido Santos Lima  
Diretor de Obras

Cláudia Maria de Jesus Rodrigues  
Assessor IV



RELATÓRIO FOTOGRÁFICO

Contratada: LOCADORA TERRAMARES LTDA

Contrato nº: PMC/078/2020

13ª MEDIÇÃO

Data: 31/05/2021

Período: 03/05/2021 À 31/05/2021

Fiscais: Daniel Aparecido Santos Lima / Cláudia M. de Jesus Rodrigues

Objeto:

PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA E SERVIÇOS COMPLEMENTARES, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MÃO DE OBRA, NO MUNICÍPIO DE CONGONHAS-MG.

FOTOGRAFIA



CONCRETO PARA CONTENÇÃO DE MEIO FIO - ÁGUA BOA (RUA 10)



CONCRETO PARA CONTENÇÃO DE MEIO FIO - ÁGUA BOA (RUA 10)

*Hugo Scabra da Mata*  
Engenheiro Civil  
Crea: 202510 - MG

Contratada

*Daniel Aparecido Santos Lima*  
Diretor de Obras  
162

Prefeitura de Congonhas - SEOB

*Cláudia Maria de Jesus Rodrigues*  
Assessor IV



RELATÓRIO FOTOGRÁFICO

Contratada: **LOCADORA TERRAMARES LTDA**

Contrato nº: PMC/078/2020

13ª MEDIÇÃO

Data: 31/05/2021

Período: 03/05/2021 À 31/05/2021

Fiscais: Daniel Aparecido Santos Lima / Cláudia M. de Jesus Rodrigues


**Objeto:**

PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA E SERVIÇOS COMPLEMENTARES, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MÃO DE OBRA, NO MUNICÍPIO DE CONGONHAS-MG.

FOTOGRAFIA



SAÍDA D'ÁGUA EM BOCA DE MANILHA EM CONCRETO - ÁGUA BOA (RUA 10)

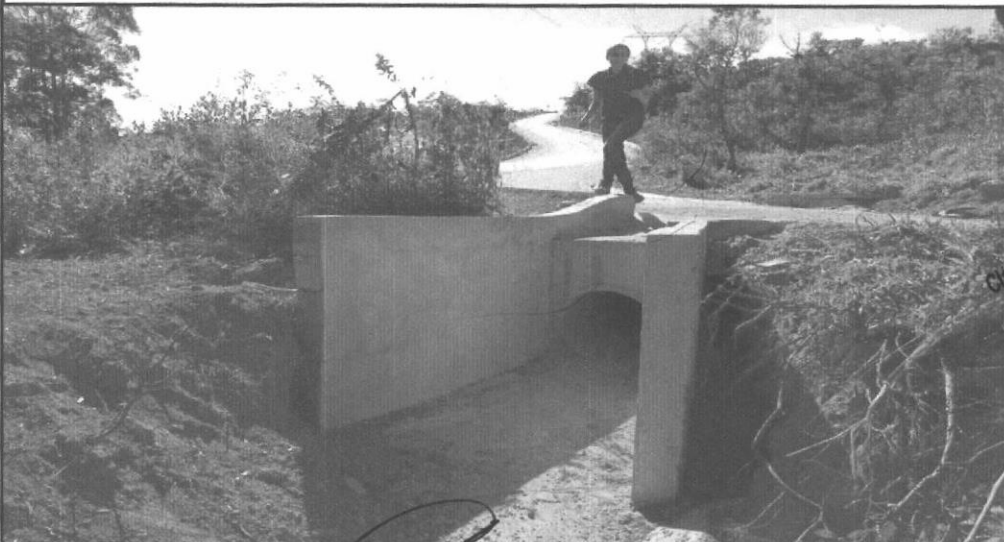

ALA PARA REDE TUBULAR - ÁGUA BOA (RUA 11)

*Kugo Seabra da Mota*  
Engenheiro Civil  
Crea 202510 - MG

Contratada

*Daniel Aparecido Santos Lima*  
Diretor de Obras  
16/05

Prefeitura de Congonhas - SEOB

*Cláudia Maria de Jesus Rodrigues*  
Assessor IV

Santos Lima  
Obras



3367  
Dano

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO

Contratada: **LOCADORA TERRAMARES LTDA**

Contrato nº: **PMC/078/2020**

**13ª MEDIÇÃO**

Data: **31/05/2021**

Período: **03/05/2021 À 31/05/2021**

Fiscais: **Daniel Aparecido Santos Lima / Cláudia M. de Jesus Rodrigues**

**Objeto:**

PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA E SERVIÇOS COMPLEMENTARES, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MÃO DE OBRA, NO MUNICÍPIO DE CONGONHAS-MG.

FOTOGRAFIA



EXECUÇÃO DE SARJETA TRIANGULAR - ÁGUA BOA (RUA 11 - SUBINDO LD)



EXECUÇÃO DE BOCA DE LOBO DUPLA - ÁGUA BOA (RUA 10 - PRÓXIMO A PONTE)

*Hugo Seabra da Mata*  
Engenheiro Civil  
Crea: 202510 - MG

Contratada

*Daniel Aparecido Santos Lima*  
Diretor de Obras  
Prefeitura de Congonhas - SEOB

*Cláudia Maria de Jesus Rodrigues*  
Assessor IV



PREFEITURA DE CONGONHAS  
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS

GRUPO  
TERRAMARES

3368  
Dano

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO

Contratada: **LOCADORA TERRAMARES LTDA**

Contrato nº: **PMC/078/2020**

**13ª MEDIÇÃO**

Data: **31/05/2021**

Período: **03/05/2021 À 31/05/2021**

Fiscais: **Daniel Aparecido Santos Lima / Cláudia M. de Jesus Rodrigues**

**Objeto:**

PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA E SERVIÇOS COMPLEMENTARES, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MÃO DE OBRA, NO MUNICÍPIO DE CONGONHAS-MG.

FOTOGRAFIA



EXECUÇÃO / ASSENTAMENTO DE MEIO FIO COM CONFINAMENTO EM CONCRETO - ÁGUA BOA (RUA 6)



EXECUÇÃO / ASSENTAMENTO DE MEIO FIO COM CONFINAMENTO EM CONCRETO - ÁGUA BOA (RUA 2)

*Hugo Seabra da Mata*  
Engenheiro Civil  
Crea: 202510 - MG

Contratada

*Daniel Aparecido Santos Lima*  
Diretor de Obras  
Prefeitura de Congonhas - SEOB

*Cláudia Maria de Jesus Rodrigues*  
Assessor IV



PREFEITURA DE CONGONHAS  
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS

GRUPO  
TERRAMARES

3369  
Dan

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO

Contratada: **LOCADORA TERRAMARES LTDA**

Contrato nº: **PMC/078/2020**

**13ª MEDIÇÃO**

Data: **31/05/2021**

Período: **03/05/2021 À 31/05/2021**

Fiscais: **Daniel Aparecido Santos Lima / Cláudia M. de Jesus Rodrigues**

**Objeto:**

PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA E SERVIÇOS COMPLEMENTARES, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MÃO DE OBRA, NO MUNICÍPIO DE CONGONHAS-MG.

FOTOGRAFIA



EXECUÇÃO / ASSENTAMENTO DE MEIO FIO COM CONFINAMENTO EM CONCRETO - ÁGUA BOA (RUA 8)



EXECUÇÃO / ASSENTAMENTO DE MEIO FIO COM CONFINAMENTO EM CONCRETO - ÁGUA BOA (RUA 8)

Hugo Seabra da Mata  
Engenheiro Civil  
Creg 202510 - MG

Contratada

Daniel Aparecido Santos Lima  
Diretor de Obras

Prefeitura de Congonhas - SEOB

Cláudia Maria de Jesus Rodrigues  
Assessor IV



RELATÓRIO FOTOGRÁFICO

Contratada: **LOCADORA TERRAMARES LTDA**

Contrato nº: PMC/078/2020

13ª MEDIÇÃO

Data: 31/05/2021

Período: 03/05/2021 À 31/05/2021

Fiscais: Daniel Aparecido Santos Lima / Cláudia M. de Jesus Rodrigues

**Objeto:**

PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA E SERVIÇOS COMPLEMENTARES, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MÃO DE OBRA, NO MUNICÍPIO DE CONGONHAS-MG.

FOTOGRAFIA



EXECUÇÃO / ASSENTAMENTO DE MEIO FIO COM CONFINAMENTO EM CONCRETO - ÁGUA BOA (RUA 1)



EXECUÇÃO / ASSENTAMENTO DE MEIO FIO COM CONFINAMENTO EM CONCRETO - ÁGUA BOA (RUA 10 - ENTRADA)

Hugo Seabra de Almeida  
Engenheiro Civil  
Crea: 202510 - 2/MG

Contratada

Prefeitura de Congonhas - SEOB

Daniel Aparecido Santos Lima  
Diretor de Obras  
Cláudia Maria de Jesus Rodrigues  
Assessor IV



PREFEITURA DE CONGONHAS  
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS

GRUPO  
TERRAMARES

3371  
*[Handwritten signature]*

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO

Contratada: **LOCADORA TERRAMARES LTDA**

Contrato nº: PMC/078/2020

13ª MEDIÇÃO

Data: 31/05/2021


Período: 03/05/2021 À 31/05/2021

Fiscais: Daniel Aparecido Santos Lima / Cláudia M. de Jesus Rodrigues

**Objeto:**

PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA E SERVIÇOS COMPLEMENTARES, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MÃO DE OBRA, NO MUNICÍPIO DE CONGONHAS-MG.

FOTOGRAFIA

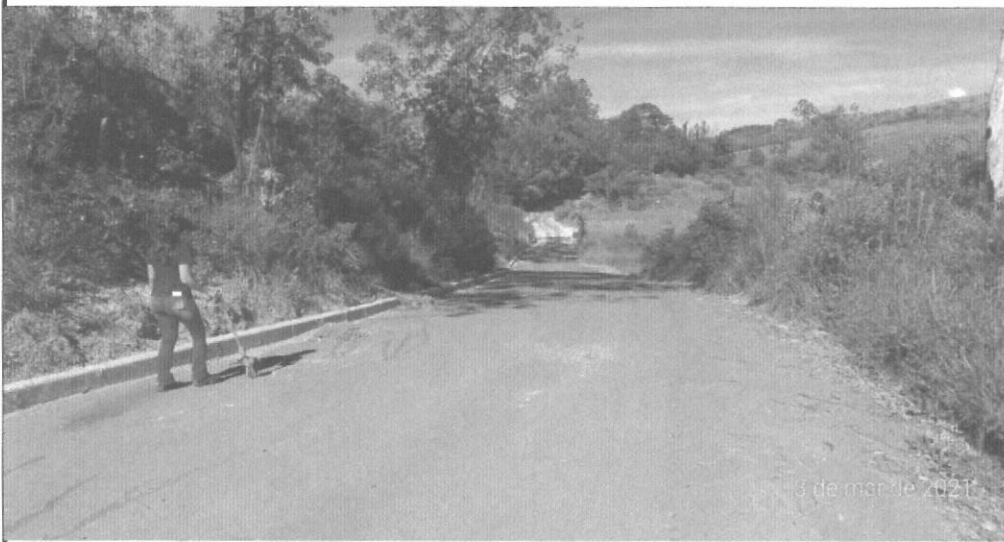

EXECUÇÃO / ASSENTAMENTO DE MEIO FIO COM CONFINAMENTO EM CONCRETO - ÁGUA BOA (RUA 10 - ENTRADA)



EXECUÇÃO / ASSENTAMENTO DE MEIO FIO COM CONFINAMENTO EM CONCRETO - ÁGUA BOA (RUA 10 - ENTRADA)

*Hugo Seabra da Matta*  
Engenheiro Civil  
Crea: 202510 - MG

Contratada

*[Handwritten signature]*  
Daniel Aparecido Santos Lima  
Diretor de Obras  
Prefeitura de Congonhas - SEOB

*Cláudia Maria de Jesus Rodrigues*  
Assessor IV



PREFEITURA DE CONGONHAS  
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS

GRUPO  
TERRAMARES

3392  
Dano

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO

Contratada: **LOCADORA TERRAMARES LTDA**

Contrato nº: PMC/078/2020

13ª MEDIÇÃO

Data: 31/05/2021

Período: 03/05/2021 À 31/05/2021

Fiscais: Daniel Aparecido Santos Lima / Cláudia M. de Jesus Rodrigues

**Objeto:**

PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA E SERVIÇOS COMPLEMENTARES, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MÃO DE OBRA, NO MUNICÍPIO DE CONGONHAS-MG.

FOTOGRAFIA



EXECUÇÃO / ASSENTAMENTO DE MEIO FIO COM CONFINAMENTO EM CONCRETO - ÁGUA BOA (RUA 8)



EXECUÇÃO / ASSENTAMENTO DE MEIO FIO COM CONFINAMENTO EM CONCRETO - ÁGUA BOA (RUA 8)

Hugo Seabra da Mata  
Engenheiro Civil  
Crea: 20250/MG

Contratada

Daniel Aparecido Santos Lima  
Diretor de Obras

Prefeitura de Congonhas - SEOB

Cláudia Maria de Jesus Rodrigues  
Assessor IV



RELATÓRIO FOTOGRÁFICO

Contratada: LOCADORA TERRAMARES LTDA

Contrato nº: PMC/078/2020

13ª MEDIÇÃO

Data: 31/05/2021

Período: 03/05/2021 À 31/05/2021

Fiscais: Daniel Aparecido Santos Lima / Cláudia M. de Jesus Rodrigues

Objeto:

PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA E SERVIÇOS COMPLEMENTARES, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MÃO DE OBRA, NO MUNICÍPIO DE CONGONHAS-MG.

FOTOGRAFIA



EXECUÇÃO / ASSENTAMENTO DE MEIO FIO COM CONFINAMENTO EM CONCRETO - ÁGUA BOA (RUA 01)



EXECUÇÃO / ASSENTAMENTO DE MEIO FIO COM CONFINAMENTO EM CONCRETO - ÁGUA BOA (RUA 01)

Hugo Seabra  
Licenciado em Engenharia Civil  
C.R.O. 202510 - MG

Contratada

Daniel Aparecido Santos Lima  
Diretor de Obras

Prefeitura de Congonhas - SEOB

Cláudia Maria de Jesus Rodrigues  
Assessor IV



3374  
@ano

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO

Contratada: **LOCADORA TERRAMARES LTDA**

Contrato nº: PMC/078/2020

**13ª MEDIÇÃO**

Data: 31/05/2021

Período: 03/05/2021 À 31/05/2021

Fiscais: Daniel Aparecido Santos Lima / Cláudia M. de Jesus Rodrigues

**Objeto:**

PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA E SERVIÇOS COMPLEMENTARES, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MÃO DE OBRA, NO MUNICÍPIO DE CONGONHAS-MG.

FOTOGRAFIA



EXECUÇÃO / ASSENTAMENTO DE MEIO FIO COM CONFINAMENTO EM CONCRETO - ÁGUA BOA (RUA 08)



EXECUÇÃO / ASSENTAMENTO DE MEIO FIO COM CONFINAMENTO EM CONCRETO - ÁGUA BOA (RUA 08)

Hugo Seabra da Silva  
Engenheiro Civil  
Crea: 202710 - MG

Contratada

Daniel Aparecido Santos Lima  
Diretor de Obras

Prefeitura de Congonhas - SEOB

Cláudia Maria de Jesus Rodrigues  
Assessor IV



RELATÓRIO FOTOGRÁFICO

Contratada: **LOCADORA TERRAMARES LTDA**

Contrato nº: PMC/078/2020

13ª MEDIÇÃO

Data: 31/05/2021


Período: 03/05/2021 À 31/05/2021

Fiscais: Daniel Aparecido Santos Lima / Cláudia M. de Jesus Rodrigues

Objeto:

PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA E SERVIÇOS COMPLEMENTARES, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MÃO DE OBRA, NO MUNICÍPIO DE CONGONHAS-MG.

FOTOGRAFIA

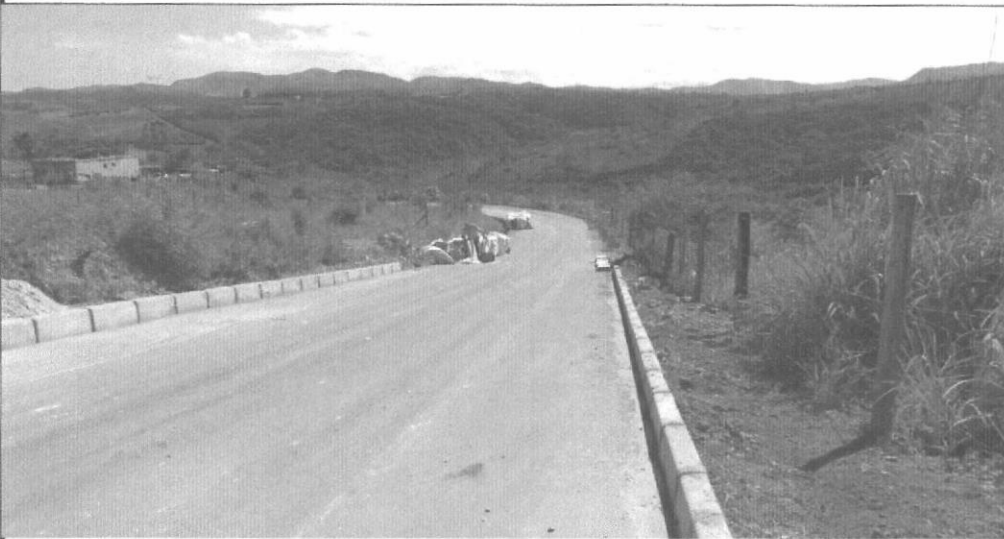

EXECUÇÃO / ASSENTAMENTO DE MEIO FIO COM CONFINAMENTO EM CONCRETO - ÁGUA BOA (RUA 08)



EXECUÇÃO / ASSENTAMENTO DE MEIO FIO COM CONFINAMENTO EM CONCRETO - ÁGUA BOA (RUA 08)

Hugo Sabrosa da Mota  
Engenheiro Civil  
Crea: 202510 - MG

Contratada

Prefeitura de Congonhas - SEOB

Daniel Aparecido Santos Lima  
Diretor de Obras

Cláudia Maria de Jesus Rodrigues  
Assessor IV

# TERRAMARES

3424  
Dano

## RELATÓRIO GERAL DE OBRA

EMPRESA:		LOCADORA TERRAMARES LTDA		DATA:	01/06/2021
OBRA:		PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA E SERVIÇOS COMPLEMENTARES, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MÃO DE OBRA, NO MUNICÍPIO DE CONGONHAS-MG.		DATA INICIAL:	02/03/2020
		CONTRATO:	PMG878/2020	RDO Nº:	456

DIA DA SEMANA						
2ª	3ª	4ª	5ª	6ª	SAB	DOM
	X					
EFETIVO TOTAL:				4		
PRESENTES:		4		AUSENTES:		0

CONDIÇÕES DO TEMPO			DADOS CONTRATUAIS		
	MANHÃ	TARDE	NOITE	PRazo CONTRATUAL:	575
SOM	X	X	X	DIAS CORRIDOS:	485
CHUVA				DIAS REstantES:	122
OUT					

EFETIVO	DESCRIÇÃO	QUANT		DESCRIÇÃO	QUANT		DESCRIÇÃO	QUANT	
		PRESE.	AUSEN.		PRESE.	AUSEN.		PRESE.	AUSEN.
	ENGENHEIRO	0		OP. DE MÃO ESCAVADORA	0		AJUDANTE	2	
	ENCARREGADO	0		OPERADOR DE ESCAVADOR	0				
	OPERADOR DE PATROL	0		OPERADOR DE VERIFICADORA	0				
	OPERADOR DE ESCAVADORA	0		OPERADOR ROLO PNEU	0				
	OPERADOR DE ROLO (PÉ DE CARNEIRO)	0		OPERADOR ROLO LISO	0				
	MOTORISTA CAMINHÃO PIPA	0		MOTORISTA	0				
	OPERADOR DE TRATOR AGRÍCOLA	0		FEDEIRO	2		TOTAL	4	0

EQUIPAMENTOS	DESCRIÇÃO	QUANT		DESCRIÇÃO	QUANT		DESCRIÇÃO	QUANT	
		PRESE.	AUSEN.		PRESE.	AUSEN.		PRESE.	AUSEN.
	PATROL	0		MÃO ESCAVADORA	0		CAMINHÃO TRUSADO	0	
	ESCAVADORA	0		CAMINHÃO ESPALHADOR	0		CAMINHÃO TRUSADO	0	
	ROLO COMPACTADOR (PÉ DE CARNEIRO)	0		VERIFICADORA	0		CAMINHÃO TOCO	0	
	CAMINHÃO PIPA	0		ROLO PNEU	0		CARRETAS	0	
	TRATOR AGRÍCOLA	0		ROLO LISO	0		TOTAL	0	0

ITEM	DISCRIMINAÇÃO DAS ATIVIDADES
1	* EXECUÇÃO DE MEIO FIO - ÁGUA BOA
2	
3	
4	
5	
6	
7	
8	

ITEM	OBSERVAÇÃO
1	
2	
3	
4	
5	
6	

GALERIA DE FOTOS	

ASSINATURAS:

Hugo Sebastião Mata  
Engenheiro Civil  
CRO 10000-5/MG

Daniel Aparecido Santos Lima  
CONTRATANTE Diretor de Obras

# TERRAMARES

3435  
Okano

## RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA

EMPRESA: <b>LOCADORA TERRAMARES LTDA</b>		DATA: <b>02/06/2021</b>
OBRA: <b>PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA E SERVIÇOS COMPLEMENTARES, COM FORNECIMENTO DE MATERIAS E MÃO DE OBRA, NO MUNICÍPIO DE GONGONHAS-MG.</b>		DATA INICIAL: <b>02/03/2020</b>
CONTRATO: <b>PMC/678/2020</b>	PROJ Nº: <b>457</b>	

DIA DA SEMANA						
2ª	3ª	4ª	5ª	6ª	SÁB	DOM
		X				
EFETIVO TOTAL: <b>9</b>						
PRESENTES: <b>9</b>			AUSENTES: <b>0</b>			

CONDIÇÕES DO TEMPO			DADOS CONTRATUAIS	
MANHÃ	TARDE	NOITE	PRAZO CONTRATUAL:	678
X	X	X	DIAS CORRIDOS:	487
			DIAS RESTANTES:	121

EFETIVO	DESCRIÇÃO	QUANT.		DESCRIÇÃO	QUANT.		DESCRIÇÃO	QUANT.	
		PRESENTE	AUSENTE		PRESENTE	AUSENTE		PRESENTE	AUSENTE
	ENGENHEIRO	0		OP. DE MEIO FIO/BOIA	0		AJUDANTE	0	
	ENCARREGADO	0		OPERADOR DE BARRAGEM	0				
	OPERADOR DE PATROL	0		OPERADOR DE VIBROCAMBODORA	0				
	OPERADOR DE ESCAVADEIRA	0		OPERADOR DE ROLLO	0				
	OPERADOR DE ROLLO (PÉ DE CARNEIRO)	0		OPERADOR ROLLO LISO	0				
	MOTORISTA CAMINHÃO PIPA	0		MOTORISTA	0				
	OPERADOR DE TRATOR AGRÍCOLA	0		PIEDREIRO	3		TOTAL	0	0


EQUIPAMENTOS	DESCRIÇÃO	QUANT.		DESCRIÇÃO	QUANT.		DESCRIÇÃO	QUANT.	
		PRESENTE	AUSENTE		PRESENTE	AUSENTE		PRESENTE	AUSENTE
	PATROL	0		MEIO ESCAVADEIRA	0		CAMINHÃO TRACADO	0	
	ESCAVADEIRA	0		CAMINHÃO ESPALHADOR	0		CAMINHÃO TRUCADO	0	
	ROLO COMPACTADOR (PÉ DE CARNEIRO)	0		VIBROCAMBODORA	0		CAMINHÃO TOCO	0	
	CAMINHÃO PIPA	0		ROLO PNEU	0		GARFETAS	0	
	TRATOR AGRÍCOLA	0		ROLO LISO	0		TOTAL	0	0

ITEM	DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES
1	* EXECUÇÃO DE MEIO FIO IN LOCO - ÁGUA BOA
2	* EXECUÇÃO DE CONFINAMENTO DE MEIO FIO - ÁGUA BOA
3	* EXECUÇÃO DE ASSENTAMENTO DE MEIO FIO - ÁGUA BOA
4	
5	
6	
7	
8	

ITEM	DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES
1	
2	
3	
4	
5	
6	

### GALERIA DE FOTOS



ASSINATURAS:

*Hugo...*  
Engenheiro Civil  
C.R. 202310 - MG

*Daniel...*  
CONTRATANTE  
Diretor de Obras

# TERRAMARES

3426  
Cano

## RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA

EMPRESA: LOGADORA TERRAMARES LTDA		DATA: 03/06/2021
OBRA: PAVIMENTAÇÃO ASPALTICA E SERVIÇOS COMPLEMENTARES, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MÃO DE OBRA, NO MUNICÍPIO DE CONGONHAS-MG.		DATA INICIAL: 02/03/2020
CONTRATO:	PROPOSTA Nº:	Nº Nº: 458

DIA DA SEMANA						
2ª	3ª	4ª	5ª	6ª	SÁB	DOM
			X			
EFETIVO TOTAL: 9						
PRESENTES: 9			AUSENTES: 0			

CONDICIONAMENTO DE TEMPO			DADOS CONTRATUAIS	
MANHÃ	TARDE	NOITE	PRazo CONTRATUAL:	678
X	X	X	DIAS CORRIDOS:	458
			DIAS RESTANTES:	120

EFETIVO	DESCRIÇÃO	QUNT.		DESCRIÇÃO	QUNT.		DESCRIÇÃO	QUNT.	
		PRESE.	AUSEN.		PRESE.	AUSEN.		PRESE.	AUSEN.
	ENGENHEIRO	0		OP. DE BOM. ESCAVADORA	0		AJUDANTE	0	
	ENCARREGADO	0		OPERADOR DE BOMBEADOR	0				
	OPERADOR DE PATROL	0		OPERADOR DE BOMBEADORA	0				
	OPERADOR DE ESCAVADORA	0		OPERADOR ROLO PNEU	0				
	OPERADOR DE ROLO (PÉ DE CARNEIRO)	0		OPERADOR ROLO LISO	0				
	MOTORISTA CAMINHÃO PIPA	0		MOTORISTA	0				
	OPERADOR DE TRATOR AGRÍCOLA	0		FEDEIRO	0		TOTAL	0	0

EQUIPAMENTOS	DESCRIÇÃO	QUNT.		DESCRIÇÃO	QUNT.		DESCRIÇÃO	QUNT.	
		PRESE.	AUSEN.		PRESE.	AUSEN.		PRESE.	AUSEN.
	PATROL	0		SEM ESCAVADORA	0		CAMINHÃO TRUÇADO	0	
	ESCAVADORA	0		CAMINHÃO BOMBEADOR	0		CAMINHÃO TRUÇADO	0	
	ROLO COMPACTADOR (PÉ DE CARNEIRO)	0		COMPACTADORA	0		CAMINHÃO TOCO	0	
	CAMINHÃO PIPA	0		ROLO PNEU	0		CARNETAS	0	
	TRATOR AGRÍCOLA	0		ROLO LISO	0		TOTAL	0	0

ITEM	DISCRIMINAÇÃO DAS ATIVIDADES
1	* EXECUÇÃO DE MEIO FIO - RUAS 13, 14 E 15 (LEOPOLDINO BARBOSA)
2	
3	
4	
5	
6	
7	
8	

ITEM	DISCRIMINAÇÃO DAS ATIVIDADES
1	
2	
3	
4	
5	
6	

GALERIA DE FOTOS	

ASSINATURAS:

Hugo Seabra da Matta  
 Engenheiro Civil  
 Crea: 202516 - MG  
 CONTRATADA

Daniel Aparecido Santos Lima  
 Diretor de Obras  
 CONTRATANTE

# TERRAMARES

3427  
Dama

## RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA

EMPRESA: <b>LOCADORA TERRAMARES LTDA</b>		DATA: <b>04/06/2021</b>
OBRA: <b>PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA E SERVIÇOS COMPLEMENTARES, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MÃO DE OBRA, NO MUNICÍPIO DE CONGONHAS-MG.</b>		DATA INICIAL: <b>02/03/2020</b>
CONTRATO: <b>PMC/078/2020</b>	RDO Nº: <b>459</b>	

DIA DA SEMANA						
2ª	3ª	4ª	5ª	6ª	SÁB	DOM
				X		
EFETIVO TOTAL: <b>13</b>						
PRESENTES: <b>13</b>			AUSENTES: <b>0</b>			


CONDIÇÕES DO TEMPO			DADOS CONTRATUAIS		
	MANHÃ	TARDE	NOITE	PRAZO CONTRATUAL:	578
BOM	X	X	X	DIAS CORRIDOS:	459
CHUVA				DIAS RESTANTES:	119
mm					

EFETIVO	DESCRIÇÃO	QUANT		DESCRIÇÃO	QUANT		DESCRIÇÃO	QUANT.	
		PRES.	AUSEN.		PRES.	AUSEN.		PRES.	AUSEN.
	ENGENHEIRO	0		OP. DE MINI ESCAVADEIRA	0		AJUDANTE	9	
	ENCARREGADO	0		OPERADOR DE ESPARGIDOR	0				
	OPERADOR DE PATROL	0		OPERADOR DE VIBROACABADORA	0				
	OPERADOR DE ESCAVADEIRA	0		OPERADOR ROLO PNEU	0				
	OPERADOR DE ROLO (PÉ DE CARNEIRO)	0		OPERADOR ROLO LISO	0				
	MOTORISTA CAMINHÃO PIPA	0		MOTORISTA	0				
	OPERADOR DE TRATOR AGRÍCOLA	0		PEDREIRO	4		TOTAL	13	0


EQUIPAMENTOS	DESCRIÇÃO	QUANT		DESCRIÇÃO	QUANT		DESCRIÇÃO	QUANT.	
		PRES.	AUSEN.		PRES.	AUSEN.		PRES.	AUSEN.
	PATROL	0		MINI ESCAVADEIRA	0		CAMINHÃO TRAÇADO	0	
	ESCAVADEIRA	0		CAMINHÃO ESPARGIDOR	0		CAMINHÃO TRUCADO	0	
	ROLO COMPACTADOR (PÉ DE CARNEIRO)	0		VIBROACABADORA	0		CAMINHÃO TOCO	0	
	CAMINHÃO PIPA	0		ROLO PNEU	0		CARRETAS	0	
	TRATOR AGRÍCOLA	0		ROLO LISO	0		TOTAL	0	0


ITEM	DISCRIMINAÇÃO DAS ATIVIDADES
1	* EXECUÇÃO DE MEIO FIO IN LOCO - AGUA BOA
2	* EXECUÇÃO DE TRAVAMENTO DE MANILHA E DISSIPADOR DE ENERGIA COM CONCRETO - ÁGUA BOA
3	* EXECUÇÃO DE ASSENTAMENTO DE MEIO FIO - RUAS 13, 14 E 15 (LEOPOLDINO BARBOSA)
4	
5	
6	
7	
8	

ITEM	OBSERVAÇÃO
1	OBSERVAÇÃO: FOI SOLICITADO PELA CONTRATANTE A CONSTRUÇÃO DE UMA ESCADA D'ÁGUA NA SAÍDA DA MANILHA DA BOCA DE LOBO DUPLA DO BAIRRO ÁGUA BOA. DEVIDO A INTERVENÇÃO DO DONO DO TERRENO, NÃO FOI POSSÍVEL A CONSTRUÇÃO DESSA ESCADA, PARA TRAVAR A MANILHA E IMPEDIR O ASSORIAMENTO DO TERRENO ABAIXO DA SAÍDA DA MANILHA, FOI EXECUTADO CONCRETO PARA O TRAVAMENTO DA MANILHA E UM DISSIPADOR DE ENERGIA. SEGUE FOTO ABAIXO
2	
3	
4	
5	
6	

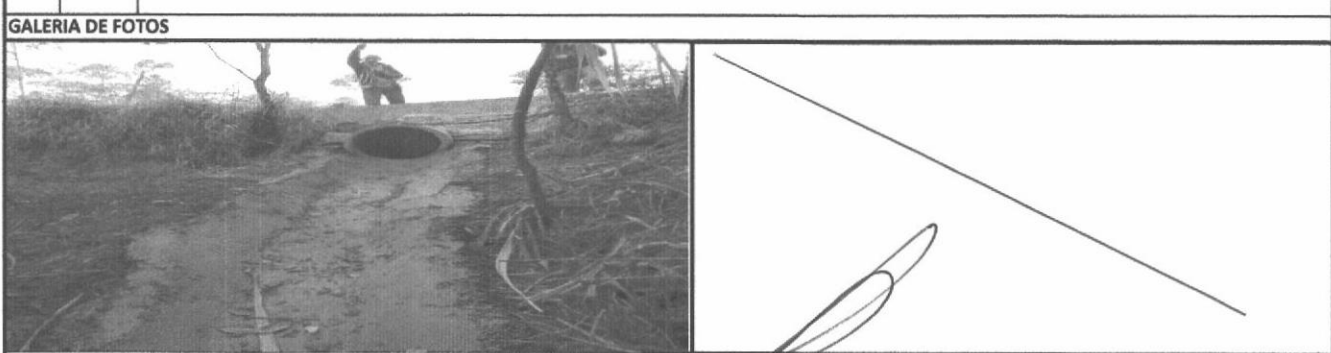

ASSINATURAS:

  
**Hugo Sebastião da Mata**  
 Engenheiro Civil  
 Crea: 202510 - MG  
 CONTRATADA

  
**Daniel Aparecido Santos Lima**  
 Diretor de Obras  
 CONTRATANTE

# TERRAMARES

3434  
Dama

## RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA

EMPRESA:		LOCADORA TERRAMARES LTDA		DATA:	11/06/2021
OBRA:		PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA E SERVIÇOS COMPLEMENTARES, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MÃO DE OBRA, NO MUNICÍPIO DE CONGONHAS-MG.		DATA INICIAL:	02/03/2020
CONTRATO:		PMC/078/2020	RDO Nº:	466	

DIA DA SEMANA						
2ª	3ª	4ª	5ª	6ª	SÁB	DOM
				X		
EFETIVO TOTAL: 4						
PRESENTES: 4			AUSENTES: 0			

CONDIÇÕES DO TEMPO			DADOS CONTRATUAIS		
	MANHÃ	TARDE	NOITE	PRAZO CONTRATUAL:	578
BOM	X	X	X	DIAS CORRIDOS:	466
CHUVA				DIAS RESTANTES:	112
mm					

EFETIVO	DESCRIÇÃO	QUANT		DESCRIÇÃO	QUANT		DESCRIÇÃO	QUANT.	
		PRES.	AUSEN.		PRES.	AUSEN.		PRES.	AUSEN.
	ENGENHEIRO	0		OP. DE MINI ESCAVADEIRA	0		AJUDANTE	3	
	ENCARREGADO	0		OPERADOR DE ESPARGIDOR	0				
	OPERADOR DE PATROL	0		OPERADOR DE VIBROACABADORA	0				
	OPERADOR DE ESCAVADEIRA	0		OPERADOR ROLO PNEU	0				
	OPERADOR DE ROLO (PÉ DE CARNEIRO)	0		OPERADOR ROLO LISO	0				
	MOTORISTA CAMINHÃO PIPA	0		MOTORISTA	0				
	OPERADOR DE TRATOR AGRÍCOLA	0		PEDREIRO	1		TOTAL	4	0

EQUIPAMENTOS	DESCRIÇÃO	QUANT		DESCRIÇÃO	QUANT		DESCRIÇÃO	QUANT.	
		PRES.	AUSEN.		PRES.	AUSEN.		PRES.	AUSEN.
	PATROL	0		MINI ESCAVADEIRA	0		CAMINHÃO TRAÇADO	0	
	ESCAVADEIRA	0		CAMINHÃO ESPARGIDOR	0		CAMINHÃO TRUCADO	0	
	ROLO COMPACTADOR (PÉ DE CARNEIRO)	0		VIBROACABADORA	0		CAMINHÃO TOCO	0	
	CAMINHÃO PIPA	0		ROLO PNEU	0		CARRETAS	0	
	TRATOR AGRÍCOLA	0		ROLO LISO	0		TOTAL	0	0

### ITEM DISCRIMINAÇÃO DAS ATIVIDADES

ITEM	DISCRIMINAÇÃO DAS ATIVIDADES
1	* EXECUÇÃO DE ASSENTAMENTO DE MEIO FIO - ÁGUA BOA
2	
3	
4	
5	
6	
7	
8	


### ITEM


ITEM	DISCRIMINAÇÃO DAS ATIVIDADES
1	
2	
3	
4	
5	
6	

### GALERIA DE FOTOS



ASSINATURAS:


  
 Hugo Sebastião de Matta  
 Engenheiro Civil  
 CREA: 202510 - MG


  
 Daniel Aparecido Santos Lima  
 Diretor de Obras

# TERRAMARES

3438  
Dama

## RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA

EMPRESA: <b>LOCADORA TERRAMARES LTDA</b>		DATA: <b>15/06/2021</b>
OBRA: <b>PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA E SERVIÇOS COMPLEMENTARES, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MÃO DE OBRA, NO MUNICÍPIO DE CONGONHAS-MG.</b>		DATA INICIAL: <b>02/03/2020</b>
CONTRATO: <b>PMC/078/2020</b>	RDO Nº: <b>470</b>	

DIA DA SEMANA						
2ª	3ª	4ª	5ª	6ª	SÁB	DOM
	X					
EFETIVO TOTAL: 9						
PRESENTES: 9			AUSENTES: 0			


CONDIÇÕES DO TEMPO			DADOS CONTRATUAIS		
	MANHÃ	TARDE	NOITE	PRAZO CONTRATUAL:	578
BOM	X	X	X	DIAS CORRIDOS:	470
CHUVA				DIAS RESTANTES:	108
mm					

EFETIVO	DESCRIÇÃO	QUANT		DESCRIÇÃO	QUANT		DESCRIÇÃO	QUANT.	
		PRES.	AUSEN.		PRES.	AUSEN.		PRES.	AUSEN.
	ENGENHEIRO	0		OP. DE MINI ESCAVADEIRA	1		AJUDANTE	6	
	ENCARREGADO	0		OPERADOR DE ESPARGIDOR	0				
	OPERADOR DE PATROL	0		OPERADOR DE VIBROACABADORA	0				
	OPERADOR DE ESCAVADEIRA	0		OPERADOR ROLO PNEU	0				
	OPERADOR DE ROLO (PÉ DE CARNEIRO)	0		OPERADOR ROLO LISO	0				
	MOTORISTA CAMINHÃO PIPA	0		MOTORISTA	0				
	OPERADOR DE TRATOR AGRÍCOLA	0		PEDREIRO	2		TOTAL	9	0

EQUIPAMENTOS	DESCRIÇÃO	QUANT		DESCRIÇÃO	QUANT		DESCRIÇÃO	QUANT.	
		PRES.	AUSEN.		PRES.	AUSEN.		PRES.	AUSEN.
	PATROL	0		MINI ESCAVADEIRA	1		CAMINHÃO TRAÇADO	0	
	ESCAVADEIRA	0		CAMINHÃO ESPARGIDOR	0		CAMINHÃO TRUCADO	0	
	ROLO COMPACTADOR (PÉ DE CARNEIRO)	0		VIBROACABADORA	0		CAMINHÃO TOCO	0	
	CAMINHÃO PIPA	0		ROLO PNEU	0		CARRETAS	0	
	TRATOR AGRÍCOLA	0		ROLO LISO	0		TOTAL	1	0

ITEM	DISCRIMINAÇÃO DAS ATIVIDADES
1	* EXECUÇÃO DE ASSENTAMENTO DE MEIO FIO - ÁGUA BOA
2	* EXECUÇÃO DE CONFINAMENTO DE MEIO FIO - ÁGUA BOA
3	* EXECUÇÃO DE ASSENTAMENTO DE MEIO FIO RUAS 7 E 15 - LEOPOLDINO BARBOSA
4	
5	
6	
7	
8	

ITEM	OBSERVAÇÃO
1	* A CONTRATADA NÃO CONSEGUIU EXECUTAR DOIS TRECHOS DE MEIO FIO NO ÁGUA BOA, DEVIDO UMA SOLICITAÇÃO DOS MORADORES QUE PEDIRAM QUE NA ENTRADA DOS LOTES DELES NÃO FOSSEM ASSENTADOS OS MEIOS FIOS E QUE AS PEÇAS FOSSEM DEIXADAS PARA SEREM ASSENTADAS POR ELES POSTERIORMENTE. FORAM DEIXADAS UM TOTAL DE 12 PEÇAS (9,60M). A CONTRATADA NÃO SE RESPONSABILIZA POR DANOS CAUSADOS NO ASFALTO DEVIDO A NÃO INSTALAÇÃO DAS PEÇAS, SENDO OS MORADORES RESPONSABILIZADOS CASO HAJA DANOS. A PREFEITURA MUNICIPAL DE CONGONHAS APROVOU A SOLICITAÇÃO DOS MORADORES E ESTÁ CIENTE DA SITUAÇÃO. FOI REALIZADO UM DOCUMENTO DESCREVENDO A SITUAÇÃO QUE FOI ASSINADO PELO MORADOR, REPRESENTANTE TÉCNICO DA CONTRATADA E REPRESENTANTE DA PREFEITURA. ABAIXO SEGUE FOTOS DOS LOCAIS ONDE NÃO FORAM ASSENTADOS OS MEIOS FIOS.
2	
3	
4	
5	
6	

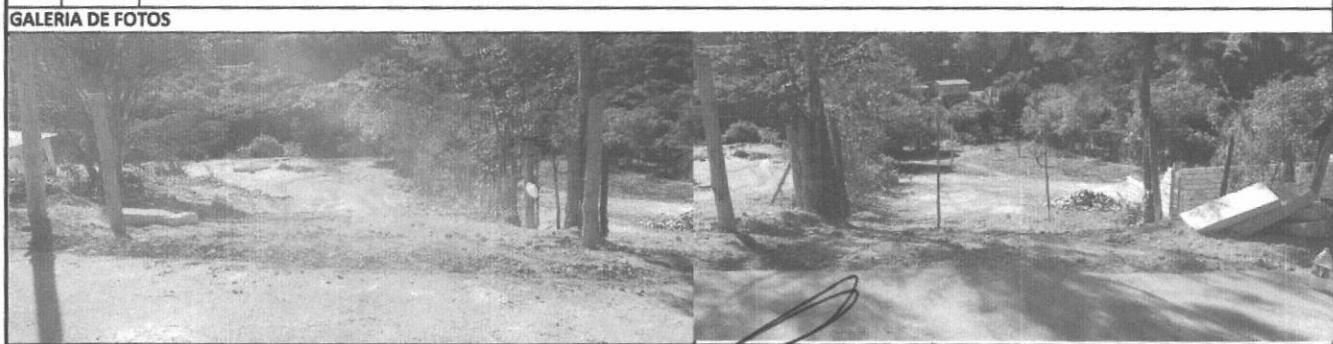

ASSINATURAS:

*Hugo Sombra da Mata*  
Engenheiro Civil  
Crea: 202510 - MG

*Daniel Aparecido Santos Lima*  
CONTRATADA

Franciele Indanara Santos Silba  
Prefeitura de Congonhas  
Téc. Edificações/CFT-MG  
11911065895

# TERRAMARES

3439  
Dano

## RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA

EMPRESA:		LOCADORA TERRAMARES LTDA		DATA:	16/06/2021
OBRA:		PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA E SERVIÇOS COMPLEMENTARES, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MÃO DE OBRA, NO MUNICÍPIO DE CONGONHAS-MG.		DATA INICIAL:	02/03/2020
		CONTRATO:	PMC/078/2020	RDO Nº:	471

DIA DA SEMANA						
2ª	3ª	4ª	5ª	6ª	SÁB	DOM
		X				
EFETIVO TOTAL: 9						
PRESENTES: 9			AUSENTES: 0			

CONDIÇÕES DO TEMPO			DADOS CONTRATUAIS		
	MANHÃ	TARDE	NOITE	PRAZO CONTRATUAL:	578
BOM	X	X	X	DIAS CORRIDOS:	471
CHUVA				DIAS RESTANTES:	107
mm					

EFETIVO	DESCRIÇÃO	QUANT		DESCRIÇÃO	QUANT		DESCRIÇÃO	QUANT.	
		PRES.	AUSEN.		PRES.	AUSEN.		PRES.	AUSEN.
	ENGENHEIRO	0		OP. DE MINI ESCAVADEIRA	1		AJUDANTE	6	
	ENCARREGADO	0		OPERADOR DE ESPARGIDOR	0				
	OPERADOR DE PATROL	0		OPERADOR DE VIBROACABADORA	0				
	OPERADOR DE ESCAVADEIRA	0		OPERADOR ROLO PNEU	0				
	OPERADOR DE ROLO (PÉ DE CARNEIRO)	0		OPERADOR ROLO LISO	0				
	MOTORISTA CAMINHÃO PIPA	0		MOTORISTA	0				
	OPERADOR DE TRATOR AGRÍCOLA	0		PEDREIRO	2		TOTAL	9	0

EQUIPAMENTOS	DESCRIÇÃO	QUANT		DESCRIÇÃO	QUANT		DESCRIÇÃO	QUANT.	
		PRES.	AUSEN.		PRES.	AUSEN.		PRES.	AUSEN.
	PATROL	0		MINI ESCAVADEIRA	1		CAMINHÃO TRAÇADO	0	
	ESCAVADEIRA	0		CAMINHÃO ESPARGIDOR	0		CAMINHÃO TRUCADO	0	
	ROLO COMPACTADOR (PÉ DE CARNEIRO)	0		VIBROACABADORA	0		CAMINHÃO TOCO	0	
	CAMINHÃO PIPA	0		ROLO PNEU	0		CARRETAS	0	
	TRATOR AGRÍCOLA	0		ROLO LISO	0		TOTAL	1	0

ITEM	DISCRIMINAÇÃO DAS ATIVIDADES
1	EXECUÇÃO DE REJUNTAMENTO DE MEIO FIO - ÁGUA BOA
2	EXECUÇÃO DE ASSENTAMENTO DE MEIO FIO - RUA 15 - LEOPOLDINO BARBOSA
3	EXECUÇÃO DE ESCAVAÇÃO DE VALA PARA EXECUÇÃO DE SARJETA EM V - ESTRADA ESMERIL
4	
5	
6	
7	
8	

ITEM	
1	
2	
3	
4	
5	
6	

**GALERIA DE FOTOS**

ASSINATURAS:

**CONTRATADA**

*Hugo Sombra da Mata*  
Engenheiro Civil  
Cra: 202510 - MG

**CONTRATANTE**

*Franciele Aparecido Santos Lima*  
Prefeita Municipal  
Cra: 202510 - MG



**PREFEITURA DE CONGONHAS  
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS  
PLANILHA DE MEDIÇÃO - DÉCIMA QUINTA MEDIÇÃO CONSIDERANDO 3º TERMO ADITIVO**

BDI: 24,67%

**OBJETO:** Execução de obras para pavimentação asfáltica e serviços complementares, com fornecimento de materiais e mão de obra, no Município de Congonhas - MG.

**CONTRATADA:** Locadora Terramares Ltda

**ORDEN DE SERVIÇOS:** 02/03/2020

**PRazos:** 12 MESES PARA A OBRA - 16 MESES PARA O CONTRATO

**PREVISÃO DE TÉRMINO DE OBRA:** 04/02/2022

**PREVISÃO DE TÉRMINO DE CONTRATO:** 20/03/2022

**LOCAL:** ÁGUA BOA

**CONTRATO Nº** PMC/078/2020 de 20/02/2020

**PRC Nº** 193/2019

**CONCORRÊNCIA Nº** PMC/012/2019

**PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº** PMC/6276/2019

**NOTA FISCAL Nº** .214 de 18/08/21

**Período:** 01/07/2021 A 31/07/2021

**VALOR DO CONTRATO:**

**ACUMULADO FATURADO:**

**SALDO A MEDIR:**

R\$ 18.243.203,90

R\$ 128.542,88

R\$ 12.392.424,81

R\$ 5.880.779,10

100,00%

0,70%

67,93%

32,07%

ITEM	DESCRIÇÃO	QUANTITATIVOS					VALORES						
		UNIDADE	QUANTITATIVO PREVISTO	ACUM. ANTERIOR	EXECUTADO REALIZADO	ACUM. FATURADO	SALDO A EXECUTAR	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL PREVISTO	ACUM. ANTERIOR	MEDIDO EXECUTADO	ACUM. FATURADO	SALDO A EXECUTAR
1	<b>MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO</b>												
1.1	MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DA OBRA	%	0,00588	0,00	0,00004	0,004006	0,001879	R\$ 13.578.338,64	R\$ 79.908,44	R\$ 53.795,55	R\$ 597,72	R\$ 54.393,27	R\$ 25.513,18
2	<b>INSTALAÇÃO DA OBRA</b>												
2.1	ESCRITÓRIO DA FISCALIZAÇÃO TIPO I - P. SUDECAP	UN	1,00	1,00		1,00	0,00	R\$ 2.829,47	R\$ 2.829,47	R\$ 2.829,47	-	R\$ 2.829,47	R\$ -
2.2	ESCRITÓRIO DA EMPREITEIRA TIPO I - P. SUDECAP	UN	1,00	1,00		1,00	0,00	R\$ 2.829,47	R\$ 2.829,47	R\$ 2.829,47	-	R\$ 2.829,47	R\$ -
2.3	VESTIÁRIO TIPO II - P. SUDECAP	UN	1,00	1,00		1,00	0,00	R\$ 4.350,05	R\$ 4.350,05	R\$ 4.350,05	-	R\$ 4.350,05	R\$ -
2.4	DEPÓSITO E FERRAMENTARIA TIPO I - P. SUDECAP	UN	1,00	1,00		1,00	0,00	R\$ 1.940,11	R\$ 1.940,11	R\$ 1.940,11	-	R\$ 1.940,11	R\$ -
2.5	INSTALAÇÃO SANITÁRIA TIPO II - P. SUDECAP	UN	1,00	1,00		1,00	0,00	R\$ 2.987,58	R\$ 2.987,58	R\$ 2.987,58	-	R\$ 2.987,58	R\$ -
2.6	REFEITÓRIO TIPO II - P. SUDECAP	UN	1,00	1,00		1,00	0,00	R\$ 2.067,91	R\$ 2.067,91	R\$ 2.067,91	-	R\$ 2.067,91	R\$ -
2.7	PLACA DE OBRA EM LONA IMPRESSÃO DIGITAL - PADRÃO SUDECAP	M2	48,00	24,00		24,00	24,00	R\$ 151,65	R\$ 7.279,20	R\$ 3.639,60	-	R\$ 3.639,60	R\$ 3.639,60
2.8	BANHEIRO QUÍMICO (2 UN) COM MANUTENÇÃO	MES	12,00	2,50		2,50	9,50	R\$ 385,23	R\$ 4.622,76	R\$ 963,08	-	R\$ 963,08	R\$ 3.659,69
3	<b>TERRAPLENAGEM</b>												
3.1	DESMATAMENTO, DESTOCAMENTO E LIMPEZA, EXCL. TRANSPORTE ATÉ 50 M	M2	86.429,27	81910,47		81910,47	4518,80	R\$ 0,52	R\$ 44.943,22	R\$ 42.593,44	-	R\$ 42.593,44	R\$ 2.349,78
3.2	ESCAVAÇÃO E CARGA DE MATERIAL DE 1ª CATEGORIA	M3	90.173,92	48987,14		48987,14	41186,78	R\$ 4,00	R\$ 360.695,68	R\$ 195.948,57	-	R\$ 195.948,57	R\$ 164.747,11
3.3	TRANSPORTE DE MATERIAL DE QUALQUER NATUREZA, 1 KM < DMT <= 2 KM	M3	53.016,00	5648,68		5648,68	47367,32	R\$ 2,90	R\$ 153.746,40	R\$ 16.381,17	-	R\$ 16.381,17	R\$ 137.365,23
3.4	TRANSPORTE DE MATERIAL DE QUALQUER NATUREZA DMT > 5 KM	M3XKM	288.000,00	238058,42		238058,42	50941,58	R\$ 1,37	R\$ 395.930,00	R\$ 326.140,04	-	R\$ 326.140,04	R\$ 69.789,96
3.5	ATERRO COMPACTADO COM ROLO VIBRATORIO	M3	46.400,00	4249,37		4249,37	42150,63	R\$ 3,99	R\$ 185.136,00	R\$ 16.954,97	-	R\$ 16.954,97	R\$ 168.181,03
3.6	ESCAVAÇÃO MECANICA DE VALAS COM DESCARGA LATERAL H <= 1,5 M	M3	2.700,00	1293,27		1293,27	1406,73	R\$ 4,29	R\$ 11.583,00	R\$ 5.548,13	-	R\$ 5.548,13	R\$ 6.034,87
3.7	REATERRO DE VALA MANUAL	M3	220,00	0,00		0,00	220,00	R\$ 51,16	R\$ 11.255,20	R\$ -	-	R\$ -	R\$ 11.255,20
3.8	REATERRO DE VALA COMPACTADO COM EQUIP. PLACA VIBRATORIA O/EQUIVALENTE	M3	1.843,09	720,09		720,09	1123,00	R\$ 22,90	R\$ 42.206,76	R\$ 16.490,14	-	R\$ 16.490,14	R\$ 25.716,62
3.9	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE TERRENO COM PLACA VIBRATORIA	M3	583,16	583,16		583,16	0,00	R\$ 4,75	R\$ 2.770,01	R\$ 2.770,01	-	R\$ 2.770,01	R\$ -
3.10	REATERRO DE VALA COM AREIA (COM ADENSAMENTO HIDRAULICO)	M3	145,00	0,00		0,00	145,00	R\$ 111,22	R\$ 16.126,90	R\$ -	-	R\$ -	R\$ 16.126,90

3484  
*[Handwritten signatures and initials]*  
 Contrato PMC/078/2020 - LOCADORA TERRAMARES LTDA

ITEM	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QUANTITATIVO PREVISTO	ACUM. ANTERIOR	QUANTITATIVOS			VALORES							
					EXECUTADO REALIZADO	ACUM. FATURADO	SALDO A EXECUTAR	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL PREVISTO	ACUM. ANTERIOR	MÉDIO EXECUTADO	ACUM. FATURADO	SALDO A EXECUTAR		
3.11	TRANSPORTE DE MATERIAL DE QUALQUER NATUREZA DMT = 25 KM	M3XKM	7.150,00	0,00		0,00	7150,00	R\$	1,37	R\$	9.795,50	R\$	-	R\$	9.795,50
4	PAVIMENTAÇÃO														
4.1	CARINA E VARIAÇÃO DE PAVIMENTO	M2	450,00	0,00		0,00	450,00	R\$	2,84	R\$	1.278,00	R\$	-	R\$	1.278,00
4.2	ESCAVAÇÃO E CARGA DE MATERIAL DE 1ª CATEGORIA PARA REFORÇO DE SUBLEITO	M3	74.400,00	255,17		255,17	74144,83	R\$	2,84	R\$	196.416,00	R\$	673,65	R\$	196.742,35
4.3	REFORÇO DO SUBLEITO COMPACTADO EXCL. ESCAVE CARGA, COMPACTO (PROCTOR INTERMEDIÁRIO)	M3	33.000,00	758,42		758,42	32241,58	R\$	6,12	R\$	201.960,00	R\$	4.641,53	R\$	197.318,47
4.4	TRANSPORTE DE MATERIAL DE QUALQUER NATUREZA DMT > 5 KM	M3XKM	372.000,00	10084,65		10084,65	361915,35	R\$	1,37	R\$	509.640,00	R\$	13.815,97	R\$	495.824,03
4.5	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DO SUBLEITO	M2	135.652,79	123368,40		1205,08	124573,48	R\$	1,48	R\$	201.062,13	R\$	182.585,23	R\$	1.783,52
4.6	SUB-BASE ESTAB. GRANUL. ENERGIA PROCTOR INTERMED. COM CARGA DE MINERIO DE FERRO E=0,125 M	M3	14.310,97	3734,84		3734,84	10576,13	R\$	74,84	R\$	1.071.032,99	R\$	279.515,09	R\$	791.517,91
4.7	BASE ESTAB. GRANUL. ENERGIA PROCTOR INTERMEDIÁRIO COM CARGA DE MINERIO DE FERRO E = 0,128 M	M3	14.310,97	8279,88		8279,88	6031,09	R\$	76,02	R\$	1.087.919,94	R\$	629.436,44	R\$	458.483,50
4.8	BASE ESTAB. GRANUL. COMP. ENERG. PROCTOR MODIF. COM BRITA BICA CORRIDA	M3	14.851,95	11647,96		241,02	11888,98	R\$	132,49	R\$	1.967.734,86	R\$	1.543.238,22	R\$	31.992,74
4.9	TRANSPORTE DE MATERIAL DE BASE DMT<=22KM	TXKM	1.100.000,00	744860,25		13044,00	758004,25	R\$	0,60	R\$	660.000,00	R\$	446.976,15	R\$	7.826,40
4.10	IMPRIMAÇÃO COM CM-30	M2	116.352,79	106050,26		1205,08	107255,34	R\$	6,74	R\$	764.217,80	R\$	714.778,72	R\$	8.122,24
4.11	PINTURA DE LIGAÇÃO COM RR-1C	M2	116.352,79	105977,06		1205,08	107182,14	R\$	1,70	R\$	197.792,74	R\$	180.161,00	R\$	2.048,64
4.12	CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE FAIXA C CAP 50/70	TON	12.121,21	11155,62		115,690	11271,31	R\$	445,73	R\$	5.402.786,93	R\$	4.972.396,73	R\$	51.566,50
4.13	CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE FAIXA C CAP 50/70 ESP. MANUAL. COMPACT. PLACA VIBRAT. (QUEBRA MOLLA)	TON	135,00	77,93		77,93	57,07	R\$	568,66	R\$	76.769,10	R\$	44.315,67	R\$	44.315,67
4.14	TRANSPORTE DE CBUO DMT <=100 KM	TXKM	1.202.121,48	982285,54		1041,21	983326,75	R\$	0,60	R\$	721.272,89	R\$	589.371,32	R\$	624,73
5	DRENAGEM														
5.1	REDE TUB. CONCRETO CIMENTO ARI PLUS RS CLASSE PA-1 DN= 400 MM	M	573,80	357,76		357,76	216,04	R\$	110,59	R\$	63.456,54	R\$	39.564,68	R\$	39.564,68
5.2	REDE TUB. CONCRETO CIMENTO ARI PLUS RS CLASSE PA-1 DN= 600 MM	M	558,35	144,94		144,94	413,41	R\$	188,68	R\$	105.349,48	R\$	27.347,28	R\$	27.347,28
5.3	CONCRETO PARA BERÇO DE REDE TUBULAR TRAÇO 1:3:6, INCLUSIVE LANÇAMENTO	M3	214,77	83,52		83,52	131,25	R\$	377,25	R\$	81.021,99	R\$	31.508,11	R\$	31.508,11
5.4	FORMA PARA BERÇO EM TABUA, INCLUSIVE DESFORMA	M2	186,00	6,36		6,36	179,64	R\$	16,37	R\$	3.044,82	R\$	104,11	R\$	104,11
5.5	ALA DE REDE TUBULAR D= 600 MM	UN	14,00	5,00		5,00	9,00	R\$	993,07	R\$	13.902,98	R\$	4.965,35	R\$	4.965,35
5.6	CAIXA DE PASSAGEM TIPO B - PADRAO SUDECAP, D= 600 MM	UN	27,00	10,50		10,50	16,50	R\$	1.769,50	R\$	47.776,50	R\$	18.579,75	R\$	18.579,75
5.7	DISSIPADOR DE ENERGIA P. DN12 DEB 02	UN	48,00	0,00		0,00	48,00	R\$	545,26	R\$	26.172,48	R\$	-	R\$	-
5.8	SALIDA DA GUA SIMPLES, EM TALUDE DE ATERRO - TIPO 01 - SSA - 01	UN	221,00	0,00		0,00	221,00	R\$	470,29	R\$	103.994,09	R\$	-	R\$	-
5.9	SARJETA TRIANGULAR DE CONCRETO STCO2	M	640,00	0,00		0,00	640,00	R\$	70,74	R\$	45.273,60	R\$	-	R\$	-
5.10	SARJETA TRIANGULAR DE CONCRETO STCO4	M	3.960,00	2475,97		2475,97	1484,03	R\$	48,76	R\$	193.089,60	R\$	120.728,30	R\$	120.728,30
5.11	SARJETA DE CONCRETO EM ATERRO, TIPO DR SCA-XY, LARGURA = 60 CM TIPO 30/20 (EXECUÇÃO, INCLUINDO ESCAVAÇÃO, FORNECIMENTO E TRANSPORTE DE TODOS OS MATERIAIS)	M	152,00	0,00		0,00	152,00	R\$	50,45	R\$	7.668,40	R\$	-	R\$	-

*Franisch*

*Guilherme*

*Antonio*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

ITEM	DESCRIÇÃO	QUANTITATIVOS						VALORES					
		UNIDADE	QUANTITATIVO PREVISTO	ACUM. ANTERIOR	EXECUTADO REALIZADO	ACUM. FATURADO	SALDO A EXECUTAR	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL PREVISTO	ACUM. ANTERIOR	MEDIDO EXECUTADO	ACUM. FATURADO	SALDO A EXECUTAR
5.12	SARJETA DE CONCRETO EM ATERRO, TIPO DR SCA-XY, LARGURA = 70 CM TIPO 40/20 (EXECUÇÃO, INCLUINDO ESCAVAÇÃO, FORNECIMENTO E TRANSPORTE DE TODOS OS MATERIAIS)	M	1.100,00	0,00		0,00	1100,00	R\$ 52,49	R\$ 57.739,00	R\$ -	R\$ -	R\$ 57.739,00	
5.13	SARJETA DE CONCRETO EM ATERRO, TIPO DR SCA-XY, LARGURA = 80 CM TIPO 50/20 (EXECUÇÃO, INCLUINDO ESCAVAÇÃO, FORNECIMENTO E TRANSPORTE DE TODOS OS MATERIAIS)	M	1.490,00	1128,10		1128,10	361,90	R\$ 60,59	R\$ 90.279,10	R\$ 68.351,58	R\$ 68.351,58	R\$ 21.927,52	
5.14	SARJETA DE CONCRETO EM ATERRO, TIPO DR SCA-XY, LARGURA = 80 CM TIPO 50/30 (EXECUÇÃO, INCLUINDO ESCAVAÇÃO, FORNECIMENTO E TRANSPORTE DE TODOS OS MATERIAIS)	M	2.369,00	940,90		940,90	1428,10	R\$ 75,80	R\$ 179.570,20	R\$ 71.320,22	R\$ 71.320,22	R\$ 108.249,98	
5.15	SARJETA DE CONCRETO EM ATERRO, TIPO DR SCA-XY, LARGURA = 90 CM TIPO 60/30 (EXECUÇÃO, INCLUINDO ESCAVAÇÃO, FORNECIMENTO E TRANSPORTE DE TODOS OS MATERIAIS)	M	134,00	0,00		0,00	134,00	R\$ 83,99	R\$ 11.254,66	R\$ -	R\$ -	R\$ 11.254,66	
5.16	SARJETA DE CONCRETO EM ATERRO, TIPO DR SCA-XY, LARGURA = 100 CM TIPO 70/30 (EXECUÇÃO, INCLUINDO ESCAVAÇÃO, FORNECIMENTO E TRANSPORTE DE TODOS OS MATERIAIS)	M	1.065,00	0,00		0,00	1065,00	R\$ 87,21	R\$ 92.878,65	R\$ -	R\$ -	R\$ 92.878,65	
5.17	CAIXA PARA BOCA DE LOBO SIMPLES	UN	51,00	39,00		39,00	12,00	R\$ 870,12	R\$ 44.376,12	R\$ 33.934,68	R\$ 33.934,68	R\$ 10.441,44	
5.18	CAIXA PARA BOCA DE LOBO DUPLA	UN	31,00	1,00		1,00	30,00	R\$ 1.606,20	R\$ 49.792,20	R\$ 1.606,20	R\$ 1.606,20	R\$ 48.186,00	
5.19	CONJUNTO QUADRO E GRELHA PARA BOCA DE LOBO TIPO B (CONCRETO) - PADRÃO SUDECAP	UN	102,00	42,00		42,00	60,00	R\$ 235,30	R\$ 24.000,60	R\$ 9.882,60	R\$ 9.882,60	R\$ 14.118,00	
5.20	CANTONEIRA PARA BOCA DE LOBO TIPO B (CONCRETO) - PADRÃO SUDECAP	UN	102,00	41,00		41,00	61,00	R\$ 97,02	R\$ 9.896,04	R\$ 3.977,82	R\$ 3.977,82	R\$ 5.918,22	
5.21	DRENO PROFUNDO COM AREIA, SEM SELO, COM 1.50X0,40 M E TUBO DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE PERFORADO DE 100 MM ENVOLVIDO EM MANTA GEOTEXTIL NÃO TECIDA, TIPO DR.DP-02	M	1.480,00	0,00		0,00	1480,00	R\$ 100,36	R\$ 148.532,80	R\$ -	R\$ -	R\$ 148.532,80	
5.22	TRANSPORTE DE AGREGADOS PARA CONSERVAÇÃO, DISTÂNCIA MÉDIA DE TRANSPORTE > 50,10 KM	M3xKM	48.650,00	0,00		0,00	48650,00	R\$ 1,37	R\$ 66.650,50	R\$ -	R\$ -	R\$ 66.650,50	
6	OBRAS COMPLEMENTARES												
6.1	MIO FIO CONCRETO TIPO A - PADRÃO SUDECAP (12X16,7X35)CM	M	16.389,94	13758,27		277,36	2354,31	R\$ 38,67	R\$ 633.796,98	R\$ 532.032,30	R\$ 532.032,30	R\$ 91.041,17	
6.2	FORNECIMENTO E LANCAMENTO DE CONCRETO FOK = 15 MPA PARA CONFINAMENTO MEIO-FIO	M	10.750,00	9706,46		223,58	819,96	R\$ 17,44	R\$ 187.480,00	R\$ 169.280,66	R\$ 169.280,66	R\$ 14.300,10	
6.3	PASSEIOS DE CONCRETO 15 MPA E = 6 CM JUNTA SECA 3M MANUAL	M2	2.250,00	0,00		0,00	2250,00	R\$ 40,14	R\$ 90.315,00	R\$ -	R\$ -	R\$ 90.315,00	
6.4	LANÇAMENTO E ESPALHAMENTO DE MATERIAIS EM PASSEIO	M3	100,00	0,00		0,00	100,00	R\$ 17,05	R\$ 1.705,00	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.705,00	
7	ADMINISTRAÇÃO LOCAL												
7.1	ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA ( CONFORME ACORDÃO 2622/2013)	%	8,73448	0,058985		0,000616	8,67	R\$ 13.644.388,08	R\$ 1.191.766,69	R\$ 804.818,14	R\$ 8.398,12	R\$ 813.216,27	
<b>PRIMEIRO TERMO ADITIVO - SERVIÇOS NOVOS</b>													
1.0	DESCIDA												
1.1	DESCIDA D'ÁGUA TIPO DEGRAU DN 500	M	65,00	0,00		0,00	65,00	R\$ 447,95	R\$ 29.116,75	R\$ -	R\$ -	R\$ 29.116,75	
2.0	SARJETA - PADRÃO SUDECAP												
2.1	TIPO A - (50X10)CM - DES-R01	M	6.383,00	1.386,61		55,21	4941,18	R\$ 18,43	R\$ 117.638,68	R\$ 25.555,22	R\$ 1.017,52	R\$ 26.572,74	
3.0	DRENO - PADRÃO SUDECAP												
3.1	TIPO B-MANTA DRENANTE, BRITA 3, TUBO POROSOS L=50CM	M	65,00	0,00		0,00	65,00	R\$ 87,52	R\$ 5.688,80	R\$ -	R\$ -	R\$ 5.688,80	

3485  
Dum

Franciel

Contrato PMC/078/2020 - LOCADORA TERRAMARES LTDA





PREFEITURA DE CONGONHAS  
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS

GRUPO  
TERRAMARES

3486  
Dama

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO

Contratada: **LOCADORA TERRAMARES LTDA**

Contrato nº: PMC/078/2020

15ª MEDIÇÃO

Data: 31/07/2021


Período: 01/07/2021 À 31/07/2021

Fiscais: Daniel Aparecido Santos Lima / Franciele Indianara S. Silva


Objeto:

PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA E SERVIÇOS COMPLEMENTARES, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MÃO DE OBRA, NO MUNICÍPIO DE CONGONHAS-MG.

FOTOGRAFIA

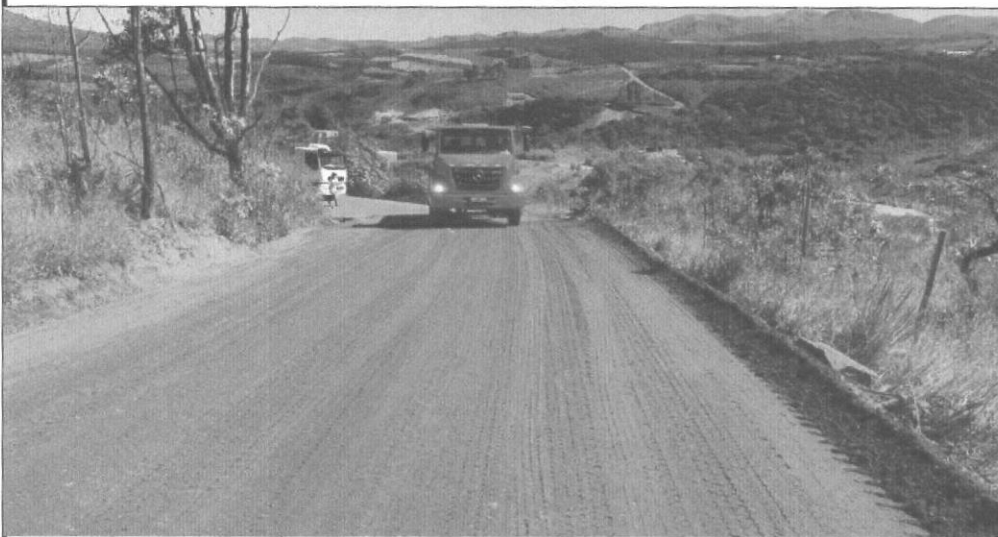

EXECUÇÃO DE BASE DE BICA CORRIDA - ÁREA 9 (RUA 8 P/ PREFEITURA) - ÁGUA BOA

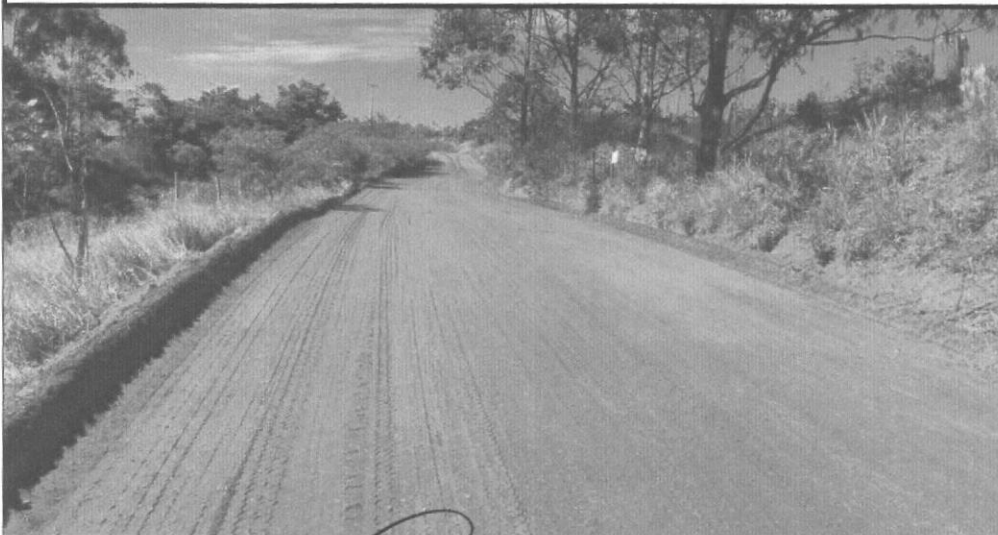

EXECUÇÃO DE BASE DE BICA CORRIDA - ÁREA 9 (RUA 8 P/ PREFEITURA) - ÁGUA BOA

Hugo Seabra de Paula  
Engenheiro Civil  
Crea 202510 - MG

Contratada

Daniel Aparecido Santos Lima  
Diretor de Obras

Prefeitura de Congonhas - SEOB

Franciele Indianara Santos  
Prefeitura de Congonhas  
Téc. Edificações, C.F.T. 1410609995



RELATÓRIO FOTOGRÁFICO

Contratada: **LOCADORA TERRAMARES LTDA**

Contrato nº: PMC/078/2020

**15ª MEDIÇÃO**

Data: 31/07/2021

Período: 01/07/2021 À 31/07/2021

Fiscais: Daniel Aparecido Santos Lima / Franciele Indianara S. Silva

**Objeto:**

PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA E SERVIÇOS COMPLEMENTARES, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MÃO DE OBRA, NO MUNICÍPIO DE CONGONHAS-MG.

**FOTOGRAFIA**



EXECUÇÃO DE IMPRIMAÇÃO - ÁREA 9 (RUA 8 P/ PREFEITURA) - ÁGUA BOA)



EXECUÇÃO DE IMPRIMAÇÃO - ÁREA 9 (RUA 8 P/ PREFEITURA) - ÁGUA BOA)

Hugo Seabra da Silva  
Engenheiro Civil  
Crea: 242510 - MG

Contratada

Daniel Aparecido Santos Lima  
Diretor de Obras  
Prefeitura de Congonhas - SEOB

Franciele Indianara S. Silva  
Prefeitura de Congonhas - MG  
Téc. Edificações C.F.T. nº 141000995



3488  
am

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO

Contratada: **LOCADORA TERRAMARES LTDA**

Contrato nº: **PMC/078/2020**

**15ª MEDIÇÃO**

Data: **31/07/2021**

Período: **01/07/2021 À 31/07/2021**

Fiscais: **Daniel Aparecido Santos Lima / Franciele Indianara S. Silva**

**Objeto:**

PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA E SERVIÇOS COMPLEMENTARES, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MÃO DE OBRA, NO MUNICÍPIO DE CONGONHAS-MG.

FOTOGRAFIA



EXECUÇÃO DE PINTURA DE LIGAÇÃO - ÁREA 9 (RUA 8 P/ PREFEITURA) - ÁGUA BOA)



EXECUÇÃO DE CBUQ - ÁREA 9 (RUA 8 P/ PREFEITURA) - ÁGUA BOA)

*Hugo Seabra da Mota*  
Engenheiro Civil  
Crea: 202510 - MG

Contratada

*Daniel Aparecido Santos Lima*  
Diretor de Obras  
Prefeitura de Congonhas - SEOB

*Franciele Indianara Santos*  
Téc. Edificações, CFT-1410  
1410609995



RELATÓRIO FOTOGRÁFICO

Contratada: **LOCADORA TERRAMARES LTDA**

Contrato nº: **PMC/078/2020**

**15ª MEDIÇÃO**

Data: **31/07/2021**

Período: **01/07/2021 À 31/07/2021**

Fiscais: **Daniel Aparecido Santos Lima / Franciele Indianara S. Silva**

**Objeto:**

PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA E SERVIÇOS COMPLEMENTARES, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MÃO DE OBRA, NO MUNICÍPIO DE CONGONHAS-MG.

FOTOGRAFIA



EXECUÇÃO DE CBUQ - ÁREA 9 (RUA 8 P/ PREFEITURA) - ÁGUA BOA)



EXECUÇÃO DE CBUQ - ÁREA 9 (RUA 8 P/ PREFEITURA) - ÁGUA BOA)

Hugo Scabrin de Mello  
Engenheiro Civil  
Crea: 202210 - MG

Contratada

Daniel Aparecido Santos Lima  
Diretor de Obras  
Prefeitura de Congonhas - SEOB

Franciele Indianara S. Silva  
Téc. Edificações - CREA 1470609995  
Prefeitura de Congonhas - MG



RELATÓRIO FOTOGRÁFICO

Contratada: **LOCADORA TERRAMARES LTDA**

Contrato nº: **PMC/078/2020**

**15ª MEDIÇÃO**

Data: **31/07/2021**

Período: **01/07/2021 À 31/07/2021**

Fiscais: **Daniel Aparecido Santos Lima / Franciele Indianara S. Silva**


**Objeto:**

PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA E SERVIÇOS COMPLEMENTARES, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MÃO DE OBRA, NO MUNICÍPIO DE CONGONHAS-MG.

FOTOGRAFIA



EXECUÇÃO DE CBUQ - ÁREA 9 (RUA 8 P/ PREFEITURA) - ÁGUA BOA)

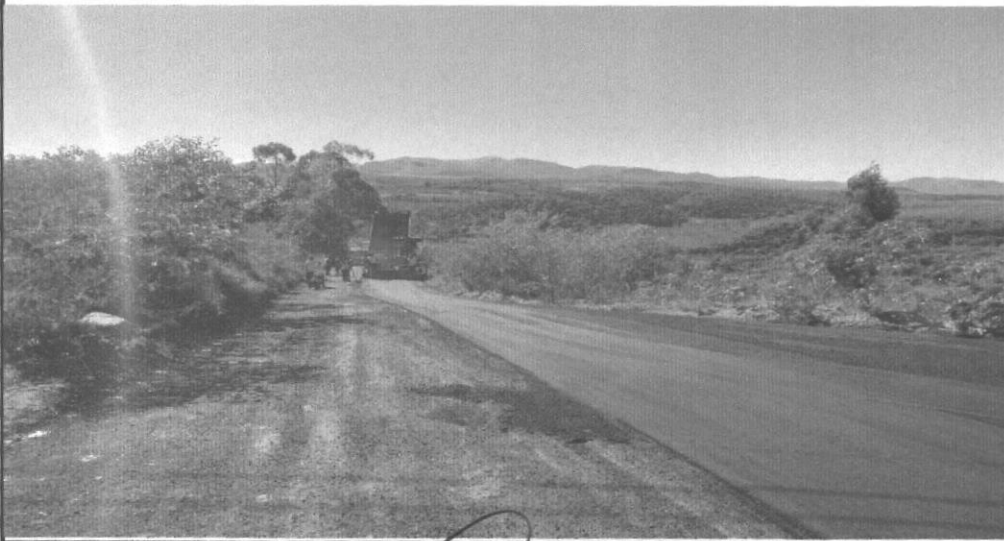

EXECUÇÃO DE CBUQ - ÁREA 9 (RUA 8 P/ PREFEITURA) - ÁGUA BOA)

Hugo Senoia da Silva  
Engenheiro Civil  
Crea: 207110 - MG

Contratada

Daniel Aparecido Santos Lima  
Prefeitura de Congonhas - SEOB

Franciele Indianara Santos Silva  
Téc. Edificações/CFT-Água  
1416609995



RELATÓRIO FOTOGRÁFICO

Contratada: **LOCADORA TERRAMARES LTDA**

Contrato nº: PMC/078/2020

15ª MEDIÇÃO

Data: 31/07/2021

Período: 01/07/2021 À 31/07/2021

Fiscais: Daniel Aparecido Santos Lima / Franciele Indianara S. Silva

**Objeto:**

PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA E SERVIÇOS COMPLEMENTARES, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MÃO DE OBRA, NO MUNICÍPIO DE CONGONHAS-MG.

FOTOGRAFIA



ASSENTAMENTO DE MEIO FIO - ÁREA 9 (RUA 8 P/ PREFEITURA) - ÁGUA BOA)



ASSENTAMENTO DE MEIO FIO - ÁREA 9 (RUA 8 P/ PREFEITURA) - ÁGUA BOA)

Hugo Sebastião da Silva  
Engenheiro Civil  
Crea: 20.510 - MG

Contratada

Daniel Aparecido Santos Lima  
Diretor de Obras

Prefeitura de Congonhas - SEOB

Franciele Indianara Santos Silva  
Prefeitura de Congonhas  
Edificações/CFE-MG  
1410609995



**PREFEITURA DE CONGONHAS**  
**SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS**

GRUPO  
**TERRAMARES**

3492  
*Como*

**RELATÓRIO FOTOGRÁFICO**

**Contratada: LOCADORA TERRAMARES LTDA**

**Contrato nº: PMC/078/2020**

**15ª MEDIÇÃO**

**Data: 31/07/2021**


**Período: 01/07/2021 À 31/07/2021**

**Fiscais: Daniel Aparecido Santos Lima / Franciele Indianara S. Silva**

**Objeto:**

PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA E SERVIÇOS COMPLEMENTARES, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MÃO DE OBRA, NO MUNICÍPIO DE CONGONHAS-MG.

**FOTOGRAFIA**

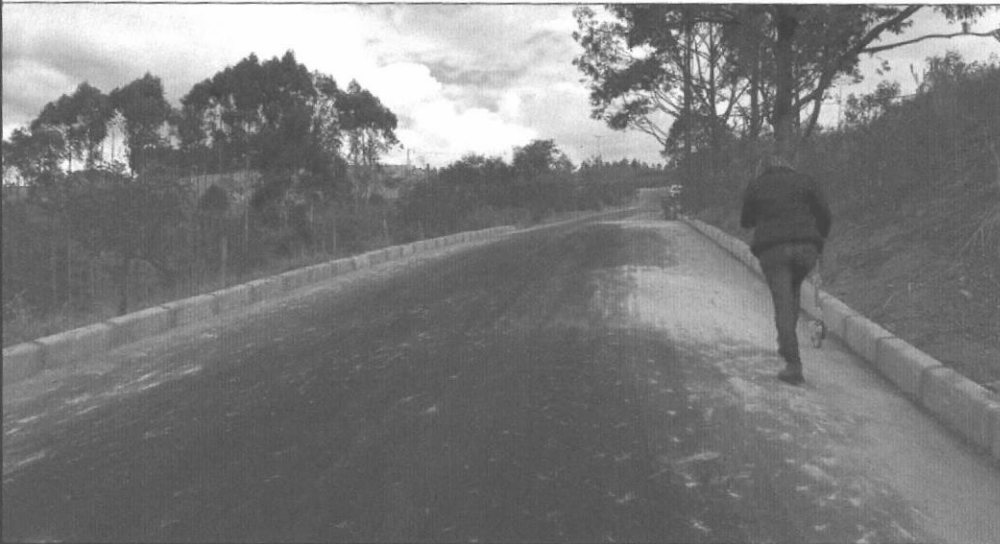

ASSENTAMENTO DE MEIO FIO - ÁREA 9 (RUA 8 P/ PREFEITURA) - ÁGUA BOA)



ASSENTAMENTO DE MEIO FIO - ÁREA 9 (RUA 8 P/ PREFEITURA) - ÁGUA BOA)

*Hugo Seabra da Silva*  
 Engenheiro Civil  
 Crec. 702510 - MG

Contratada

*Daniel Aparecido Santos Lima*  
 Diretor de Obras

Prefeitura de Congonhas - SEOB

*Franciele Indianara Santos Silva*  
 Prefeitura de Congonhas - SEOB  
 Edificações/OFT  
 1410609935

3499  
0002

LOCADORA TERRAMARES LTDA. RUA SARDENHA, 315 - JARDIM VILA ANDREZA   CONGONHAS - MINAS GERAIS CEP 36.415-000   TEL.: (31) 3731-5627   3731-7309 adm@locadoraterramares.com.br CNPJ: 05.371.926/0001-07   INSC. EST.: 0011214020011		00002  GRUPO <b>TERRAMARES</b>
<b>NOTA DE ENTRADA</b>		
DATA:	24/07/2021	
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE CONGONHAS	
PRODUTO:	CBUQ FC	
ORIGEM USINA:	CONGONHAS - MG	
TRANSPORTADOR:	OEQ - 5G20	
QUANTIDADE (ton):	14,45	
_____ GRUPO TERRAMARES LTDA		_____ FISCAL(COMPRADOR)

TICKET DE BALANÇA  
 PREFEITURA MUNICIPAL DE CONGONHAS.  
 PRA. PRESIDENTE JK.  
 CONGONHAS.  
 FONE: (031) 3731-1300

ENTRADA: 24/07/2021 HORA: 11:10 SAÍDA: 24/07/2021

TICKET: Nº 01  
 PLACA: OEQ5G20  
 MOTORISTA: MARCOS ALEXANDRE  
 PRODUTO: ASFALTO  
 DESTINO/PROCEDENCIA: SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA  
 FORNECEDOR/CLIENTE: TERRA MARES  
 TRANSPORTADORA: TERRA MARES  
 DOCUMENTOS. (S)-----  
 OBS: ASFALTO P/ BAIRRO ÁGUA BOA

PESO ENTRADA: 23.980 KG  
 PESO SAÍDA: 9.630 KG  
 PESO LIQUIDO: 14.350 KG

ASS. *[Signature]*

ASS. *[Signature]*

3500  
Dano

LOCADORA TERRAMARES LTDA. RUA SARDENHA, 315 - JARDIM VILA ANDREZA   CONGONHAS - MINAS GERAIS CEP 36.415-000   TEL.: (31) 3731-5627   3731-7309 adm@locadoraterramares.com.br CNPJ: 05.371.926/0001-07   INSC. EST.: 0011214020011		00003  GRUPO <b>TERRAMARES</b>
<b>NOTA DE ENTRADA</b>		
DATA:	24/07/2021	
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE CONGONHAS	
PRODUTO:	CBUQ 50	
ORIGEM USINA:	CONGONHAS - MG	
TRANSPORTADOR:	HGJ-7835	
QUANTIDADE (ton):	15,32	
 GRUPO TERRAMARES LTDA		FISCAL (COMPRADOR)



TICKET DE BALANÇA  
 PREFEITURA MUNICIPAL DE CONGONHAS.  
 PRA. PRESIDENTE JK.  
 CONGONHAS.  
 FONE: (031) 3731-1300

ENTRADA: 24/07/2021 HORA: 11:35 SAÍDA: 24/07/2021


TICKET: Nº 01  
 PLACA: HGJ-7835  
 MOTORISTA: GISLEI  
 PRODUTO: ASFALTO  
 DESTINO/PROCEDENCIA: SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA  
 FORNECEDOR/CLIENTE: TERRA MARES  
 TRANSPORTADORA: TERRA MARES  
 DOCUMENTOS. (S)-----  
 OBS: ASFALTO P/ BAIRRO ÁGUA BOA

PESO ENTRADA: 25.920 KG  
 PESO SAÍDA: 10.700 KG  
 PESO LIQUIDO: 15.220 KG

*PP*

ASS.  ASS. 

3503  
Bm

LOCADORA TERRAMARES LTDA. RUA SARDENHA, 315 - JARDIM VILA ANDREZA   CONGONHAS - MINAS GERAIS CEP 36.415-000   TEL.: (31) 3731-5627   3731-7309 adm@locadoraterramares.com.br CNPJ: 05.371.926/0001-07   INSC. EST.: 0011214020011		00004
		GRUPO <b>TERRAMARES</b>
<b>NOTA DE ENTRADA</b>		
DATA:	24/07/2021	
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE CONGONHAS	
PRODUTO:	CBUQ FC	
ORIGEM USINA:	CONGONHAS - MG	
TRANSPORTADOR:	HEH 1744	
QUANTIDADE (ton):	15,38	
 GRUPO TERRAMARES LTDA		FISCAL (COMPRADOR)



TICKET DE BALANÇA  
 PREFEITURA MUNICIPAL DE CONGONHAS.  
 PRA. PRESIDENTE JK.  
 CONGONHAS.  
 FONE: (031) 3731-1300

ENTRADA: 24/07/2021 HORA: 11:30 SAÍDA: 24/07/2021


TICKET: Nº 01  
 PLACA: HEH-1744  
 MOTORISTA: WESLEY CESAR  
 PRODUTO: ASFALTO  
 DESTINO/PROCEDENCIA: SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA  
 FORNECEDOR/CLIENTE: TERRA MARES  
 TRANSPORTADORA: TERRA MARES  
 DOCUMENTOS. (S) -----  
 OBS: ASFALTO P/ BAIRRO ÁGUA BOA

PESO ENTRADA: 25.080 KG  
 PESO SAÍDA: 9.800 KG  
 PESO LIQUIDO: 15.280 KG

Ⓜ

ASS.  ASS. 

3502  
@ama

LOCADORA TERRAMARES LTDA. RUA SARDENHA, 315 - JARDIM VILA ANDREZA   CONGONHAS - MINAS GERAIS CEP 36.415-000   TEL.: (31) 3731-5627   3731-7309 adm@locadoraterramares.com.br CNPJ: 05.371.926/0001-07   INSC. EST.: 0011214020011		00005
		GRUPO <b>TERRAMARES</b>
<b>NOTA DE ENTRADA</b>		
DATA:	24/07/2021	
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE CONGONHAS	
PRODUTO:	CBUQ FC	
ORIGEM USINA:	CONGONHAS - MG	
TRANSPORTADOR:	GXS - 4F98	
QUANTIDADE (ton):	15,40	
 GRUPO TERRAMARES LTDA		FISCAL (COMPRADOR)



TICKET DE BALANÇA  
 PREFEITURA MUNICIPAL DE CONGONHAS.  
 PRA. PRESIDENTE JK.  
 CONGONHAS.  
 FONE: (031) 3731-1300

ENTRADA: 24/07/2021 HORA: 11:50 SAÍDA: 24/07/2021

TICKET: Nº 01  
 PLACA: GXS4F98  
 MOTORISTA: ERICK  
 PRODUTO: ASFALTO  
 DESTINO/PROCEDENCIA: SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA  
 FORNECEDOR/CLIENTE: TERRA MARES  
 TRANSPORTADORA: TERRA MARES  
 DOCUMENTOS. (S)-----  
 OBS: ASFALTO P/ BAIRRO ÁGUA BOA

PESO ENTRADA: 25.100 KG  
 PESO SAÍDA: 9.800 KG  
 PESO LIQUIDO: 15.300 KG



ASS.  ASS. 



LOCADORA TERRAMARES LTDA. RUA SARDENHA, 315 - JARDIM VILA ANDREZA   CONGONHAS - MINAS GERAIS CEP 36.415-000   TEL.: (31) 3731-5627   3731-7309 adm@locadoraterramares.com.br CNPJ: 05.371.926/0001-07   INSC. EST.: 0011214020011		00006  GRUPO <b>TERRAMARES</b>
<b>NOTA DE ENTRADA</b>		
DATA:	26/07/2021	
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE CONGONHAS	
PRODUTO:	CBUQ FC	
ORIGEM USINA:	CONGONHAS - MG	
TRANSPORTADOR:	GXS/ 4F98	
QUANTIDADE (ton):	15,10	
 GRUPO TERRAMARES LTDA		FISCAL (COMPRADOR)

TICKET DE BALANÇA  
 PREFEITURA MUNICIPAL DE CONGONHAS.  
 PRA. PRESIDENTE JK.  
 CONGONHAS.  
 FONE: (031) 3731-1300

ENTRADA: 26/07/2021 HORA: 08:50 SAÍDA: 26/07/2021

TICKET: Nº 01  
 PLACA: GXS4F98  
 MOTORISTA: ERICK  
 PRODUTO: ASFALTO  
 DESTINO/PROCEDENCIA: SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA  
 FORNECEDOR/CLIENTE: TERRA MARES  
 TRANSPORTADORA: TERRA MARES  
 DOCUMENTOS. (S)-----  
 OBS: ASFALTO P/ BAIRRO ÁGUA BOA

PESO ENTRADA: 24.800 KG  
 PESO SAÍDA: 9.800 KG  
 PESO LIQUIDO: 15.000 KG

ASS.  ASS. 

3504  
adm

LOCADORA TERRAMARES LTDA. RUA SARDENHA, 315 - JARDIM VILA ANDREZA   CONGONHAS - MINAS GERAIS CEP 36.415-000   TEL.: (31) 3731-5627   3731-7309 adm@locadoraterramares.com.br CNPJ: 05.371.926/0001-07   INSC. EST.: 0011214020011		00007
<b>GRUPO TERRAMARES</b>		
<b>NOTA DE ENTRADA</b>		
DATA:	26/07/2021	
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE CONGONHAS	
PRODUTO:	CBUQ FC	
ORIGEM USINA:	CONGONHAS - MG	
TRANSPORTADOR:	OEQ - 5G20	
QUANTIDADE (ton):	15,11	
GRUPO TERRAMARES LTDA		FISCAL(COMPRADOR)


TICKET DE BALANÇA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CONGONHAS.  
PRA.PRESIDENTE JK.  
CONGONHAS.  
FONE: (031) 3731-1300

ENTRADA: 26/07/2021 HORA: 08:40 SAÍDA: 26/07/2021

TICKET: Nº 01  
PLACA: OEQ5G20  
MOTORISTA: MARCOS ALEXANDRE  
PRODUTO: ASFALTO  
DESTINO/PROCEDENCIA: SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA  
FORNECEDOR/CLIENTE: TERRA MARES  
TRANSPORTADORA: TERRA MARES  
DOCUMENTOS. (S)-----  
OBS:ASFALTO P/ BAIRRO ÁGUA BOA

PESO ENTRADA: 24.640 KG  
PESO SAÍDA: 9.630 KG  
PESO LIQUIDO: 15.010 KG

ASS. [Signature] ASS. [Signature]

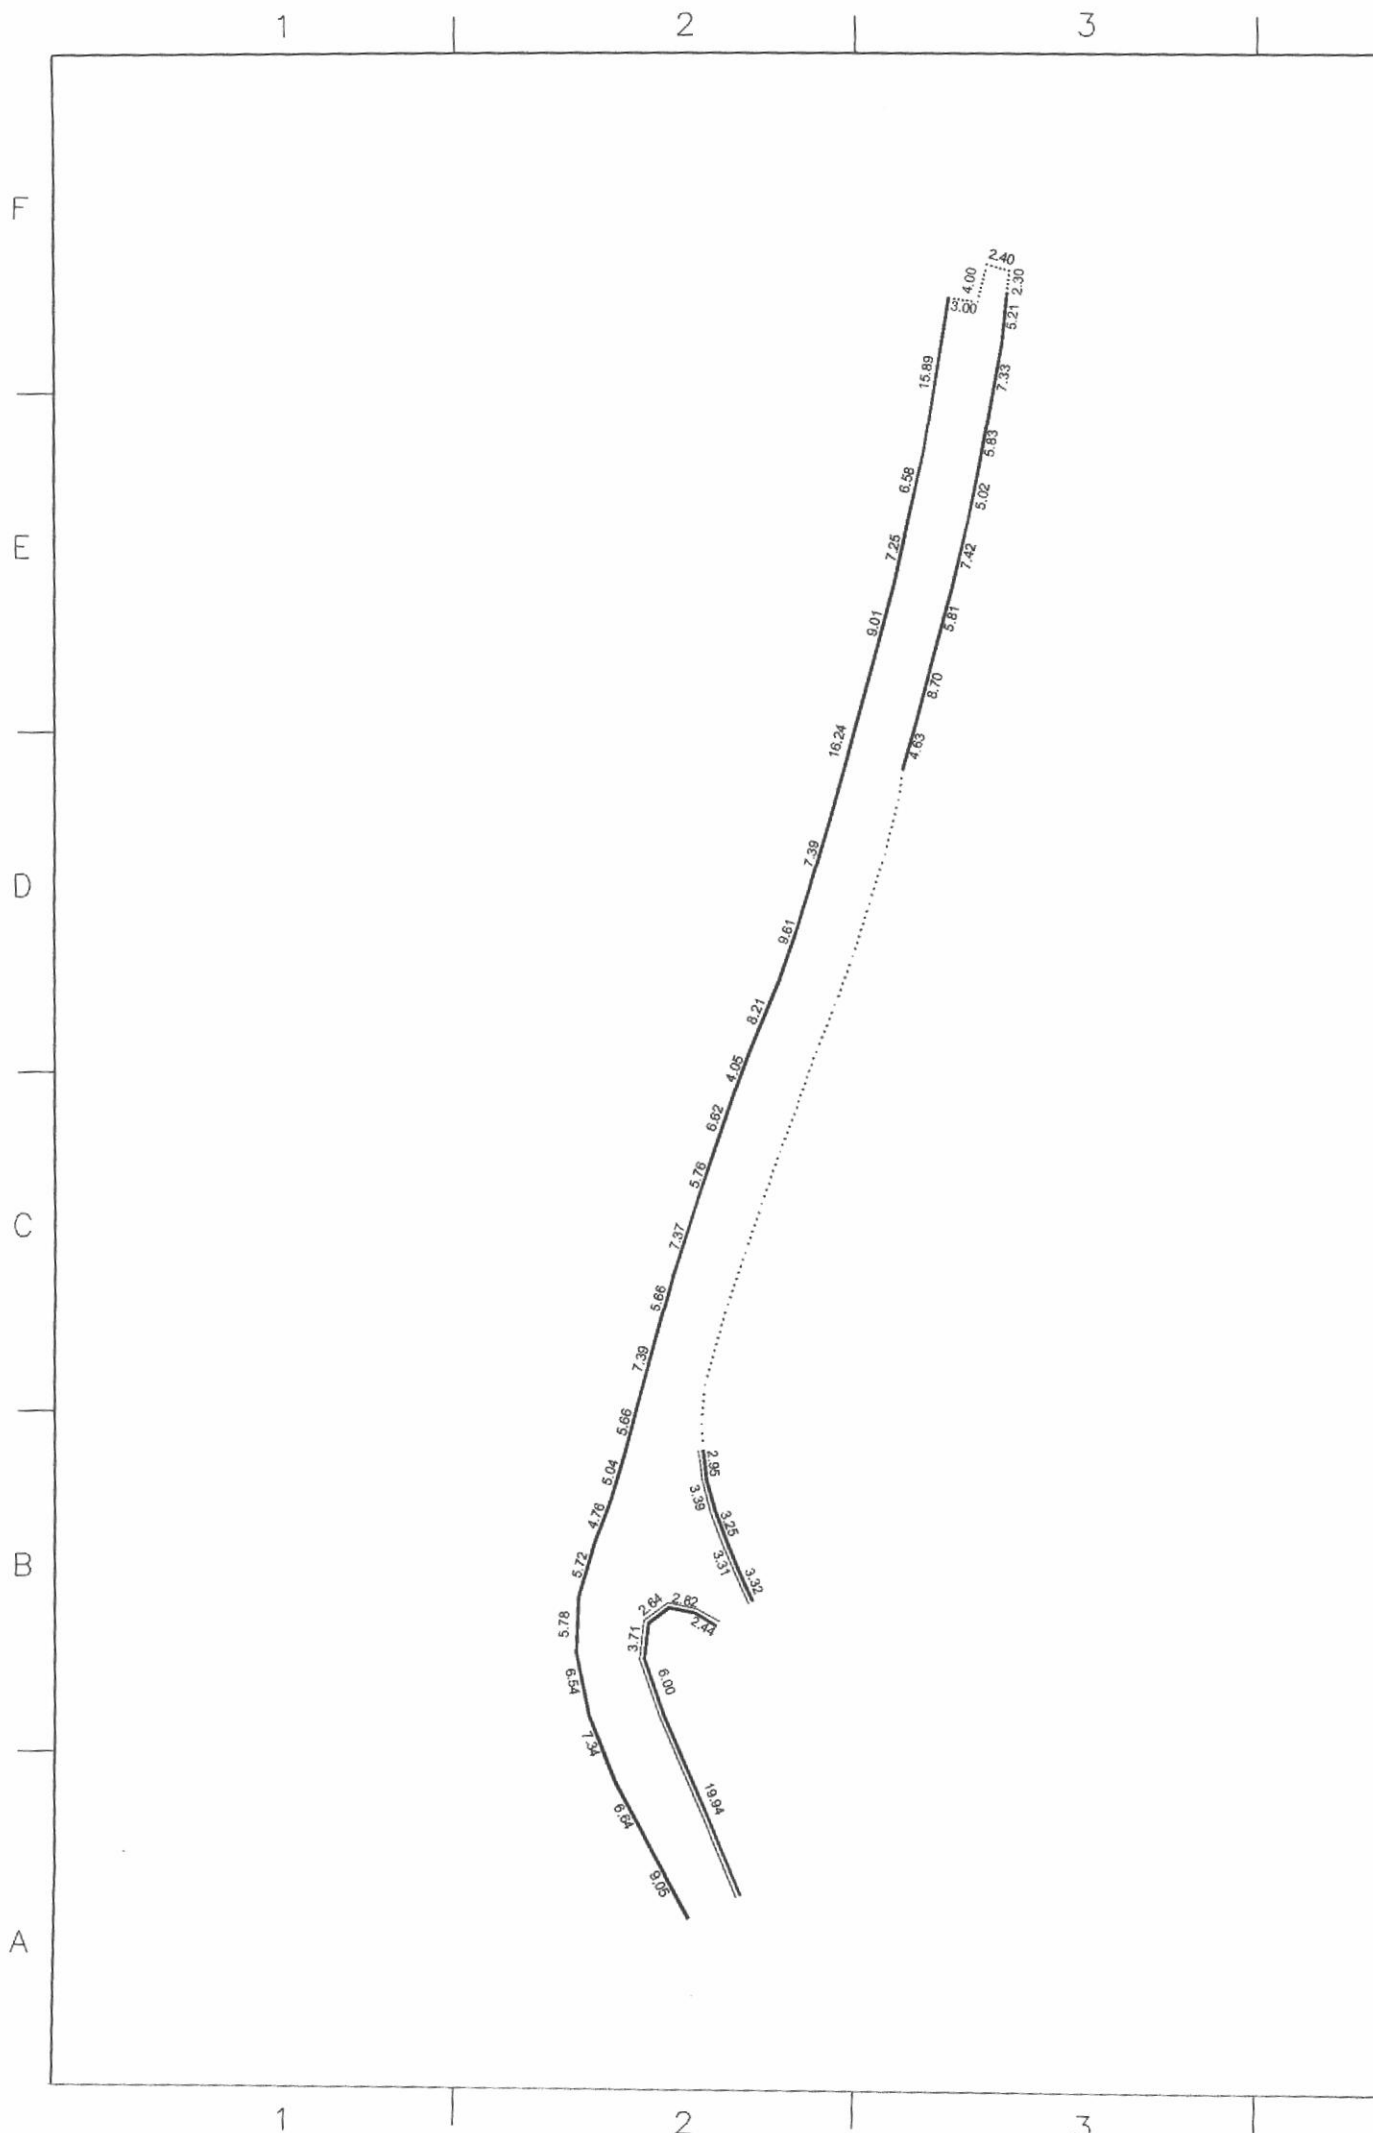

LEGENDA

- MEIO FIO
- ..... LIMITE ASFALTO
- SARJETA EXECUTADA

QUADRO RESUMO

DESCRIÇÃO	QUANT.	UNID.
COMPRIMENTO MEIO FIO	277,36	m
SARJETA LARGURA = 0,50cm	55,21	m
CONFINAMENTO	223,58	m
CBUQ	1205,08	m <sup>2</sup>

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CONGONHAS**  
**SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS**  
**DEPARTAMENTO DE TOPOGRAFIA**

TITULO:  
**EXECUÇÃO DE CBUQ, MEIO FIO, CONFINAMENTO E SARJETA**  
**RUA 08 - CHACREAMENTO ÁGUA BOA**  
**CONGONHAS/MG**


*Ricardo Magalhães Ferreira*  
 Chefe de Departamento de Topografia

*Daniel Aparecido Santos Lima*  
 Diretor de Obras

DETOP: \_\_\_\_\_  
 RICARDO MAGALHÃES FERREIRA

Nº CONTRATO: 078/2020	DATA: AGOSTO/2021	DESENHO: LILIANE	FOLHA: 01/01	FORMATO: A1
--------------------------	----------------------	---------------------	-----------------	----------------

MEDIÇÃO RUA, BASE, IMPRIMAÇÃO, PINTURA DE LIGAÇÃO E CBUQ

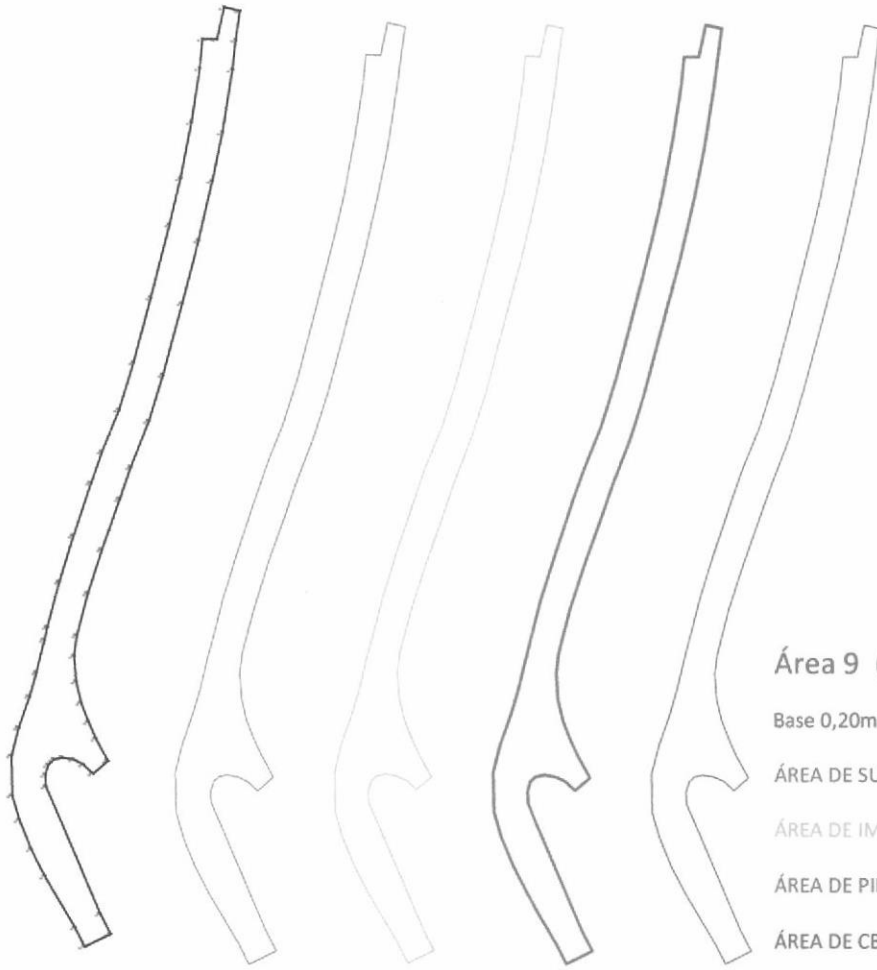

Área 9 (Rua 8 p/ Prefeitura)

Base 0,20m espessura

ÁREA DE SUBLEITO / BASE= 1.273,44m<sup>2</sup>

ÁREA DE IMPRIMAÇÃO= 1.214,56m<sup>2</sup>

ÁREA DE PINTURA DE LIGAÇÃO= 1.214,56m<sup>2</sup>

ÁREA DE CBUQ= 1.214,56m<sup>2</sup>

TÍTULO:


MEDIÇÃO RUA 08 (área 9), SUBLEITO, BASE, IMPRIMAÇÃO, PINTURA DE LIGAÇÃO E CBUQ

- PÉ
- CURVAS INTERMEDIÁRIAS
- CRISTA
- CURVAS MESTRA

EMISSÃO INICIAL	DESCRÇÃO DAS REVISÕES:	NOTAS		VOLUME	
		1 - SISTEMA GEODÉSICO SIRGAS 2000. 2 - SISTEMA DE COORDENADAS UTM - FUSO 23 SUL. 3 - DATUM VERTICAL MARÉGRAFO DE IMBITUBA - MAPGEO 2015. 4 - UNIDADE DE MEDIDA EM METROS. 5 - CURVAS DE NIVEL COM EQUIDISTÂNCIA DE 1 (UM) METRO.		CORTE	ATERRO - m3
RESPONSÁVEL:	CONTRATADA:  TERRAMARES		CONTRATANTE:  PREFEITURA MUNICIPAL DE CONGONHAS MG		
XX/XX/XX	DATA:			VERIFICADO: - APROVADO: -	
00	REV.:	DATA LEVANTAMENTO: 03/08/2021		ESCALA: 1/1	FOLHA: 01/01
				FORMATO: A4	

*Hugo Senra de Matta*  
 Engenheiro Civil  
 Crea: 207310 - MG

# MAPA DE TRAJETO – TRANSPORTE DE BICA CORRIDA

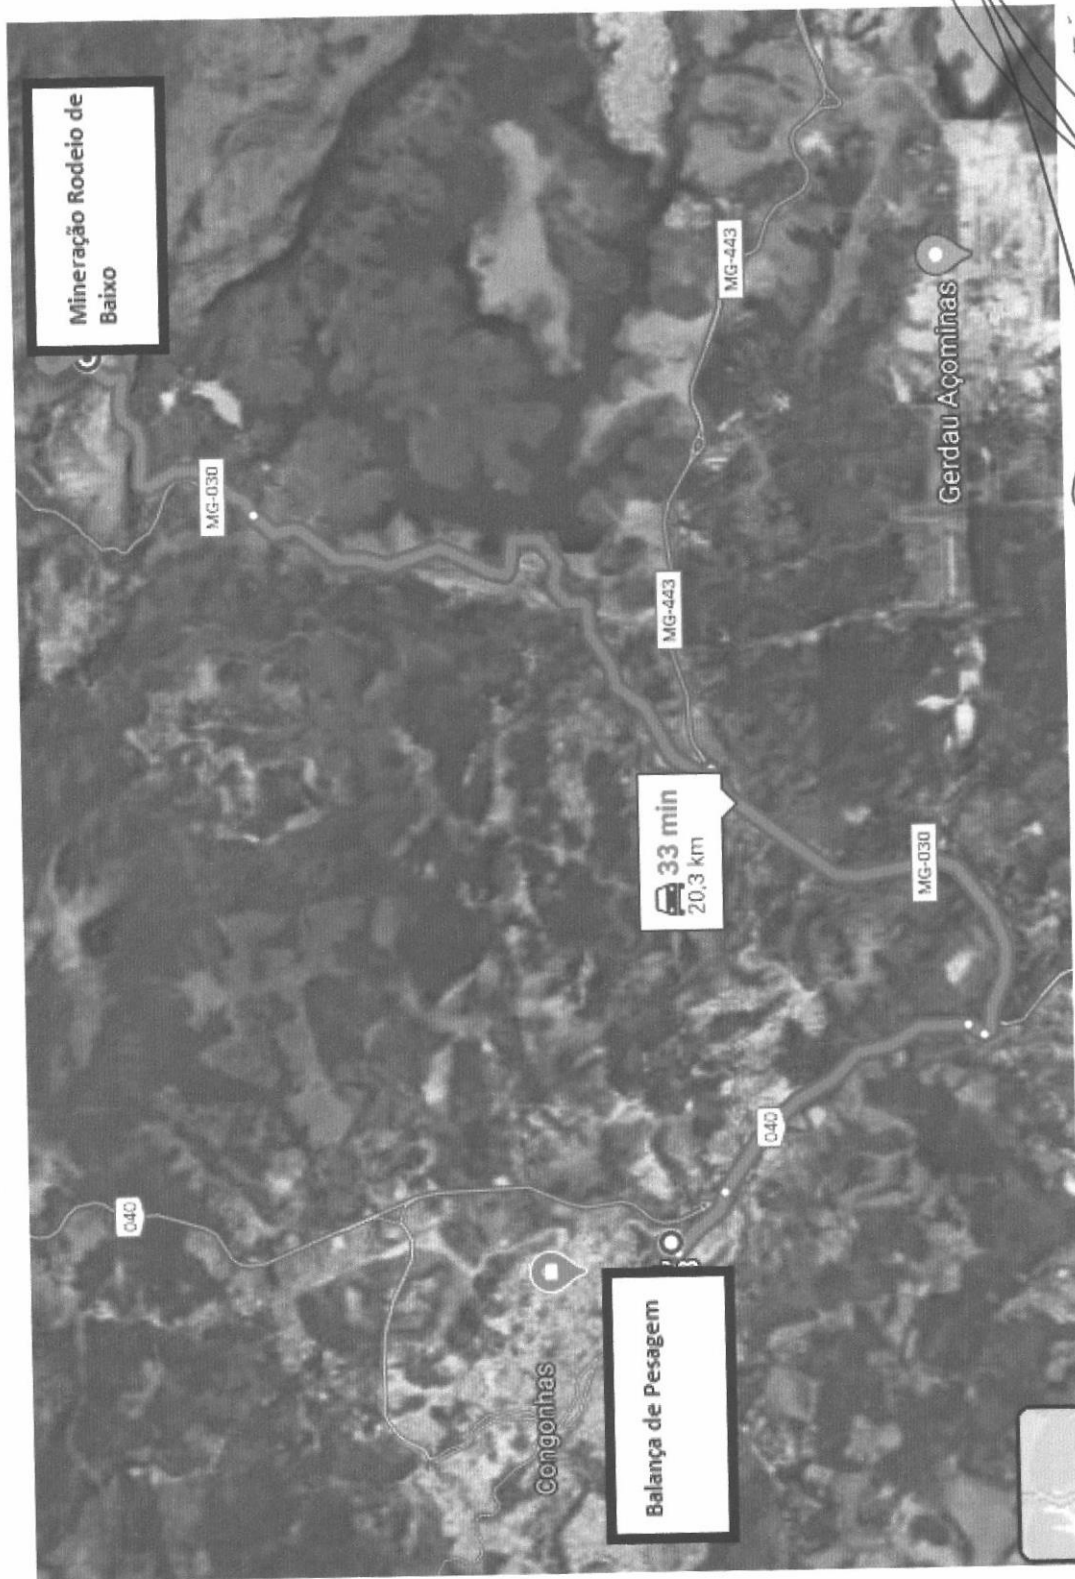

*Hugo Seabra da Silva*  
Engenheiro Civil  
Crea: 03710 - MG

*Daniel Aparecido Santos Lima*  
Diretor de Obras

*Franciele*  
Franciele Indústrias Santos  
Prefeitura de Congonhas  
Tec. Edificações: CREA-141  
1410503595

3508  
Dano



Hugo Scobbiani  
 Diretor de Obras  
 Telefone: 207710-119

Daniel Aparecido Santos Lima  
 Diretor de Obras

Franz de  
 Francisco Indiano Santos  
 Prefeitura de Congonhas  
 Edificações - CFT-00  
 Téc. 1410003995

# MAPA DE TRAJETO – TRANSPORTE DO CBUQ – RUPA 8 – ÁGUA BOA

**OPÇÕES**  
Sair agora

**Enviar rotas para seu smartphone**

**via BR-040**  
5 min sem trânsito  
4.0 km

**DETALHES**

**Conheça Terminal Rodoviário de Congonhas**

Restaurantes, Hotéis, Postos de gasolina, Estacionamentos, Mais

Google

Imagens © 2021 Maxar Technologies, Imagens © 2021 CNES / Airbus, Landart / Copernicus, Maxar Technologies, Dados do mapa © 2021 Brasil, Termos, Privacidade, 2000 pés

Enviar feedback

Postos de gasolina, Supermercados, Hotéis, Mais

USINA GRUPO TERRAMADES

BALANÇA DE CONGONHAS

5 min  
4 km

R. da Chapadão

Congonhas

do Senhor atosinhos

Comunicação Visual

Maximus

Rod. Pres. Juscelino Kubitschek

BHI

Carreiros

A

*Francisclara Santos*  
Prefeitura de Congonhas  
Téc. Edificações  
14110500000

*Daniel Aparecido Santos Lima*  
Diretor de Obras

*Wlgo Seabra do Monte*  
Engenheiro Civil  
Crea: 2073510 - MG

3509  
*Dani*



Terminal Rodoviário de Congonhas, Av  
 R. 8, 204-36 - Congonhas, MG, 36415-0  
 Adicionar destino

Sair agora

OPÇÕES

É obrigatório usar máscara em espaços públicos devido à COVID-19

Enviar rotas para seu smartphone

via BR-040  
 9 min sem trânsito  
 5,0 km

DETALHES

Conheça R. 8, 204-36 - Congonhas

Restaurantes Hóteis Postos de gasolina Estacionamentos

Hugo Sotobom de Matta  
 Engenheiro Civil  
 CRG 202570 - MG

Daniel Aparecido Santos Lima  
 Diretor de Obras

Franco de  
 Francisco Indimara Santos Silva  
 Prefeitura de Congonhas  
 CFT-1-1163  
 Tel.: 14141010996965

3510  
 Pava



# TERRAMARES

3530  
Bom

## RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA

EMPRESA:		LOCADORA TERRAMARES LTDA		DATA:	08/07/2021
OBRA:		PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA E SERVIÇOS COMPLEMENTARES, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MÃO DE OBRA, NO MUNICÍPIO DE CONGONHAS-MG.		DATA INICIAL:	02/03/2020
CONTRATO:		PMC/078/2020	RDO Nº:	493	

DIA DA SEMANA						
2ª	3ª	4ª	5ª	6ª	SÁB	DOM
			X			
EFETIVO TOTAL:			15			
PRESENTES:			15	AUSENTES:		0

CONDIÇÕES DO TEMPO			DADOS CONTRATUAIS		
BOM	MANHÃ	TARDE	NOITE	PRAZO CONTRATUAL:	578
	X	X	X	DIAS CORRIDOS:	493
CHUVA				DIAS RESTANTES:	85
mm					

EFETIVO	DESCRIÇÃO	QUANT		DESCRIÇÃO	QUANT		DESCRIÇÃO	QUANT.	
		PRES.	AUSEN.		PRES.	AUSEN.		PRES.	AUSEN.
	ENGENHEIRO	0		OP. DE MINI ESCAVADEIRA	1		AJUDANTE	4	
	ENCARREGADO	1		OPERADOR DE ESPARGIDOR	0		MOTORISTA BETONEIRA	0	
	OPERADOR DE PATROL	0		OPERADOR DE VIBROACABADORA	0		AJUDANTE DE ASFALTO	4	
	OPERADOR DE ESCAVADEIRA	0		OPERADOR ROLO PNEU	0		RASTILEIRO	2	
	OPERADOR DE ROLO (PÊ DE CARNEIRO)	0		OPERADOR ROLO LISO	0				
	MOTORISTA CAMINHÃO PIPA	0		MOTORISTA	1				
	OPERADOR DE TRATOR AGRÍCOLA	0		PEDREIRO	3		TOTAL	15	0

EQUIPAMENTOS	DESCRIÇÃO	QUANT		DESCRIÇÃO	QUANT		DESCRIÇÃO	QUANT.	
		PRES.	AUSEN.		PRES.	AUSEN.		PRES.	AUSEN.
	PATROL	0		MINI ESCAVADEIRA	1		CAMINHÃO TRAÇADO	0	
	ESCAVADEIRA	0		CAMINHÃO ESPARGIDOR	0		CAMINHÃO BASCULANTE	1	
	ROLO COMPACTADOR (PÊ DE CARNEIRO)	0		VIBROACABADORA	0		PLACA VIBRATÓRIA	1	
	CAMINHÃO PIPA	0		ROLO PNEU	0		CAMINHÃO DE CONCRETO	0	
	TRATOR AGRÍCOLA	0		ROLO LISO	0		TOTAL	3	0

### ITEM DISCRIMINAÇÃO DAS ATIVIDADES

ITEM	DISCRIMINAÇÃO DAS ATIVIDADES
1	EXECUÇÃO DE ESCADA D'AGUA (FORMA E ARMAÇÃO) - RUA SEBASTIÃO VIEIRA - GRAND PARK
2	EXECUÇÃO DE ATERRO ATRÁS DO MEIO FIO - ÁGUA BOA
3	EXECUÇÃO DE CBUQ - RUA SEBASTIÃO VIEIRA - GRAND PARK
4	
5	
6	
7	
8	

### ITEM OBSERVAÇÃO

ITEM	OBSERVAÇÃO
1	OBSERVAÇÃO: ESTÃO SENDO ATERRADOS TODOS OS PONTOS DESIGNADOS PELA CONTRATANTE ATRÁS DO MEIO FIO NO ÁGUA BOA
2	
3	
4	
5	
6	

### GALERIA DE FOTOS


ASSINATURAS:

CONTRATADA

Daniel Aparecido Santos Lima  
Diretor de Obras  
CONTRATANTE

Françoise Indústrias Santos Silva  
 Prefeitura de Congonhas  
 Téc. Edificações e F.M.C.  
 14/07/2021

# TERRAMARES

3531  
Gomes

## RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA

EMPRESA:		LOCADORA TERRAMARES LTDA		DATA:	09/07/2021
OBRA:		PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA E SERVIÇOS COMPLEMENTARES, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MÃO DE OBRA, NO MUNICÍPIO DE CONGONHAS-MG.		DATA INICIAL:	02/03/2020
CONTRATO:		PMC/078/2020	RDO Nº:	494	

DIA DA SEMANA						
2ª	3ª	4ª	5ª	6ª	SÁB	DOM
				X		
EFETIVO TOTAL:						15
PRESENTES:		15		AUSENTES:		0



CONDIÇÕES DO TEMPO				DADOS CONTRATUAIS	
	MANHÃ	TARDE	NOITE	PRAZO CONTRATUAL:	578
BOM	X	X	X	DIAS CORRIDOS:	494
CHUVA				DIAS RESTANTES:	84
mm					

EFETIVO	DESCRIÇÃO	QUANT		DESCRIÇÃO	QUANT		DESCRIÇÃO	QUANT.	
		PRES.	AUSEN.		PRES.	AUSEN.		PRES.	AUSEN.
	ENGENHEIRO	0		OP. DE MINI ESCAVADEIRA	1		AJUDANTE	4	
	ENCARREGADO	1		OPERADOR DE ESPARGIDOR	0		MOTORISTA BETONEIRA	0	
	OPERADOR DE PATROL	0		OPERADOR DE VIBROACABADORA	0		AJUDANTE DE ASFALTO	4	
	OPERADOR DE ESCAVADEIRA	0		OPERADOR ROLO PNEU	0		RASTILEIRO	2	
	OPERADOR DE ROLO (PÉ DE CARNEIRO)	0		OPERADOR ROLO LISO	0				
	MOTORISTA CAMINHÃO PIPA	0		MOTORISTA	1				
	OPERADOR DE TRATOR AGRÍCOLA	0		PEDREIRO	3		TOTAL	15	0

EQUIPAMENTOS	DESCRIÇÃO	QUANT		DESCRIÇÃO	QUANT		DESCRIÇÃO	QUANT.	
		PRES.	AUSEN.		PRES.	AUSEN.		PRES.	AUSEN.
	PATROL	0		MINI ESCAVADEIRA	1		CAMINHÃO TRAÇADO	0	
	ESCAVADEIRA	0		CAMINHÃO ESPARGIDOR	0		CAMINHÃO BASCULANTE	1	
	ROLO COMPACTADOR (PÉ DE CARNEIRO)	0		VIBROACABADORA	0		PLACA VIBRATÓRIA	1	
	CAMINHÃO PIPA	0		ROLO PNEU	0		CAMINHÃO DE CONCRETO	0	
	TRATOR AGRÍCOLA	0		ROLO LISO	0		TOTAL	3	0

ITEM	DISCRIMINAÇÃO DAS ATIVIDADES
1	EXECUÇÃO DE ESCADA D'AGUA (FORMA E ARMAÇÃO) - RUA SEBASTIÃO VIEIRA - GRAND PARK
2	EXECUÇÃO DE ATERRO ATRÁS DO MEIO FIO - ÁGUA BOA
3	EXECUÇÃO DE CBUQ - RUA SEBASTIÃO VIEIRA - GRAND PARK
4	EXECUÇÃO DE MEIO FIO - ESTRADA ESMERIL
5	
6	
7	
8	

ITEM	DISCRIMINAÇÃO DAS ATIVIDADES
1	OBSERVAÇÃO: ESTÃO SENDO ATERRADOS TODOS OS PONTOS DESIGNADOS PELA CONTRATANTE ATRÁS DO MEIO FIO NO ÁGUA BOA
2	
3	A contratante atenta pela qualidade (granulometria) do material aplicado no Grand Park
4	
5	
6	

GALERIA DE FOTOS	
	
ASSINATURAS:	CONTRATADA
	CONTRATANTE

Daniel Aparecido Santos Lima  
 Diretor de Obras  
 Prefeitura de Congonhas  
 Têc. Flávio Soares CFT-1-MG  
 141060995

# TERRAMARES

3534  
OCM

## RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA

EMPRESA:		LOCADORA TERRAMARES LTDA		DATA	12/07/2021
OBRA:		PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA E SERVIÇOS COMPLEMENTARES, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MÃO DE OBRA, NO MUNICÍPIO DE CONGONHAS-MG.		DATA INICIAL	02/03/2020
		CONTRATO:	PMC/078/2020	RDO Nº:	497

DIA DA SEMANA						
2ª	3ª	4ª	5ª	6ª	SÁB	DOM
X						
EFETIVO TOTAL: 13						
PRESENTES:		13		AUSENTES:		0

CONDIÇÕES DO TEMPO			DADOS CONTRATUAIS		
	MANHÃ	TARDE	NOITE	PRAZO CONTRATUAL:	578
BOM	X	X	X	DIAS CORRIDOS:	497
CHUVA				DIAS RESTANTES:	81
mm					

ELETIVO	DESCRIÇÃO	QUANT		DESCRIÇÃO	QUANT		DESCRIÇÃO	QUANT.	
		PRES.	AUSEN.		PRES.	AUSEN.		PRES.	AUSEN.
	ENGENHEIRO	0		OP. DE MINI ESCAVADEIRA	1		AJUDANTE	5	
	ENCARREGADO	0		OPERADOR DE ESPARGIDOR	0		MOTORISTA BETONEIRA	0	
	OPERADOR DE PATROL	1		OPERADOR DE VIBROACABADORA	0		AJUDANTE DE ASFALTO	0	
	OPERADOR DE ESCAVADEIRA	0		OPERADOR ROLO PNEU	0		RASTILEIRO	0	
	OPERADOR DE ROLO (PÉ DE CARNEIRO)	1		OPERADOR ROLO LISO	0				
	MOTORISTA CAMINHÃO PIPA	1		MOTORISTA	0				
	OPERADOR DE TRATOR AGRÍCOLA	1		PEDREIRO	3		TOTAL	13	0

EQUIPAMENTOS	DESCRIÇÃO	QUANT		DESCRIÇÃO	QUANT		DESCRIÇÃO	QUANT.	
		PRES.	AUSEN.		PRES.	AUSEN.		PRES.	AUSEN.
	PATROL	1		MINI ESCAVADEIRA	1		CAMINHÃO TRAÇADO	0	
	ESCAVADEIRA	0		CAMINHÃO ESPARGIDOR	0		CAMINHÃO BASCULANTE	0	
	ROLO COMPACTADOR (PÉ DE CARNEIRO)	1		VIBROACABADORA	0		PLACA VIBRATÓRIA	0	
	CAMINHÃO PIPA	1		ROLO PNEU	0		CAMINHÃO DE CONCRETO	0	
	TRATOR AGRÍCOLA	1		ROLO LISO	0		TOTAL	5	0

ITEM	DISCRIMINAÇÃO DAS ATIVIDADES
1	EXECUÇÃO DE ESCADA D'AGUA (FORMA E ARMAÇÃO) - RUA SEBASTIÃO VIEIRA - GRAND PARK
2	EXECUÇÃO DE ATERRO ATRÁS DO MEIO FIO - RUA SEBASTIÃO VIEIRA - GRAND PARK
3	EXECUÇÃO DE ASSENTAMENTO DE MEIO FIO - ESTRADA ESMERIL
4	EXECUÇÃO DE TRATAMENTO DE BASE - AREA 9 (AGUA BOA)
5	
6	
7	
8	

ITEM	OBSERVAÇÃO
1	
2	
3	
4	
5	
6	

### GALERIA DE FOTOS

ASSINATURAS:	CONTRATADA
	CONTRATANTE

Daniel Aparecido Santos Lima  
Diretor de Obras

Prac. Edifícios de  
14 10608895

# TERRAMARES

3560  
Dm

## RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA

EMPRESA:		LOCADORA TERRAMARES LTDA		DATA:	20/07/2021
OBRA:		PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA E SERVIÇOS COMPLEMENTARES, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MÃO DE OBRA, NO MUNICÍPIO DE CONGONHAS-MG.		DATA INICIAL:	02/03/2020
		CONTRATO:	PMC/078/2020	RDO Nº:	505

DIA DA SEMANA						
2ª	3ª	4ª	5ª	6ª	SÁB	DOM
	X					
EFETIVO TOTAL: 13						
PRESENTES: 13			AUSENTES: 0			

CONDIÇÕES DO TEMPO				DADOS CONTRATUAIS	
	MANHÃ	TARDE	NOITE	PRAZO CONTRATUAL:	578
BOM	X	X	X	DIAS CORRIDOS:	505
CHUVA				DIAS RESTANTES:	73
mm					

EFETIVO	DESCRIÇÃO	QUANT		DESCRIÇÃO	QUANT		DESCRIÇÃO	QUANT.	
		PRES.	AUSEN.		PRES.	AUSEN.		PRES.	AUSEN.
	ENGENHEIRO	1		OP. DE MINI ESCAVADEIRA	0		AJUDANTE	2	
	ENCARREGADO	1		OPERADOR DE ESPARGIDOR	1		MOTORISTA BETONEIRA	0	
	OPERADOR DE PATROL	0		OPERADOR DE VIBROACABADORA	0		AJUDANTE DE ASFALTO	4	
	OPERADOR DE ESCAVADEIRA	0		OPERADOR ROLO PNEU	0		RASTILEIRO	2	
	OPERADOR DE ROLO (PÉ DE CARNEIRO)	0		OPERADOR ROLO LISO	0				
	MOTORISTA CAMINHÃO PIPA	0		MOTORISTA	0				
	OPERADOR DE TRATOR AGRÍCOLA	0		PEDREIRO	2		TOTAL	13	0

EQUIPAMENTOS	DESCRIÇÃO	QUANT		DESCRIÇÃO	QUANT		DESCRIÇÃO	QUANT.	
		PRES.	AUSEN.		PRES.	AUSEN.		PRES.	AUSEN.
	PATROL	0		MINI ESCAVADEIRA	0		CAMINHÃO TRAÇADO	1	
	ESCAVADEIRA	0		CAMINHÃO ESPARGIDOR	1		CAMINHÃO BASCULANTE	0	
	ROLO COMPACTADOR (PÉ DE CARNEIRO)	0		VIBROACABADORA	0		PLACA VIBRATÓRIA	0	
	CAMINHÃO PIPA	0		ROLO PNEU	0		CAMINHÃO DE CONCRETO	0	
	TRATOR AGRÍCOLA	0		ROLO LISO	0		TOTAL	2	0

ITEM	DISCRIMINAÇÃO DAS ATIVIDADES
1	EXECUÇÃO DE IMPRIMAÇÃO – ÁREA 9 (RUA 8 - PREFEITURA) - (AGUA BOA)
2	EXECUÇÃO DE SALGAMENTO – ÁREA 9 (RUA 8 - PREFEITURA) - (AGUA BOA)
3	EXECUÇÃO DE PREPARAÇÃO DE SARJETA EM V – ESTRADA ESMERIL
4	
5	
6	
7	
8	

ITEM	DISCRIMINAÇÃO DAS ATIVIDADES
1	OBSERVAÇÃO: FOI AUTORIZADO O SALGAMENTO DA ÁREA 9 (RUA 8 - PREFEITURA) , DEVIDO AO ALTO FLUXO DE CAMINHÃO NO LOCAL (ENTRADA DO LIXÃO)
2	
3	
4	
5	
6	

GALERIA DE FOTOS	
ASSINATURAS:	CONTRATADA

Daniel Aparecido Santos Lima  
CONTRATADO

Fronteira Indústria e Comércio Ltda.  
Prestadora de Serviços  
Tcc. Edificações CST-415  
17030996

# TERRAMARES

3546  
Dov

## RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA

EMPRESA:		LOCADORA TERRAMARES LTDA		DATA:	24/07/2021
OBRA:		PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA E SERVIÇOS COMPLEMENTARES, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MÃO DE OBRA, NO MUNICÍPIO DE CONGONHAS-MG.		DATA INICIAL:	02/03/2020
		CONTRATO:	PMC/078/2020	RDO Nº:	509

DIA DA SEMANA						
2ª	3ª	4ª	5ª	6ª	SÁB	DOM
					X	
EFETIVO TOTAL:						18
PRESENTES:		18		AUSENTES:		0

CONDIÇÕES DO TEMPO			DADOS CONTRATUAIS		
	MANHÃ	TARDE	NOITE	PRAZO CONTRATUAL:	578
BOM	X	X	X	DIAS CORRIDOS:	509
CHUVA				DIAS RESTANTES:	69
mm					



ELETIVO	DESCRIÇÃO	QUANT		DESCRIÇÃO	QUANT		DESCRIÇÃO	QUANT.	
		PRES.	AUSEN.		PRES.	AUSEN.		PRES.	AUSEN.
	ENGENHEIRO	0		OP. DE MINI ESCAVADEIRA	0		AJUDANTE	3	
	ENCARREGADO	0		OPERADOR DE ESPARGIDOR	1		MOTORISTA BETONEIRA	1	
	OPERADOR DE PATROL	0		OPERADOR DE VIBROACABADORA	1		AJUDANTE DE ASFALTO	4	
	OPERADOR DE ESCAVADEIRA	0		OPERADOR ROLO PNEU	1		RASTILEIRO	4	
	OPERADOR DE ROLO (PÉ DE CARNEIRO)	0		OPERADOR ROLO LISO	1				
	MOTORISTA CAMINHÃO PIPA	0		MOTORISTA	3				
	OPERADOR DE TRATOR AGRÍCOLA	0		PEDREIRO	2		TOTAL	18	0

EQUIPAMENTOS	DESCRIÇÃO	QUANT		DESCRIÇÃO	QUANT		DESCRIÇÃO	QUANT.	
		PRES.	AUSEN.		PRES.	AUSEN.		PRES.	AUSEN.
	PATROL	0		MINI ESCAVADEIRA	0		CAMINHÃO TRAÇADO	0	
	ESCAVADEIRA	0		CAMINHÃO ESPARGIDOR	1		CAMINHÃO BASCULANTE	3	
	ROLO COMPACTADOR (PÉ DE CARNEIRO)	0		VIBROACABADORA	1		PLACA VIBRATÓRIA	0	
	CAMINHÃO PIPA	0		ROLO PNEU	1		CAMINHÃO DE CONCRETO	1	
	TRATOR AGRÍCOLA	0		ROLO LISO	1		TOTAL	8	0

ITEM	DISCRIMINAÇÃO DAS ATIVIDADES
1	EXECUÇÃO DE PINTURA DE LIGAÇÃO - ÁREA 9 (RUA 8 - PREFEITURA) - (AGUA BOA)
2	EXECUÇÃO DE CBUQ- ÁREA 9 (RUA 8 - PREFEITURA) - (AGUA BOA)
3	CONCRETAGEM DE SARJETA EM V - ESTRADA ESMERIL
4	
5	
6	
7	
8	

ITEM	OBSERVAÇÃO
1	
2	
3	
4	
5	
6	

### GALERIA DE FOTOS

ASSINATURAS: 	CONTRATADA 
	Daniel Aparecido Santos Lima CONTRATANTE Diretor de Obras

Engenharia e Construção Civil  
 Daniel Aparecido Santos Lima  
 Diretor de Obras  
 C.F.T-MG

# TERRAMARES

3548  
Dano

## RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA

EMPRESA: <b>LOCADORA TERRAMARES LTDA</b>		DATA: <b>26/07/2021</b>
OBRA: <b>PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA E SERVIÇOS COMPLEMENTARES, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MÃO DE OBRA, NO MUNICÍPIO DE CONGONHAS-MG.</b>		DATA INICIAL: <b>02/03/2020</b>
CONTRATO: <b>PMC/078/2020</b>	RDO Nº: <b>511</b>	

DIA DA SEMANA						
2ª	3ª	4ª	5ª	6ª	SÁB	DOM
X						
EFETIVO TOTAL: <b>21</b>						
PRESENTES: <b>21</b>			AUSENTES: <b>0</b>			

CONDIÇÕES DO TEMPO			DADOS CONTRATUAIS	
	MANHÃ	TARDE	NOITE	
BOM	X	X	X	PRAZO CONTRATUAL: <b>578</b>
CHUVA				DIAS CORRIDOS: <b>511</b>
mm				DIAS RESTANTES: <b>67</b>

EFETIVO	DESCRIÇÃO	QUANT		DESCRIÇÃO	QUANT		DESCRIÇÃO	QUANT.	
		PRES.	AUSEN.		PRES.	AUSEN.		PRES.	AUSEN.
	ENGENHEIRO	1		OP. DE MINI ESCAVADEIRA	0		AJUDANTE	3	
	ENCARREGADO	1		OPERADOR DE ESPARGIDOR	1		MOTORISTA BETONEIRA	0	
	OPERADOR DE PATROL	0		OPERADOR DE VIBROACABADORA	1		AJUDANTE DE ASFALTO	6	
	OPERADOR DE ESCAVADEIRA	0		OPERADOR ROLO PNEU	1		RASTILEIRO	4	
	OPERADOR DE ROLO (PÉ DE CARNEIRO)	0		OPERADOR ROLO LISO	1				
	MOTORISTA CAMINHÃO PIPA	0		MOTORISTA	1				
	OPERADOR DE TRATOR AGRÍCOLA	0		PEDREIRO	2		TOTAL	21	0

EQUIPAMENTOS	DESCRIÇÃO	QUANT		DESCRIÇÃO	QUANT		DESCRIÇÃO	QUANT.	
		PRES.	AUSEN.		PRES.	AUSEN.		PRES.	AUSEN.
	PATROL	0		MINI ESCAVADEIRA	0		CAMINHÃO TRAÇADO	3	
	ESCAVADEIRA	0		CAMINHÃO ESPARGIDOR	1		CAMINHÃO BASCULANTE	0	
	ROLO COMPACTADOR (PÉ DE CARNEIRO)	0		VIBROACABADORA	1		PLACA VIBRATÓRIA	0	
	CAMINHÃO PIPA	0		ROLO PNEU	1		CAMINHÃO DE CONCRETO	0	
	TRATOR AGRÍCOLA	0		ROLO LISO	1		TOTAL	7	0


### ITEM DISCRIMINAÇÃO DAS ATIVIDADES

ITEM	DISCRIMINAÇÃO DAS ATIVIDADES
1	EXECUÇÃO DE ASSENTAMENTO DE MEIO FIO – ESTRADA ESMERIL
2	EXECUÇÃO DE PINTURA DE LIGAÇÃO – ÁREA 9 (RUA 8 - PREFEITURA) - (AGUA BOA)
3	EXECUÇÃO DE CBUQ– ÁREA 9 (RUA 8 - PREFEITURA) - (AGUA BOA)
4	
5	
6	
7	
8	

### ITEM

ITEM	OBSERVAÇÃO
1	
2	
3	
4	
5	
6	

### GALERIA DE FOTOS



ASSINATURAS:   **Daniel Aparecido Santos Lima**  
 CONTRATADA CONTRATANTE  
 Diretor de Obras

*Franzini*  
 Franzielle Indaleno Santos Silva  
 Psicóloga - CRP 01/00000  
 Terc. Edição: 2017

# TERRAMARES

3552  
DWD

## RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA

EMPRESA: <b>LOCADORA TERRAMARES LTDA</b>		DATA: <b>30/07/2021</b>
OBRA: <b>PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA E SERVIÇOS COMPLEMENTARES, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MÃO DE OBRA, NO MUNICÍPIO DE CONGONHAS-MG.</b>		DATA INICIAL: <b>02/03/2020</b>
CONTRATO: <b>PMC/078/2020</b>	RDO Nº: <b>515</b>	

DIA DA SEMANA						
2ª	3ª	4ª	5ª	6ª	SÁB	DOM
				X		
EFETIVO TOTAL: 7						
PRESENTES: 7			AUSENTES: 0			

CONDIÇÕES DO TEMPO			DADOS CONTRATUAIS	
	MANHÃ	TARDE	NOITE	
BOM	X	X	X	PRAZO CONTRATUAL: 578
CHUVA				DIAS CORRIDOS: 515
mm				DIAS RESTANTES: 63

EFETIVO	DESCRIÇÃO	QUANT		DESCRIÇÃO	QUANT		DESCRIÇÃO	QUANT.	
		PRES.	AUSEN.		PRES.	AUSEN.		PRES.	AUSEN.
	ENGENHEIRO	0		OP. DE MINI ESCAVADEIRA	0		AJUDANTE	4	
	ENCARREGADO	0		OPERADOR DE ESPARGIDOR	0		MOTORISTA BETONEIRA	0	
	OPERADOR DE PATROL	0		OPERADOR DE VIBROACABADORA	0		AJUDANTE DE ASFALTO	0	
	OPERADOR DE ESCAVADEIRA	0		OPERADOR ROLO PNEU	0		RASTILEIRO	0	
	OPERADOR DE ROLO (PÉ DE CARNEIRO)	0		OPERADOR ROLO LISO	0				
	MOTORISTA CAMINHÃO PIPA	0		MOTORISTA	0				
	OPERADOR DE TRATOR AGRÍCOLA	0		PEDREIRO	3		TOTAL	7	0

EQUIPAMENTOS	DESCRIÇÃO	QUANT		DESCRIÇÃO	QUANT		DESCRIÇÃO	QUANT.	
		PRES.	AUSEN.		PRES.	AUSEN.		PRES.	AUSEN.
	PATROL	0		MINI ESCAVADEIRA	0		CAMINHÃO TRAÇADO	0	
	ESCAVADEIRA	0		CAMINHÃO ESPARGIDOR	0		CAMINHÃO BASCULANTE	0	
	ROLO COMPACTADOR (PÉ DE CARNEIRO)	0		VIBROACABADORA	0		PLACA VIBRATÓRIA	1	
	CAMINHÃO PIPA	0		ROLO PNEU	0		CAMINHÃO DE CONCRETO	0	
	TRATOR AGRÍCOLA	0		ROLO LISO	0		TOTAL	1	0


ITEM	DISCRIMINAÇÃO DAS ATIVIDADES
1	EXECUÇÃO DE REATERRO E COMPACTAÇÃO MANUAL EM TORNO DA CANALETA - ESTRADA ESMERIL
2	EXECUÇÃO DE ASSENTAMENTO DE MEIO FIO - ÁREA 9 (RUA 8 - PREFEITURA) - (AGUA BOA)
3	
4	
5	
6	
7	
8	

ITEM	OBSERVAÇÃO
1	
2	
3	
4	
5	
6	

### GALERIA DE FOTOS

ASSINATURAS:

CONTRATADA

  
**Daniel Aparecido Santos Lima**  
 Diretor de Obras  
 CONTRATANTE

Município de Congonhas - MG  
 Prefeitura de Congonhas  
 Tec. Edificações/CFT-MG  
 1411620965



**PREFEITURA DE CONGONHAS**  
**SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS**  
**PLANILHA DE MEDIÇÃO - DÉCIMA SEXTA MEDIÇÃO CONSIDERANDO 3º TERMO ADITIVO**

BDI: 24,67%

OBJETO: Execução de obras para pavimentação asfáltica e serviços complementares, com fornecimento de materiais e mão de obra, no Município de Congonhas - MG.

CONTRATADA: Locadora Terramares Ltda

ORDEM DE SERVIÇOS: 02/03/2020

PRAZOS: 12 MESES PARA A OBRA - 16 MESES PARA O CONTRATO

PREVISÃO DE TÉRMINO DE OBRA: 04/02/2022

PREVISÃO DE TÉRMINO DE CONTRATO: 20/03/2022

LOCAL: CHACREAMENTO ÁGUA BOA

CONTRATO Nº PMC/078/2020 de 20/02/2020

PRC Nº 193/2019

CONCORRÊNCIA Nº PMC/012/2019

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº PMC/9275/2019

NOTA FISCAL Nº 2283 - 28/09/2021

Período: 01/08/2021 A 31/08/2021

VALOR DO CONTRATO: R\$ 18.243.203,90  
 MEDIDO FATURADO: R\$ 3.727,71  
 ACUMULADO FATURADO: R\$ 12.479.067,58  
 SALDO A MEDIR: R\$ 5.764.136,32

100,00%  
 0,02%  
 68,40%  
 31,60%

ITEM	DESCRIÇÃO	QUANTITATIVOS				VALORES							
		UNIDADE	QUANTITATIVO PREVISTO	ACUM. ANTERIOR	EXECUTADO REALIZADO	ACUM. FATURADO	SALDO A EXECUTAR	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL PREVISTO	ACUM. ANTERIOR	MEDIDO EXECUTADO	ACUM. FATURADO	SALDO A EXECUTAR
1	<b>MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO</b>												
1.1	MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DA OBRA	%	0,00588	0,00	0,000001	0,004036	0,001849	R\$ 13.578.338,64	R\$ 79.906,44	R\$ 54.778,83	R\$ 17,33	R\$ 54.796,16	R\$ 25.110,29
2	<b>INSTALAÇÃO DA OBRA</b>												
2.1	ESCRITÓRIO DA FISCALIZAÇÃO TIPO I - P. SUDECAP	UN	1,00	1,00		1,00	0,00	R\$ 2.829,47	R\$ 2.829,47	R\$ 2.829,47	-	R\$ 2.829,47	R\$ -
2.2	ESCRITÓRIO DA EMPREITEIRA TIPO I - P. SUDECAP	UN	1,00	1,00		1,00	0,00	R\$ 2.829,47	R\$ 2.829,47	R\$ 2.829,47	-	R\$ 2.829,47	R\$ -
2.3	VESTIÁRIO TIPO II - P. SUDECAP	UN	1,00	1,00		1,00	0,00	R\$ 4.350,05	R\$ 4.350,05	R\$ 4.350,05	-	R\$ 4.350,05	R\$ -
2.4	DEPÓSITO E FERRAMENTARIA TIPO I - P. SUDECAP	UN	1,00	1,00		1,00	0,00	R\$ 1.940,11	R\$ 1.940,11	R\$ 1.940,11	-	R\$ 1.940,11	R\$ -
2.5	INSTALAÇÃO SANITÁRIA TIPO II - P. SUDECAP	UN	1,00	1,00		1,00	0,00	R\$ 2.987,58	R\$ 2.987,58	R\$ 2.987,58	-	R\$ 2.987,58	R\$ -
2.6	REFEITÓRIO TIPO II - P. SUDECAP	UN	1,00	1,00		1,00	0,00	R\$ 2.067,91	R\$ 2.067,91	R\$ 2.067,91	-	R\$ 2.067,91	R\$ -
2.7	PLACA DE OBRA EM LONA IMPRESSÃO DIGITAL - PADRÃO SUDECAP	M2	48,00	24,00		24,00	24,00	R\$ 151,65	R\$ 7.279,20	R\$ 3.639,60	-	R\$ 3.639,60	R\$ 3.639,60
2.8	BANHEIRO QUÍMICO (2 UN) COM MANUTENÇÃO	MES	12,00	2,50		2,50	9,50	R\$ 385,23	R\$ 4.622,76	R\$ 963,08	-	R\$ 963,08	R\$ 3.659,69
3	<b>TERRAPLENAGEM</b>												
3.1	DESMATAMENTO, DESTOCAMENTO E LIMPEZA, EXCL., TRANSPORTE ATÉ 50 M	M2	86.429,27	81910,47		81910,47	4518,80	R\$ 0,52	R\$ 44.943,22	R\$ 42.593,44	-	R\$ 42.593,44	R\$ 2.349,78
3.2	ESCAVAÇÃO E CARGA DE MATERIAL DE 1ª CATEGORIA	M3	90.173,92	48997,14		48997,14	41186,78	R\$ 4,00	R\$ 360.695,68	R\$ 195.948,57	-	R\$ 195.948,57	R\$ 164.747,11
3.3	TRANSPORTE DE MATERIAL DE QUALQUER NATUREZA, 1 KM < DMT <= 2 KM	M3	53.016,00	5648,68		5648,68	47367,32	R\$ 2,90	R\$ 153.746,40	R\$ 16.381,17	-	R\$ 16.381,17	R\$ 137.365,23
3.4	TRANSPORTE DE MATERIAL DE QUALQUER NATUREZA DMT > 5 KM	M3XKM	289.000,00	242856,47		242856,47	46143,53	R\$ 1,37	R\$ 395.930,00	R\$ 332.713,36	-	R\$ 332.713,36	R\$ 63.216,64
3.5	ATERRO COMPACTADO COM ROLO VIBRATORIO	M3	46.400,00	4249,37		4249,37	42150,63	R\$ 3,99	R\$ 185.136,00	R\$ 16.954,97	-	R\$ 16.954,97	R\$ 168.181,03
3.6	ESCAVAÇÃO MECÂNICA DE VALAS COM DESCARGA LATERAL H <= 1,5 M	M3	2.700,00	1310,67		1310,67	1389,33	R\$ 4,29	R\$ 11.583,00	R\$ 5.622,77	-	R\$ 5.622,77	R\$ 5.960,23
3.7	REATERRO DE VALA MANUAL	M3	220,00	0,00		0,00	220,00	R\$ 51,16	R\$ 11.255,20	R\$ -	-	R\$ -	R\$ 11.255,20
3.8	REATERRO DE VALA COMPACTADO COM EQUIP. PLACA VIBRATORIA OU EQUIVALENTE	M3	1.843,09	844,95		844,95	998,14	R\$ 22,90	R\$ 42.206,76	R\$ 19.349,43	-	R\$ 19.349,43	R\$ 22.857,33
3.9	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE TERRENO COM PLACA VIBRATORIA	M3	583,16	594,76		594,76	-11,60	R\$ 4,75	R\$ 2.770,01	R\$ 2.825,11	-	R\$ 2.825,11	R\$ -
3.10	REATERRO DE VALA COM AREIA (COM ADENSAMENTO HIDRAULICO)	M3	145,00	0,00		0,00	145,00	R\$ 111,22	R\$ 16.126,90	R\$ -	-	R\$ -	R\$ 16.126,90

*Handwritten signature and initials*

*Handwritten signature*

*Handwritten signature*

ITEM	DESCRIÇÃO	QUANTITATIVOS						VALORES					
		UNIDADE	QUANTITATIVO PREVISTO	ACUM. ANTERIOR	EXECUTADO REALIZADO	ACUM. FATURADO	SALDO A EXECUTAR	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL PREVISTO	ACUM. ANTERIOR	MEDIDO EXECUTADO	ACUM. FATURADO	SALDO A EXECUTAR
3.11	TRANSPORTE DE MATERIAL DE QUALQUER NATUREZA DMT = 25 KM	M3XKM	7.150,00	0,00				1,37	R\$ 9.795,50	R\$ -	R\$ -	R\$ 9.795,50	
4	<b>PAVIMENTAÇÃO</b>												
4.1	CAPINA E VARRIÇÃO DE PAVIMENTO	M2	450,00	0,00				2,84	R\$ 1.278,00	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.278,00	
4.2	ESCAVAÇÃO E CARGA DE MATERIAL DE 1ª CATEGORIA PARA REFORÇO DE SUBLEITO	M3	74.400,00	255,17				2,64	R\$ 196.416,00	R\$ 673,65	R\$ 673,65	R\$ 195.742,35	
4.3	REFORÇO DO SUB-LEITO COMPACTADO EXCELSAVE E CARGA COMPACTADO (PROCTOR INTERMEDIÁRIO)	M3	33.000,00	758,42				6,12	R\$ 201.960,00	R\$ 4.641,53	R\$ 4.641,53	R\$ 197.318,47	
4.4	TRANSPORTE DE MATERIAL DE QUALQUER NATUREZA DMT > 5 KM	M3XKM	372.000,00	10084,65				1,37	R\$ 509.640,00	R\$ 13.815,97	R\$ 13.815,97	R\$ 486.824,03	
4.5	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DO SUBLEITO	M2	135.652,79	124573,48				1,48	R\$ 201.062,13	R\$ 184.368,75	R\$ 184.368,75	R\$ 16.693,38	
4.6	SUB-BASE ESTAB. GRANUL. ENERGIA PROCTOR INTERMED. COM CANGA DE MINÉRIO DE FERRO E=0,125 M	M3	14.310,97	3734,84				74,84	R\$ 1.071.032,99	R\$ 279.515,09	R\$ 279.515,09	R\$ 791.517,91	
4.7	BASE ESTAB. GRANUL. ENERGIA PROCTOR INTERMEDIÁRIO COM CANGA DE MINÉRIO DE FERRO E = 0,125 M	M3	14.310,97	8279,88				76,02	R\$ 1.087.919,94	R\$ 629.436,44	R\$ 629.436,44	R\$ 458.483,50	
4.8	BASE ESTAB. GRANUL., COMP. ENEG. PROCTOR MODIF. COM BRITA BICA CORRIDA	M3	14.851,95	11888,98				132,49	R\$ 1.967.734,86	R\$ 1.575.170,96	R\$ 1.575.170,96	R\$ 392.563,90	
4.9	TRANSPORTE DE MATERIAL DE BASE DMT<=22KM	TXKM	1.100.000,00	758004,25				0,60	R\$ 660.000,00	R\$ 454.802,55	R\$ 454.802,55	R\$ 205.197,45	
4.10	IMPRIMAÇÃO COM CM-30	M2	116.352,79	107255,34				6,74	R\$ 784.217,80	R\$ 722.900,96	R\$ 722.900,96	R\$ 61.316,85	
4.11	PINTURA DE LIGAÇÃO COM RR-1C	M2	116.352,79	107182,14				1,70	R\$ 197.799,74	R\$ 182.209,64	R\$ 182.209,64	R\$ 15.590,11	
4.12	CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE FAIXA C CAP 50/70	TON	12.121,21	11271,31				445,73	R\$ 5.402.786,93	R\$ 5.023.963,23	R\$ 5.023.963,23	R\$ 378.823,70	
4.13	CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE FAIXA C CAP 50/70 ESP.MANUAL,COMPACT,PLACA VIBRAT.(QUEBRA MOLA)	TON	135,00	79,71				568,66	R\$ 76.769,10	R\$ 45.327,89	R\$ 45.327,89	R\$ 31.441,21	
4.14	TRANSPORTE DE CBUD DMT <=100 KM	TXKM	1.202.121,48	983342,38				0,60	R\$ 721.272,89	R\$ 590.005,43	R\$ 590.005,43	R\$ 131.267,46	
5	<b>DRENAGEM</b>												
5.1	REDE TUB. CONCRETO CIMENTO ARI PLUS RS CLASSE PA-1 DN= 400 MM	M	573,80	371,76				110,59	R\$ 63.456,54	R\$ 41.112,94	R\$ 41.112,94	R\$ 22.343,60	
5.2	REDE TUB. CONCRETO CIMENTO ARI PLUS RS CLASSE PA-1 DN= 600 MM	M	558,35	148,44				189,68	R\$ 105.349,48	R\$ 27.630,30	R\$ 27.630,30	R\$ 77.719,18	
5.3	CONCRETO PARA BERÇO DE REDE TUBULAR TRAÇO 1:3:6 INCLUSIVE LANÇAMENTO	M3	214,77	85,34				377,25	R\$ 81.021,98	R\$ 32.194,70	R\$ 32.194,70	R\$ 48.827,28	
5.4	FORMA PARA BERÇO EM TÁBUA, INCLUSIVE DESFORMA	M2	186,00	6,36				16,37	R\$ 3.044,82	R\$ 104,11	R\$ 104,11	R\$ 2.940,71	
5.5	ALA DE REDE TUBULAR D= 600 MM	UN	14,00	5,00				993,07	R\$ 13.902,98	R\$ 4.965,35	R\$ 4.965,35	R\$ 8.937,63	
5.6	CAIXA DE PASSAGEM TIPO B - PADRAO SUDECAP, D= 600 MM	UN	27,00	12,50				1.769,50	R\$ 47.776,50	R\$ 22.118,75	R\$ 22.118,75	R\$ 25.657,75	
5.7	DISSIPADOR DE ENERGIA P. DNIT DEB 02	UN	48,00	0,00				545,26	R\$ 26.172,48	R\$ -	R\$ -	R\$ 26.172,48	
5.8	SAIDA DÁGUA SIMPLES, EM TALUDE DE ATERRIO - TIPO 01 - SSA - 01	UN	221,00	0,00				470,29	R\$ 103.934,09	R\$ -	R\$ -	R\$ 103.934,09	
5.9	SARJETA TRIANGULAR DE CONCRETO STC02	M	640,00	0,00				70,74	R\$ 45.273,60	R\$ -	R\$ -	R\$ 45.273,60	
5.10	SARJETA TRIANGULAR DE CONCRETO STC04	M	3.960,00	3031,81				48,76	R\$ 193.089,60	R\$ 147.831,06	R\$ 147.831,06	R\$ 45.258,54	
5.11	SARJETA DE CONCRETO EM ATERRIO, TIPO DR.SCA.XY, LARGURA = 60 CM TIPO 30/20 (EXECUÇÃO, INCLUINDO ESCAVAÇÃO, FORNECIMENTO E TRANSPORTE DE TODOS OS MATERIAIS)	M	152,00	0,00				50,45	R\$ 7.668,40	R\$ -	R\$ -	R\$ 7.668,40	

3592  
Banco

Fornelk

Dias

Santos

San R...

Contrato PMC/078/2020 - LOCADORA TERRAMARES LTDA

2

ITEM	DESCRIÇÃO	QUANTITATIVOS					VALORES					
		UNIDADE	QUANTITATIVO PREVISTO	ACUM. ANTERIOR	EXECUTADO REALIZADO	ACUM. FATURADO	SALDO A EXECUTAR	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL PREVISTO	ACUM. ANTERIOR	MEDIDO EXECUTADO	ACUM. FATURADO
5.12	SARJETA DE CONCRETO EM ATERRO, TIPO DR.SCA-XY, LARGURA = 70 CM, TIPO 40/20 (EXECUÇÃO, INCLUINDO ESCAVAÇÃO, FORNECIMENTO E TRANSPORTE DE TODOS OS MATERIAIS)	M	1.100,00	0,00		0,00	R\$ 52,49	R\$ 57.739,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 57.739,00
5.13	SARJETA DE CONCRETO EM ATERRO, TIPO DR.SCA-XY, LARGURA = 80 CM, TIPO 50/20 (EXECUÇÃO, INCLUINDO ESCAVAÇÃO, FORNECIMENTO E TRANSPORTE DE TODOS OS MATERIAIS)	M	1.490,00	1128,10		1128,10	R\$ 60,59	R\$ 90.279,10	R\$ 68.351,58	R\$ -	R\$ 68.351,58	R\$ 21.927,52
5.14	SARJETA DE CONCRETO EM ATERRO, TIPO DR.SCA-XY, LARGURA = 80 CM, TIPO 50/30 (EXECUÇÃO, INCLUINDO ESCAVAÇÃO, FORNECIMENTO E TRANSPORTE DE TODOS OS MATERIAIS)	M	2.369,00	940,90		940,90	R\$ 75,80	R\$ 179.570,20	R\$ 71.320,22	R\$ -	R\$ 71.320,22	R\$ 108.249,98
5.15	SARJETA DE CONCRETO EM ATERRO, TIPO DR.SCA-XY, LARGURA = 90 CM, TIPO 60/30 (EXECUÇÃO, INCLUINDO ESCAVAÇÃO, FORNECIMENTO E TRANSPORTE DE TODOS OS MATERIAIS)	M	134,00	0,00		0,00	R\$ 83,99	R\$ 11.254,66	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 11.254,66
5.16	SARJETA DE CONCRETO EM ATERRO, TIPO DR.SCA-XY, LARGURA = 100 CM, TIPO 70/30 (EXECUÇÃO, INCLUINDO ESCAVAÇÃO, FORNECIMENTO E TRANSPORTE DE TODOS OS MATERIAIS)	M	1.065,00	0,00		0,00	R\$ 87,21	R\$ 92.878,65	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 92.878,65
5.17	CAIXA PARA BOCA DE LOBO SIMPLES	UN	51,00	40,00		40,00	R\$ 870,12	R\$ 44.376,12	R\$ 34.804,80	R\$ -	R\$ 34.804,80	R\$ 9.571,32
5.18	CAIXA PARA BOCA DE LOBO DUPLA	UN	31,00	2,00		2,00	R\$ 1.806,20	R\$ 49.792,20	R\$ 3.212,40	R\$ -	R\$ 3.212,40	R\$ 46.579,80
5.19	CONJUNTO QUADRO E GRELHA PARA BOCA DE LOBO TIPO B (CONCRETO) - PADRÃO SUDECAP	UN	102,00	45,00		45,00	R\$ 235,30	R\$ 24.000,60	R\$ 10.588,50	R\$ -	R\$ 10.588,50	R\$ 13.412,10
5.20	CANTONEIRA PARA BOCA DE LOBO TIPO B (CONCRETO) - PADRÃO SUDECAP	UN	102,00	44,00		44,00	R\$ 97,02	R\$ 9.896,04	R\$ 4.288,88	R\$ -	R\$ 4.288,88	R\$ 5.627,16
5.21	DRENO PROFUNDO COM AREIA, SEM SELO, COM 1,50X0,40 M E TUBO DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE PERFORADO, DE 100 MM ENVOLVIDO EM MANTA GEOTÊXTIL NÃO TECIDA, TIPO DR.DP. 02	M	1.480,00	0,00		0,00	R\$ 100,36	R\$ 148.532,80	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 148.532,80
5.22	TRANSPORTE DE AGREGADOS PARA CONSERVAÇÃO, DISTÂNCIA MÉDIA DE TRANSPORTE > 50,10 KM	M3xKM	48.650,00	0,00		0,00	R\$ 1,37	R\$ 66.650,50	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 66.650,50
6	OBRAS COMPLEMENTARES											
6.1	MEIO FIO CONCRETO TIPO A - PADRÃO SUDECAP (12X16,7X35)CM	M	16.389,94	14250,15		14250,15	R\$ 38,67	R\$ 633.798,98	R\$ 551.053,30	R\$ -	R\$ 551.053,30	R\$ 82.745,68
6.2	FORNECIMENTO E LANÇAMENTO DE CONCRETO FCK = 15 MPa PARA CONFINAMENTO MEIO-FIO	M	10.750,00	10144,56		10144,56	R\$ 17,44	R\$ 187.480,00	R\$ 176.921,13	R\$ -	R\$ 176.921,13	R\$ 10.558,87
6.3	PASSEIOS DE CONCRETO 15 MPa E = 6 CM JUNTA SECA 3M MANUAL	M2	2.250,00	179,09		179,09	R\$ 40,14	R\$ 90.315,00	R\$ 7.188,67	R\$ -	R\$ 7.188,67	R\$ 83.126,33
6.4	LANÇAMENTO E ESPALHAMENTO DE MATERIAIS EM PASSEIO	M3	100,00	0,00		0,00	R\$ 17,05	R\$ 1.705,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.705,00
7	ADMINISTRAÇÃO LOCAL											
7.1	ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA ( CONFORME ACORDÃO 2622/2013)	%	8,73448	0,06	0,000018	0,06002	R\$ 13.644.388,08	R\$ 1.191.766,69	R\$ 818.633,39	R\$ 243,54	R\$ 818.876,93	R\$ 372.889,76
<b>PRIMEIRO TERMO ADITIVO - SERVIÇOS NOVOS</b>												
1.0	DESCIDA											
1.1	DESCIDA D'ÁGUA TIPO DEGRAU DN 500	M	65,00	22,96		22,96	R\$ 447,95	R\$ 29.116,75	R\$ 10.284,93	R\$ -	R\$ 10.284,93	R\$ 18.831,82
2.0	SARJETA - PADRÃO SUDECAP											
2.1	TIPO A - (50X10)CM - DES-R01	M	6.383,00	1462,72		1462,72	R\$ 18,43	R\$ 117.638,69	R\$ 26.957,93	R\$ -	R\$ 26.957,93	R\$ 90.680,76
3.0	DRENO - PADRÃO SUDECAP											
3.1	TIPO B-MANTA DRENANTE, BRITA 3, TUBO POROSO, L=60CM	M	65,00	0,00		0,00	R\$ 87,52	R\$ 5.688,80	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 5.688,80

35713  
Cano

De  
em 5 de

*[Handwritten Signature]*

*[Handwritten Signature]*

*[Handwritten Signature]*





3575  
@amw

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO

Contratada: **LOCADORA TERRAMARES LTDA**

Contrato nº: **PMC/078/2020**

**16ª MEDIÇÃO**

Data: **31/08/2021**

Período: **01/08/2021 À 31/08/2021**

Fiscais: **Daniel Aparecido Santos Lima / Franciele Indianara S. Silva**

**Objeto:**

PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA E SERVIÇOS COMPLEMENTARES, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MÃO DE OBRA, NO MUNICÍPIO DE CONGONHAS-MG.

FOTOGRAFIA



EXECUÇÃO DE SARJETA EM "V" - ÁREA 9 (RUA 8 P/ PREFEITURA) - ÁGUA BOA



EXECUÇÃO DE SARJETA EM "V" - ÁREA 9 (RUA 8 P/ PREFEITURA) - ÁGUA BOA

Hugo Seabra da Mota  
Engenheiro Civil  
Crea: 202510 - MG

Contratada

Sandra Raquel Lacerda Milagre  
Eng. Civil - CREA 139970  
PREFEITURA DE CONGONHAS

Prefeitura de Congonhas - SEOB

Franciele Indianara S. Silva  
Prefeitura de Congonhas  
Téc. Edificações/CFT-MG  
14/10/2021 13:35



RELATÓRIO FOTOGRÁFICO

Contratada: **LOCADORA TERRAMARES LTDA**

Contrato nº: **PMC/078/2020**

**16ª MEDIÇÃO**

Data: **31/08/2021**

Período: **01/08/2021 À 31/08/2021**

Fiscais: **Daniel Aparecido Santos Lima / Franciele Indianara S. Silva**

**Objeto:**

PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA E SERVIÇOS COMPLEMENTARES, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MÃO DE OBRA, NO MUNICÍPIO DE CONGONHAS-MG.

FOTOGRAFIA



EXECUÇÃO DE SARJETA EM "V" - ÁREA 9 (RUA 8 P/ PREFEITURA) - ÁGUA BOA



EXECUÇÃO DE SARJETA EM "V" - ÁREA 9 (RUA 8 P/ PREFEITURA) - ÁGUA BOA

*Hugo Sebastião da Silva*  
Engenheiro Civil  
Crea: 202510 - MG

Contratada

*Sandra Raquel Lacerda Miranda*  
Engenheira Civil  
Crea: 145135 D TO  
Prefeitura de Congonhas

Prefeitura de Congonhas - SEOB

*Franciele Indianara S. Silva*  
Prefeitura de Congonhas  
Téc. Edificações/CFT-MG  
141600005



RELATÓRIO FOTOGRÁFICO

Contratada: **LOCADORA TERRAMARES LTDA**

Contrato nº: **PMC/078/2020**

**16ª MEDIÇÃO**

Data: **31/08/2021**

Período: **01/08/2021 À 31/08/2021**

Fiscais: **Daniel Aparecido Santos Lima / Franciele Indianara S. Silva**

**Objeto:**

PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA E SERVIÇOS COMPLEMENTARES, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MÃO DE OBRA, NO MUNICÍPIO DE CONGONHAS-MG.

FOTOGRAFIA



EXECUÇÃO DE SARJETA EM "V" - ÁREA 9 (RUA 8 P/ PREFEITURA) - ÁGUA BOA




EXECUÇÃO DE SARJETA EM "V" - ÁREA 9 (RUA 8 P/ PREFEITURA) - ÁGUA BOA

Hugo Souza da Mata  
Engenheiro Civil  
Crea 202510 - MG

Contratada

Sandra Raquel Lacerda Milagre  
CREM 10000  
Prefeitura de Congonhas - SEOB

Franciele Indianara Santos Silva  
Prefeitura de Congonhas  
Edifício Sede - CFT - Sala 3  
11/09/2021

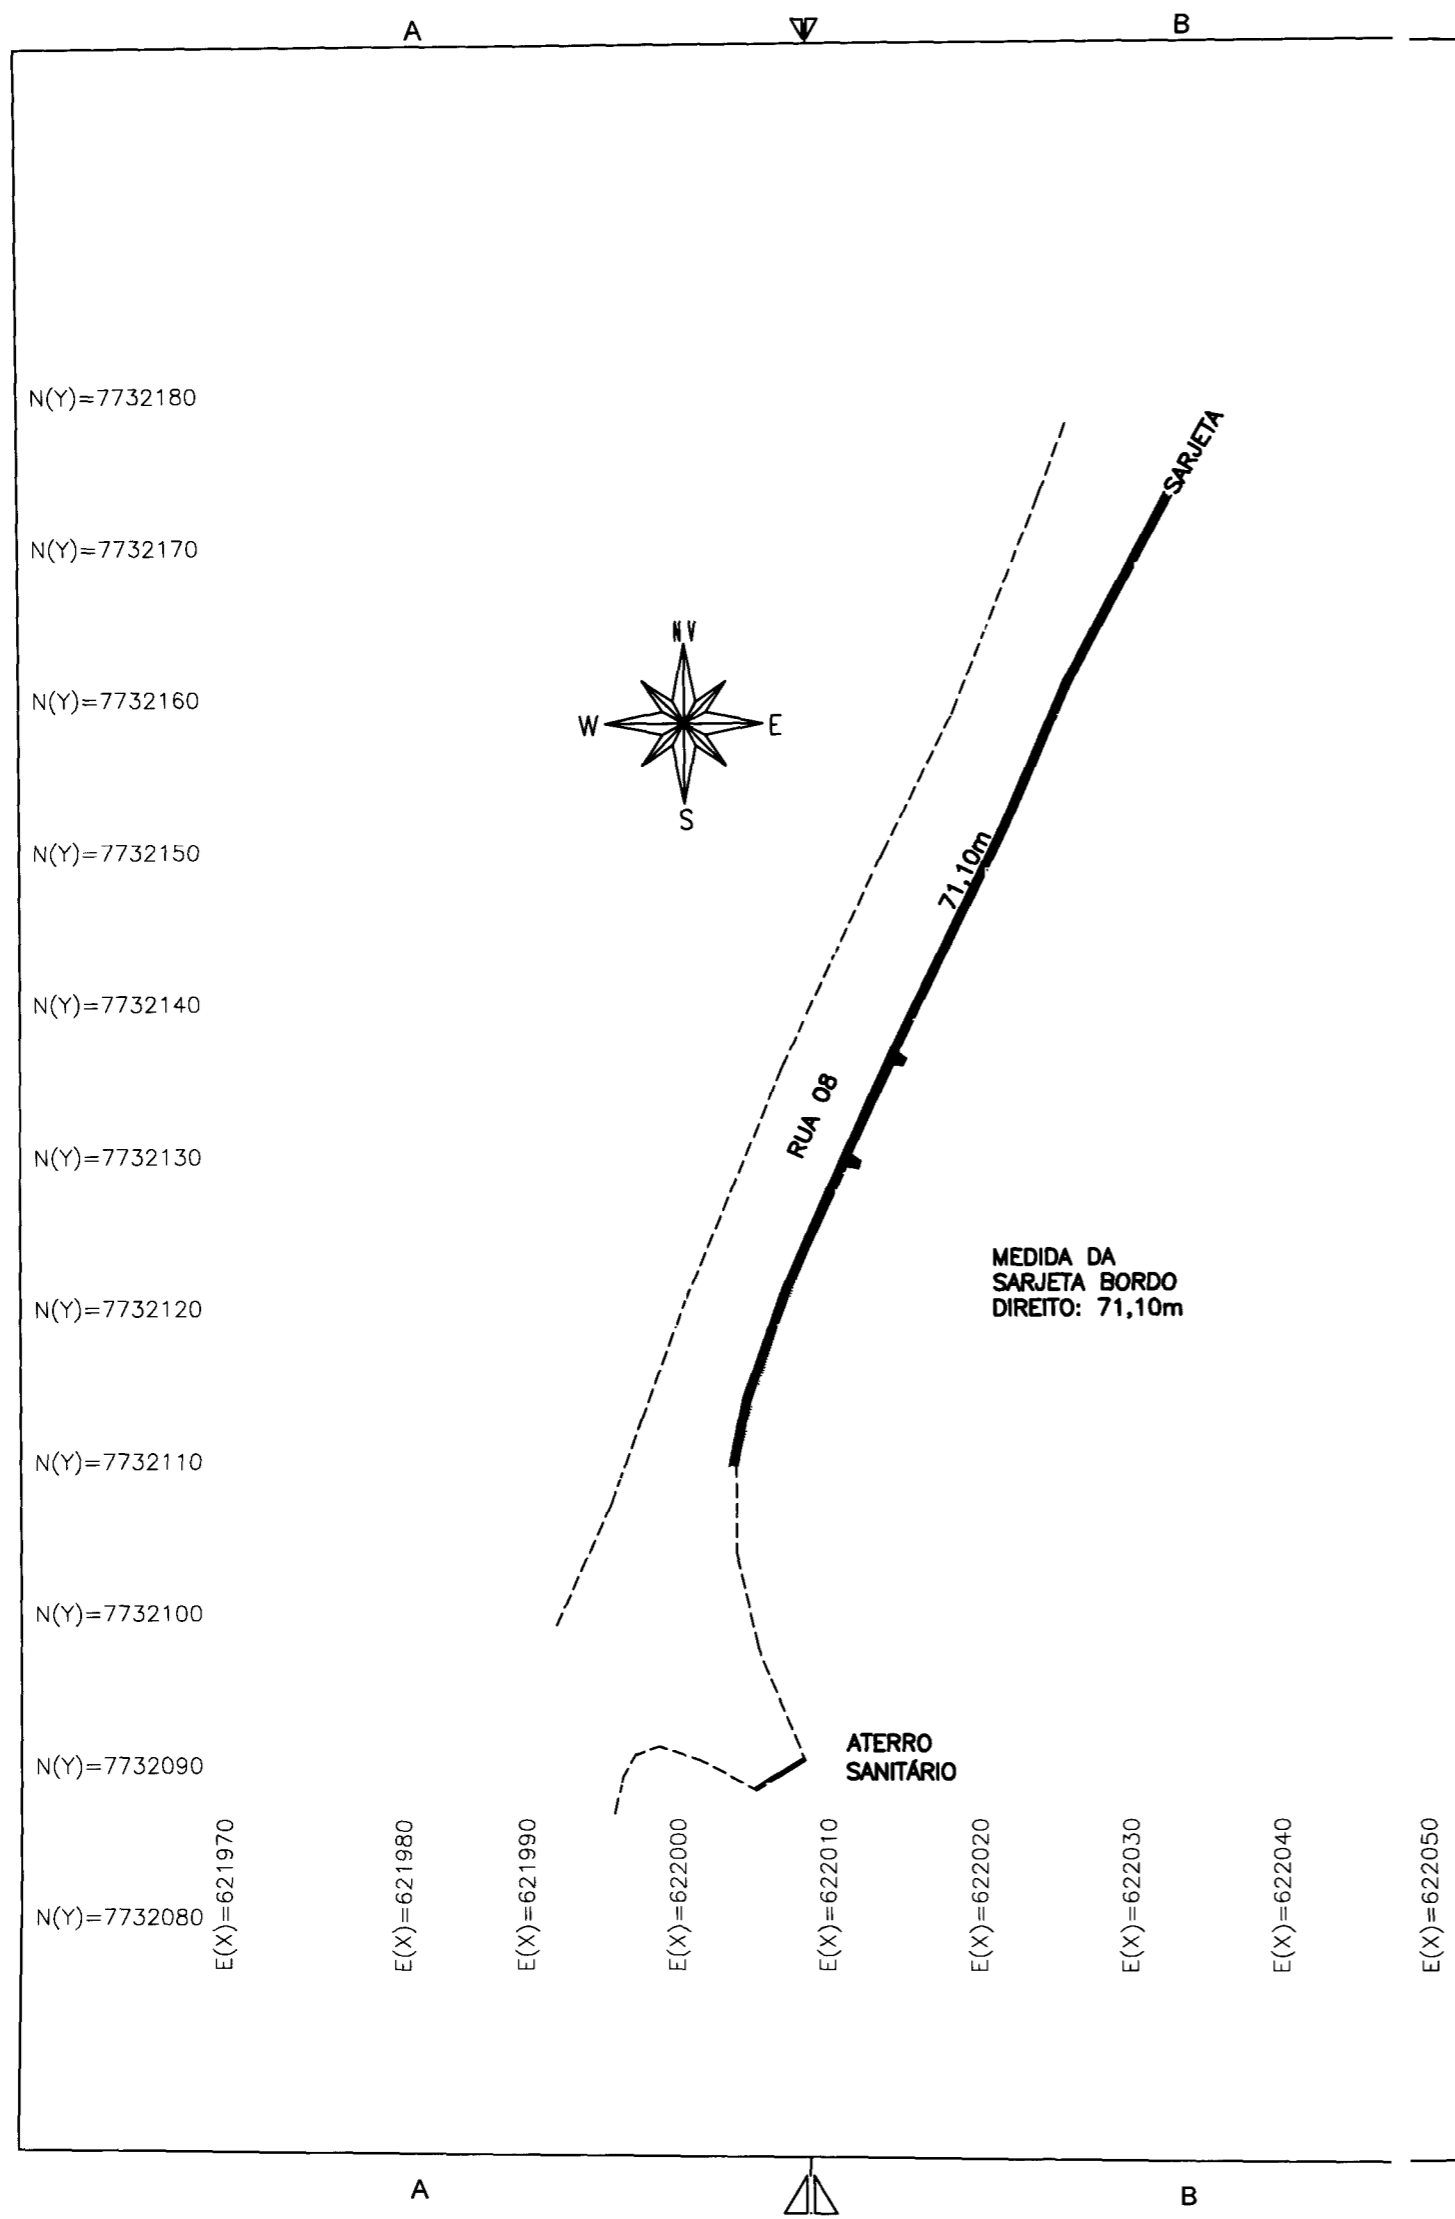

LEGENDA					
- - - - - SARJETA					
NOTAS					
OBSERVAÇÕES GERAIS:					
1. LEVANTAMENTO TOPOGRÁFICO PLANIMÉTRICO DE CAMPO.					
2. COORDENADAS E COTAS ARBITRARIAS SOMENTE PARA EFEITO DE CALCULO.					
REVISÃO	DESCRIÇÃO			DATA	
00	EMISSÃO INICIAL	PRI	RAFAELA LIMA	PABLO OTONI	23/09/2021
TIPOS DE EMISSÃO	A - PRELIMINAR	D - P/ COTAÇÃO	G - CONFORME CONSTRUÍDO		
	B - P/ APROVAÇÃO	E - P/ CONSTRUÇÃO	H - CANCELADO		
	C - P/ CONHECIMENTO	F - CONFORME COMPRADO			
ELABORAÇÃO:					
		<b>OBJETIVA PROJETOS E SERVIÇOS</b> ALAMEDA OSCAR NIEMAYER, N°500, SALA 505 - VALE DO SERENO NOVA LIMA-MG - CEP.: 34.005-056 TEL.: (31) 3347-4405 / (31) 3347-7079 / (31) 3571-1920 EMAIL: contato@grupoprojetaengenharia.com.br			
		REALIZAÇÃO: <b>PREFEITURA MUNICIPAL DE CONGONHAS-MG</b> Praça Pres. Juscelino Kubitschek, 135 - Centro, Congonhas - MG CEP.: 36415-000 TEL.: (31) 3731-1300			
<b>LEVANTAMENTO TOPOGRÁFICO PARA CALCULO DE ÁREA/ COMPRIMENTO DE CANALETAS/ PASSEIOS</b> RUA 08, BAIRRO ÁGUA BOA, CIDADE CONGONHAS-MG					
<h1>PROJETO DE TOPOGRAFIA</h1>					
AUTORIA DO PROJETO:			CONTRATANTE DO PROJETO:		
 MATEUS COMANDUCI FERNANDES NETO CREA MG - 94896/D			RESPONSÁVEL DA CONTRATANTE		
DATA:		ESCALA:	CÓDIGO:		
SETEMBRO/2021		1.500	PRJ-TOP		
TÍTULO DOS DESENHOS:			PRANCHA:		
LEVANTAMENTO PLANIMETRICO CADASTRAL			<b>01 / 01</b>		
DIREITOS AUTORAIS RESERVADOS; PROIBIDO REPRODUÇÃO, DIVULGAÇÃO OU ALTERAÇÃO SEM ORDEM EXPRESSA DO AUTOR.			TÍTULO DOS DESENHOS: PRJ-PRI-TOP-CNG-0101-AGUA BOA		

3598  
Dano

# TERRAMARES

3599  
Dona

## RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA

EMPRESA: <b>LOCADORA TERRAMARES LTDA</b>		DATA: <b>01/08/2021</b>
OBRA: <b>PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA E SERVIÇOS COMPLEMENTARES, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MÃO DE OBRA, NO MUNICÍPIO DE CONGONHAS-MG.</b>		DATA INICIAL: <b>02/03/2020</b>
CONTRATO: <b>PMC/078/2020</b>	RDO Nº: <b>517</b>	

DIA DA SEMANA						
2ª	3ª	4ª	5ª	6ª	SÁB	DOM
						X
EFETIVO TOTAL: 0						
PRESENTES: 0			AUSENTES: 0			

CONDIÇÕES DO TEMPO			DADOS CONTRATUAIS		
	MANHÃ	TARDE	NOITE	PRAZO CONTRATUAL:	578
BOM	X	X	X	DIAS CORRIDOS:	517
CHUVA				DIAS RESTANTES:	61
mm					


EFETIVO	DESCRIÇÃO	QUANT		DESCRIÇÃO	QUANT		DESCRIÇÃO	QUANT.	
		PRES.	AUSEN.		PRES.	AUSEN.		PRES.	AUSEN.
	ENGENHEIRO	0		OP. DE MINI ESCAVADEIRA	0		AJUDANTE	0	
	ENCARREGADO	0		OPERADOR DE ESPARGIDOR	0		MOTORISTA BETONEIRA	0	
	OPERADOR DE PATROL	0		OPERADOR DE VIBROACABADORA	0		AJUDANTE DE ASFALTO	0	
	OPERADOR DE ESCAVADEIRA	0		OPERADOR ROLO PNEU	0		RASTILEIRO	0	
	OPERADOR DE ROLO (PÉ DE CARNEIRO)	0		OPERADOR ROLO LISO	0				
	MOTORISTA CAMINHÃO PIPA	0		MOTORISTA	0				
	OPERADOR DE TRATOR AGRÍCOLA	0		PEDREIRO	0		TOTAL	0	0

EQUIPAMENTOS	DESCRIÇÃO	QUANT		DESCRIÇÃO	QUANT		DESCRIÇÃO	QUANT.	
		PRES.	AUSEN.		PRES.	AUSEN.		PRES.	AUSEN.
	PATROL	0		MINI ESCAVADEIRA	0		CAMINHÃO TRAÇADO	0	
	ESCAVADEIRA	0		CAMINHÃO ESPARGIDOR	0		CAMINHÃO BASCULANTE	0	
	ROLO COMPACTADOR (PÉ DE CARNEIRO)	0		VIBROACABADORA	0		PLACA VIBRATÓRIA	0	
	CAMINHÃO PIPA	0		ROLO PNEU	0		CAMINHÃO DE CONCRETO	0	
	TRATOR AGRÍCOLA	0		ROLO LISO	0		TOTAL	0	0

ITEM	DISCRIMINAÇÃO DAS ATIVIDADES
1	NÃO HOUVE EXECUÇÃO DE ATIVIDADES - DOMINGO
2	
3	
4	
5	
6	
7	
8	

ITEM	OBSERVAÇÃO
1	
2	
3	
4	
5	
6	

### GALERIA DE FOTOS



Sandra Raquel Lacerda Vilagre  
Eng.ª Civil - CREA 149136 D TO  
Cidade de Congonhas

Hugo Seabra da Matta  
Engenheiro Civil  
CPF: 272510 - MG

Associação Profissional  
Prestadores de Serviço  
Téc. Edific. 1470508995

ASSINATURAS: CONTRATADA CONTRATANTE

# TERRAMARES

3600  
Dano

## RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA

EMPRESA:		LOCADORA TERRAMARES LTDA		DATA:	02/08/2021
OBRA:		PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA E SERVIÇOS COMPLEMENTARES, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MÃO DE OBRA, NO MUNICÍPIO DE CONGONHAS-MG.		DATA INICIAL:	02/03/2020
		CONTRATO:	PMC/078/2020	RDO Nº:	518

DIA DA SEMANA						
2ª	3ª	4ª	5ª	6ª	SÁB	DOM
X						
EFETIVO TOTAL:						5
PRESENTES:			5	AUSENTES:		0

CONDIÇÕES DO TEMPO			DADOS CONTRATUAIS		
	MANHÃ	TARDE	NOITE	PRAZO CONTRATUAL:	578
BOM	X	X	X	DIAS CORRIDOS:	518
CHUVA				DIAS RESTANTES:	60
mm					

EFETIVO	DESCRIÇÃO	QUANT		DESCRIÇÃO	QUANT		DESCRIÇÃO	QUANT.	
		PRES.	AUSEN.		PRES.	AUSEN.		PRES.	AUSEN.
	ENGENHEIRO	0		OP. DE MINI ESCAVADEIRA	0		AJUDANTE	3	
	ENCARREGADO	0		OPERADOR DE ESPARGIDOR	0		MOTORISTA BETONEIRA	0	
	OPERADOR DE PATROL	0		OPERADOR DE VIBROACABADORA	0		AJUDANTE DE ASFALTO	0	
	OPERADOR DE ESCAVADEIRA	0		OPERADOR ROLO PNEU	0		RASTILEIRO	0	
	OPERADOR DE ROLO (PÉ DE CARNEIRO)	0		OPERADOR ROLO LISO	0				
	MOTORISTA CAMINHÃO PIPA	0		MOTORISTA	0				
	OPERADOR DE TRATOR AGRÍCOLA	0		PEDREIRO	2		TOTAL	5	0


EQUIPAMENTOS	DESCRIÇÃO	QUANT		DESCRIÇÃO	QUANT		DESCRIÇÃO	QUANT.	
		PRES.	AUSEN.		PRES.	AUSEN.		PRES.	AUSEN.
	PATROL	0		MINI ESCAVADEIRA	0		CAMINHÃO TRAÇADO	0	
	ESCAVADEIRA	0		CAMINHÃO ESPARGIDOR	0		CAMINHÃO BASCULANTE	0	
	ROLO COMPACTADOR (PÉ DE CARNEIRO)	0		VIBROACABADORA	0		PLACA VIBRATÓRIA	0	
	CAMINHÃO PIPA	0		ROLO PNEU	0		CAMINHÃO DE CONCRETO	0	
	TRATOR AGRÍCOLA	0		ROLO LISO	0		TOTAL	0	0

ITEM	DISCRIMINAÇÃO DAS ATIVIDADES
1	EXECUÇÃO DE LIMPEZA - ESTRADA ESMERIL
2	EXECUÇÃO DE ASSENTAMENTO DE MEIO FIO - AREA 9 (RUA 8 - PREFEITURA) - (AGUA BOA)
3	
4	
5	
6	
7	
8	

ITEM	OBSERVAÇÃO
1	
2	
3	
4	
5	
6	

### GALERIA DE FOTOS


ASSINATURAS:



**Hugo Sabino da Mata**  
Engenheiro Civil  
Crea: 202510 - MG

CONTRATADA

CONTRATANTE

  
 Hugo Sabino da Mata  
 Engenheiro Civil - CREA 202510 D TO  
 Prefeitura de Congonhas

Francisco Indiarara Santos Sili  
 Prefeitura de Congonhas  
 Engenheiro Civil - CREA 14106098995

# TERRAMARES

3603  
Cama

## RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA

EMPRESA: <b>LOCADORA TERRAMARES LTDA</b>		DATA: <b>03/08/2021</b>
OBRA: <b>PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA E SERVIÇOS COMPLEMENTARES, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MÃO DE OBRA, NO MUNICÍPIO DE CONGONHAS-MG.</b>		DATA INICIAL: <b>02/03/2020</b>
CONTRATO: <b>PMC/078/2020</b>	RDO Nº: <b>519</b>	

DIA DA SEMANA						
2ª	3ª	4ª	5ª	6ª	SÁB	DOM
	X					
EFETIVO TOTAL: <b>7</b>						
PRESENTES: <b>7</b>			AUSENTES: <b>0</b>			

CONDIÇÕES DO TEMPO			DADOS CONTRATUAIS	
	MANHÃ	TARDE	NOITE	PRAZO CONTRATUAL:
BOM	X	X	X	DIAS CORRIDOS: <b>519</b>
CHUVA				DIAS RESTANTES: <b>59</b>
mm				


EFETIVO	DESCRIÇÃO	QUANT		DESCRIÇÃO	QUANT		DESCRIÇÃO	QUANT.	
		PRES.	AUSEN.		PRES.	AUSEN.		PRES.	AUSEN.
	ENGENHEIRO	0		OP. DE MINI ESCAVADEIRA	0		AJUDANTE	4	
	ENCARREGADO	0		OPERADOR DE ESPARGIDOR	0		MOTORISTA BETONEIRA	0	
	OPERADOR DE PATROL	0		OPERADOR DE VIBROACABADORA	0		AJUDANTE DE ASFALTO	0	
	OPERADOR DE ESCAVADEIRA	0		OPERADOR ROLO PNEU	0		RASTILHEIRO	0	
	OPERADOR DE ROLO (PÉ DE CARNEIRO)	0		OPERADOR ROLO LISO	0				
	MOTORISTA CAMINHÃO PIPA	0		MOTORISTA	0				
	OPERADOR DE TRATOR AGRÍCOLA	0		PEDREIRO	3		TOTAL	7	0

EQUIPAMENTOS	DESCRIÇÃO	QUANT		DESCRIÇÃO	QUANT		DESCRIÇÃO	QUANT.	
		PRES.	AUSEN.		PRES.	AUSEN.		PRES.	AUSEN.
	PATROL	0		MINI ESCAVADEIRA	0		CAMINHÃO TRAÇADO	0	
	ESCAVADEIRA	0		CAMINHÃO ESPARGIDOR	0		CAMINHÃO BASCULANTE	0	
	ROLO COMPACTADOR (PÉ DE CARNEIRO)	0		VIBROACABADORA	0		PLACA VIBRATÓRIA	0	
	CAMINHÃO PIPA	0		ROLO PNEU	0		CAMINHÃO DE CONCRETO	0	
	TRATOR AGRÍCOLA	0		ROLO LISO	0		TOTAL	0	0

ITEM	DISCRIMINAÇÃO DAS ATIVIDADES
1	EXECUÇÃO DE ATERRO COM SOLO-CIMENTO – ESTRADA ESMERIL *1
2	EXECUÇÃO DE ASSENTAMENTO DE MEIO FIO - AREA 9 (RUA 8 - PREFEITURA) - (AGUA BOA)
3	
4	
5	
6	
7	
8	

ITEM	OBSERVAÇÃO
1	Observação: *1: Para conter o desabamento da encosta e consequentemente o dano ao asfalto, foi acordado entre a fiscalização da contratante e a contratada a execução de um aterro de solo-cimento para conter a talude, esse aterro deverá conter 4% de cimento, após a execução do mesmo, será executada uma caixa de passagem e uma escada d'água para conter as águas que descem sobre o talude.
2	
3	
4	
5	
6	

### GALERIA DE FOTOS



ASSINATURAS:

  
**Hugo Seabra** - Engenheiro Civil - CREA: 202510 - MG

  
**Sandra Raquel Lacerda** - Engenheira Civil - CREA 149136 D TO - Prefeitura de Congonhas

**CONTRATANTE**

Imprensa Oficial - Prefeitura de Congonhas - MG  
 Rua: Edifício...  
 Telefone: 10609895

# TERRAMARES

3602  
Dum

## RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA

EMPRESA:	LOCADORA TERRAMARES LTDA	DATA:	04/08/2021
OBRA:	PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA E SERVIÇOS COMPLEMENTARES, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MÃO DE OBRA, NO MUNICÍPIO DE CONGONHAS-MG.	DATA INICIAL:	02/03/2020
	CONTRATO:	PMC/078/2020	RDO Nº: 520

DIA DA SEMANA						
2ª	3ª	4ª	5ª	6ª	SÁB	DOM
		X				
EFETIVO TOTAL: 7						
PRESENTES: 7			AUSENTES: 0			

CONDIÇÕES DO TEMPO			DADOS CONTRATUAIS	
	MANHÃ	TARDE	NOITE	PRAZO CONTRATUAL:
BOM	X	X	X	DIAS CORRIDOS: 578
CHUVA				DIAS RESTANTES: 58
mm				


EFETIVO	DESCRIÇÃO	QUANT		DESCRIÇÃO	QUANT		DESCRIÇÃO	QUANT.	
		PRES.	AUSEN.		PRES.	AUSEN.		PRES.	AUSEN.
	ENGENHEIRO	0		OP. DE MINI ESCAVADEIRA	0		AJUDANTE	4	
	ENCARREGADO	0		OPERADOR DE ESPARGIDOR	0		MOTORISTA BETONEIRA	0	
	OPERADOR DE PATROL	0		OPERADOR DE VIBROACABADORA	0		AJUDANTE DE ASFALTO	0	
	OPERADOR DE ESCAVADEIRA	0		OPERADOR ROLO PNEU	0		RASTILEIRO	0	
	OPERADOR DE ROLO (PÉ DE CARNEIRO)	0		OPERADOR ROLO LISO	0				
	MOTORISTA CAMINHÃO PIPA	0		MOTORISTA	1				
	OPERADOR DE TRATOR AGRÍCOLA	0		PEDREIRO	3		TOTAL	7	0

EQUIPAMENTOS	DESCRIÇÃO	QUANT		DESCRIÇÃO	QUANT		DESCRIÇÃO	QUANT.	
		PRES.	AUSEN.		PRES.	AUSEN.		PRES.	AUSEN.
	PATROL	0		MINI ESCAVADEIRA	0		CAMINHÃO TRAÇADO	0	
	ESCAVADEIRA	0		CAMINHÃO ESPARGIDOR	0		CAMINHÃO BASCULANTE	1	
	ROLO COMPACTADOR (PÉ DE CARNEIRO)	0		VIBROACABADORA	0		PLACA VIBRATÓRIA	0	
	CAMINHÃO PIPA	0		ROLO PNEU	0		CAMINHÃO DE CONCRETO	0	
	TRATOR AGRÍCOLA	0		ROLO LISO	0		TOTAL	1	0

ITEM	DISCRIMINAÇÃO DAS ATIVIDADES	
1	EXECUÇÃO DE ATERRO COM SOLO-CIMENTO COMPACTADO COM COMPACTADOR - ESTRADA ESMERIL	
2	TRANSPORTE DE TERRA PARA EXECUÇÃO DE ATERRO DE SOLO-CIMENTO - ESTRADA ESMERIL	
3	EXECUÇÃO DE ASSENTAMENTO DE MEIO FIO - ÁGUA BOA	
4		
5		
6		
7		
8		

ITEM	OBSERVAÇÃO
1	
2	
3	
4	
5	
6	

### GALERIA DE FOTOS



*Hugo Sebastião Matu*  
Engenheiro Civil  
Crea: 202310 - MG

*Sandra Raquel Lacerda Milara*  
Enrª Civil - CREA 149.136 D TO  
Instituição de Congonhas

ASSINATURAS:

CONTRATADA

CONTRATANTE

Franciele Andrianara Santos Silihr  
Prefeitura de Congonhas  
Téc. Engenharia - CFT-3  
10000395

# TERRAMARES

3603  
aw

## RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA

EMPRESA:		LOCADORA TERRAMARES LTDA	DATA:	05/08/2021
OBRA:		PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA E SERVIÇOS COMPLEMENTARES, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MÃO DE OBRA, NO MUNICÍPIO DE CONGONHAS-MG.	DATA INICIAL:	02/03/2020
		CONTRATO:	PMC/078/2020	RDO Nº:
				521

DIA DA SEMANA						
2ª	3ª	4ª	5ª	6ª	SÁB	DOM
			X			
EFETIVO TOTAL: 5						
PRESENTES: 5			AUSENTES: 0			

CONDIÇÕES DO TEMPO			DADOS CONTRATUAIS	
	MANHÃ	TARDE	NOITE	PRAZO CONTRATUAL:
BOM	X	X	X	DIAS CORRIDOS: 521
CHUVA				DIAS RESTANTES: 57
mm				


EFETIVO	DESCRIÇÃO	QUANT		DESCRIÇÃO	QUANT		DESCRIÇÃO	QUANT.	
		PRES.	AUSEN.		PRES.	AUSEN.		PRES.	AUSEN.
	ENGENHEIRO	0		OP. DE MINI ESCAVADEIRA	0		AJUDANTE	3	
	ENCARREGADO	0		OPERADOR DE ESPARGIDOR	0		MOTORISTA BETONEIRA	0	
	OPERADOR DE PATROL	0		OPERADOR DE VIBROACABADORA	0		AJUDANTE DE ASFALTO	0	
	OPERADOR DE ESCAVADEIRA	0		OPERADOR ROLO PNEU	0		RASTILEIRO	0	
	OPERADOR DE ROLO (PÉ DE CARNEIRO)	0		OPERADOR ROLO LISO	0				
	MOTORISTA CAMINHÃO PIPA	0		MOTORISTA	0				
	OPERADOR DE TRATOR AGRÍCOLA	0		PEDREIRO	2		TOTAL	5	0

EQUIPAMENTOS	DESCRIÇÃO	QUANT		DESCRIÇÃO	QUANT		DESCRIÇÃO	QUANT.	
		PRES.	AUSEN.		PRES.	AUSEN.		PRES.	AUSEN.
	PATROL	0		MINI ESCAVADEIRA	0		CAMINHÃO TRAÇADO	0	
	ESCAVADEIRA	0		CAMINHÃO ESPARGIDOR	0		CAMINHÃO BASCULANTE	0	
	ROLO COMPACTADOR (PÉ DE CARNEIRO)	0		VIBROACABADORA	0		PLACA VIBRATÓRIA	0	
	CAMINHÃO PIPA	0		ROLO PNEU	0		CAMINHÃO DE CONCRETO	0	
	TRATOR AGRÍCOLA	0		ROLO LISO	0		TOTAL	0	0

ITEM	DISCRIMINAÇÃO DAS ATIVIDADES
1	EXECUÇÃO DE ATERRO COM SOLO-CIMENTO COMPACTADO COM COMPACTADOR – ESTRADA ESMERIL
2	
3	
4	
5	
6	
7	
8	

ITEM	OBSERVAÇÃO
1	
2	
3	
4	
5	
6	

### GALERIA DE FOTOS



*Hugo Scabro de Alita*  
Engenheiro Civil  
Crea: 202310 - MG

Santos Soares Lacerda Milagre  
Engº Civil - CREA 149136 D TO  
Escritura de Congonhas

Franciele Ingridiana Santos Silva  
Perícia de Engenharia de Congonhas  
Téc. Eng. Civil - CREA 149136 D TO  
118003993

ASSINATURAS: CONTRATADA CONTRATANTE

# TERRAMARES

3604  
Dante

## RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA

EMPRESA: <b>LOCADORA TERRAMARES LTDA</b>		DATA: <b>06/08/2021</b>
OBRA: <b>PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA E SERVIÇOS COMPLEMENTARES, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MÃO DE OBRA, NO MUNICÍPIO DE CONGONHAS-MG.</b>		DATA INICIAL: <b>02/03/2020</b>
CONTRATO: <b>PMC/078/2020</b>	RDO Nº: <b>522</b>	

DIA DA SEMANA						
2ª	3ª	4ª	5ª	6ª	SÁB	DOM
				X		
EFETIVO TOTAL: <b>5</b>						
PRESENTES: <b>5</b>			AUSENTES: <b>0</b>			

CONDIÇÕES DO TEMPO			DADOS CONTRATUAIS		
	MANHÃ	TARDE	NOITE	PRAZO CONTRATUAL:	578
BOM	X	X	X	DIAS CORRIDOS:	522
CHUVA				DIAS RESTANTES:	56
mm					


EFETIVO	DESCRIÇÃO	QUANT		DESCRIÇÃO	QUANT		DESCRIÇÃO	QUANT.	
		PRES.	AUSEN.		PRES.	AUSEN.		PRES.	AUSEN.
	ENGENHEIRO	0		OP. DE MINI ESCAVADEIRA	0		AJUDANTE	3	
	ENCARREGADO	0		OPERADOR DE ESPARGIDOR	0		MOTORISTA BETONEIRA	0	
	OPERADOR DE PATROL	0		OPERADOR DE VIBROACABADORA	0		AJUDANTE DE ASFALTO	0	
	OPERADOR DE ESCAVADEIRA	0		OPERADOR ROLO PNEU	0		RASTILEIRO	0	
	OPERADOR DE ROLO (PÉ DE CARNEIRO)	0		OPERADOR ROLO LISO	0				
	MOTORISTA CAMINHÃO PIPA	0		MOTORISTA	1				
	OPERADOR DE TRATOR AGRÍCOLA	0		PEDREIRO	2		TOTAL	5	0

EQUIPAMENTOS	DESCRIÇÃO	QUANT		DESCRIÇÃO	QUANT		DESCRIÇÃO	QUANT.	
		PRES.	AUSEN.		PRES.	AUSEN.		PRES.	AUSEN.
	PATROL	0		MINI ESCAVADEIRA	0		CAMINHÃO TRAÇADO	0	
	ESCAVADEIRA	0		CAMINHÃO ESPARGIDOR	0		CAMINHÃO BASCULANTE	0	
	ROLO COMPACTADOR (PÉ DE CARNEIRO)	0		VIBROACABADORA	0		PLACA VIBRATÓRIA	0	
	CAMINHÃO PIPA	0		ROLO PNEU	0		CAMINHÃO DE CONCRETO	1	
	TRATOR AGRÍCOLA	0		ROLO LISO	0		TOTAL	1	0

ITEM	DISCRIMINAÇÃO DAS ATIVIDADES
1	EXECUÇÃO DE ATERRO DE SOLO CIMENTO COM PLACA VIBRATÓRIA – ESTRADA ESMERIL
2	EXECUÇÃO DE SARJETA E CONFINAMENTO DE MEIO FIO – ÁGUA BOA
3	
4	
5	
6	
7	
8	

ITEM	OBSERVAÇÃO
1	
2	
3	
4	
5	
6	

### GALERIA DE FOTOS



*Handwritten signature*  
**Sandra Raquel Lacerda Milagre**  
 Engenheira Civil - CREA 149135 D TO  
 Congonhas de Minas

*Handwritten signature*  
**Hugo Scabra da Silva**  
 Engenheiro Civil  
 Crea: 202510 - MG

ASSINATURAS:

CONTRATADA

CONTRATANTE

Franciele Indiarana Santos  
 Prefeitura de Congonhas  
 Téc. Edificações - C.F. 1  
 19/08/2021

# TERRAMARES

3605  
Dano

## RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA

EMPRESA: <b>LOCADORA TERRAMARES LTDA</b>		DATA: <b>07/08/2021</b>
OBRA: <b>PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA E SERVIÇOS COMPLEMENTARES, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MÃO DE OBRA, NO MUNICÍPIO DE CONGONHAS-MG.</b>		DATA INICIAL: <b>02/03/2020</b>
CONTRATO: <b>PMC/078/2020</b>	RDO Nº: <b>523</b>	

DIA DA SEMANA						
2ª	3ª	4ª	5ª	6ª	SÁB	DOM
					X	
EFETIVO TOTAL: 0						
PRESENTES: 0			AUSENTES: 0			

CONDIÇÕES DO TEMPO			DADOS CONTRATUAIS	
	MANHÃ	TARDE	NOITE	PRAZO CONTRATUAL:
BOM	X	X	X	578
CHUVA				DIAS CORRIDOS: 523
mm				DIAS RESTANTES: 55


EFETIVO	DESCRIÇÃO	QUANT		DESCRIÇÃO	QUANT		DESCRIÇÃO	QUANT.	
		PRES.	AUSEN.		PRES.	AUSEN.		PRES.	AUSEN.
	ENGENHEIRO	0		OP. DE MINI ESCAVADEIRA	0		AJUDANTE	0	
	ENCARREGADO	0		OPERADOR DE ESPARGIDOR	0		MOTORISTA BETONEIRA	0	
	OPERADOR DE PATROL	0		OPERADOR DE VIBROACABADORA	0		AJUDANTE DE ASFALTO	0	
	OPERADOR DE ESCAVADEIRA	0		OPERADOR ROLO PNEU	0		RASTILEIRO	0	
	OPERADOR DE ROLO (PÉ DE CARNEIRO)	0		OPERADOR ROLO LISO	0				
	MOTORISTA CAMINHÃO PIPA	0		MOTORISTA	0				
	OPERADOR DE TRATOR AGRÍCOLA	0		PEDREIRO	0		TOTAL	0	0

EQUIPAMENTOS	DESCRIÇÃO	QUANT		DESCRIÇÃO	QUANT		DESCRIÇÃO	QUANT.	
		PRES.	AUSEN.		PRES.	AUSEN.		PRES.	AUSEN.
	PATROL	0		MINI ESCAVADEIRA	0		CAMINHÃO TRAÇADO	0	
	ESCAVADEIRA	0		CAMINHÃO ESPARGIDOR	0		CAMINHÃO BASCULANTE	0	
	ROLO COMPACTADOR (PÉ DE CARNEIRO)	0		VIBROACABADORA	0		PLACA VIBRATÓRIA	0	
	CAMINHÃO PIPA	0		ROLO PNEU	0		CAMINHÃO DE CONCRETO	0	
	TRATOR AGRÍCOLA	0		ROLO LISO	0		TOTAL	0	0

ITEM	DISCRIMINAÇÃO DAS ATIVIDADES
1	NÃO HOUVE EXECUÇÃO DE ATIVIDADES - SÁBADO
2	
3	
4	
5	
6	
7	
8	

ITEM	OBSERVAÇÃO
1	
2	
3	
4	
5	
6	

### GALERIA DE FOTOS



ASSINATURAS: **Hugo Seabra de Mota** (CONTRATADA) **Previdência de Congonhas** (CONTRATANTE)

Frankele Indústria Sntos Sll...  
 pra...  
 Edif...  
 15...  
 3395



# TERRAMARES

3607  
Pau

## RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA

EMPRESA: <b>LOCADORA TERRAMARES LTDA</b>		DATA: <b>09/08/2021</b>
OBRA: <b>PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA E SERVIÇOS COMPLEMENTARES, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MÃO DE OBRA, NO MUNICÍPIO DE CONGONHAS-MG.</b>		DATA INICIAL: <b>02/03/2020</b>
CONTRATO: <b>PMC/078/2020</b>	RDO Nº: <b>525</b>	

DIA DA SEMANA						
2ª	3ª	4ª	5ª	6ª	SÁB	DOM
X						
EFETIVO TOTAL: <b>3</b>						
PRESENTES: <b>3</b>			AUSENTES: <b>0</b>			

CONDIÇÕES DO TEMPO			DADOS CONTRATUAIS		
	MANHÃ	TARDE	NOITE	PRAZO CONTRATUAL:	578
BOM	X	X	X	DIAS CORRIDOS:	625
CHUVA				DIAS RESTANTES:	53
mm					


EFETIVO	DESCRIÇÃO	QUANT		DESCRIÇÃO	QUANT		DESCRIÇÃO	QUANT.	
		PRES.	AUSEN.		PRES.	AUSEN.		PRES.	AUSEN.
	ENGENHEIRO	0		OP. DE MINI ESCAVADEIRA	0		AJUDANTE	2	
	ENCARREGADO	0		OPERADOR DE ESPARGIDOR	0		MOTORISTA BETONEIRA	0	
	OPERADOR DE PATROL	0		OPERADOR DE VIBROACABADORA	0		AJUDANTE DE ASFALTO	0	
	OPERADOR DE ESCAVADEIRA	0		OPERADOR ROLO PNEU	0		RASTILEIRO	0	
	OPERADOR DE ROLO (PÉ DE CARNEIRO)	0		OPERADOR ROLO LISO	0				
	MOTORISTA CAMINHÃO PIPA	0		MOTORISTA	0				
	OPERADOR DE TRATOR AGRÍCOLA	0		PEDREIRO	1		TOTAL	3	0

EQUIPAMENTOS	DESCRIÇÃO	QUANT		DESCRIÇÃO	QUANT		DESCRIÇÃO	QUANT.	
		PRES.	AUSEN.		PRES.	AUSEN.		PRES.	AUSEN.
	PATROL	0		MINI ESCAVADEIRA	0		CAMINHÃO TRAÇADO	0	
	ESCAVADEIRA	0		CAMINHÃO ESPARGIDOR	0		CAMINHÃO BASCULANTE	0	
	ROLO COMPACTADOR (PÉ DE CARNEIRO)	0		VIBROACABADORA	0		PLACA VIBRATÓRIA	1	
	CAMINHÃO PIPA	0		ROLO PNEU	0		CAMINHÃO DE CONCRETO	0	
	TRATOR AGRÍCOLA	0		ROLO LISO	0		TOTAL	1	0

ITEM	DISCRIMINAÇÃO DAS ATIVIDADES
1	EXECUÇÃO DE ATERRO DE SOLO CIMENTO COM PLACA VIBRATÓRIA - ESTRADA ESMERIL
2	
3	
4	
5	
6	
7	
8	

ITEM	
1	
2	
3	
4	
5	
6	

### GALERIA DE FOTOS



Sandra Raquel Lacerda Milagre  
Eng. Civil - RFA 24537-10  
Município de Congonhas

Hugo Sebastião Mota  
Engenheiro Civil  
C.R. 00510 - MG

ASSINATURAS:

CONTRATADA

CONTRATANTE

Eng.ºciê. Ind.ºm.º S.ºm.º  
Prefeitura de Congonhas  
Téc. Ed.ºm.º 2016  
110009934

# TERRAMARES

3608  
Cm

## RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA

EMPRESA:		LOCADORA TERRAMARES LTDA		DATA:	10/08/2021
OBRA:		PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA E SERVIÇOS COMPLEMENTARES, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MÃO DE OBRA, NO MUNICÍPIO DE CONGONHAS-MG.		DATA INICIAL:	02/03/2020
		CONTRATO:	PMC/078/2020	RDO Nº:	526

DIA DA SEMANA						
2ª	3ª	4ª	5ª	6ª	SÁB	DOM
	X					
EFETIVO TOTAL:						7
PRESENTES:			7	AUSENTES:		0

CONDIÇÕES DO TEMPO			DADOS CONTRATUAIS		
	MANHÃ	TARDE	NOITE	PRAZO CONTRATUAL:	578
BOM	X	X	X	DIAS CORRIDOS:	526
CHUVA				DIAS RESTANTES:	52
mm					

EFETIVO	DESCRIÇÃO	QUANT		DESCRIÇÃO	QUANT		DESCRIÇÃO	QUANT.	
		PRES.	AUSEN.		PRES.	AUSEN.		PRES.	AUSEN.
	ENGENHEIRO	0		OP. DE MINI ESCAVADEIRA	0		AJUDANTE	4	
	ENCARREGADO	0		OPERADOR DE ESPARGIDOR	0		MOTORISTA BETONEIRA	1	
	OPERADOR DE PATROL	0		OPERADOR DE VIBROACABADORA	0		AJUDANTE DE ASFALTO	0	
	OPERADOR DE ESCAVADEIRA	0		OPERADOR ROLO PNEU	0		RASTILHEIRO	0	
	OPERADOR DE ROLO (PÉ DE CARNEIRO)	0		OPERADOR ROLO LISO	0				
	MOTORISTA CAMINHÃO PIPA	0		MOTORISTA	0				
	OPERADOR DE TRATOR AGRÍCOLA	0		PEDREIRO	2		TOTAL	7	0

EQUIPAMENTOS	DESCRIÇÃO	QUANT		DESCRIÇÃO	QUANT		DESCRIÇÃO	QUANT.	
		PRES.	AUSEN.		PRES.	AUSEN.		PRES.	AUSEN.
	PATROL	0		MINI ESCAVADEIRA	0		CAMINHÃO TRAÇADO	0	
	ESCAVADEIRA	0		CAMINHÃO ESPARGIDOR	0		CAMINHÃO BASCULANTE	0	
	ROLO COMPACTADOR (PÉ DE CARNEIRO)	0		VIBROACABADORA	0		PLACA VIBRATÓRIA	1	
	CAMINHÃO PIPA	0		ROLO PNEU	0		CAMINHÃO DE CONCRETO	1	
	TRATOR AGRÍCOLA	0		ROLO LISO	0		TOTAL	2	0

ITEM	DISCRIMINAÇÃO DAS ATIVIDADES
1	EXECUÇÃO DE ATERRO DE SOLO CIMENTO COM PLACA VIBRATÓRIA – ESTRADA ESMERIL
2	EXECUÇÃO DE SARJETA EM V – ÁGUA BOA
3	
4	
5	
6	
7	
8	

ITEM	OBSERVAÇÃO
1	
2	
3	
4	
5	
6	

GALERIA DE FOTOS	
<p>ASSINATURAS:</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around;"> <div style="text-align: center;"> <p><i>Hugo Seabra de Menezes</i></p> <p>Engenheiro Civil</p> <p>CONTRATADA</p> </div> <div style="text-align: center;"> <p><i>Senza Rosal Leal da Mota</i></p> <p>Engenheira Civil - CREA 149136 D TO</p> <p>Secretaria de Congonhas</p> <p>CONTRATANTE</p> </div> </div>	

Fundação Indianara Santos  
 Prefeitura de Congonhas  
 Fac. Edificações  
 11/08/2021

# TERRAMARES

3609

*(Handwritten signature)*

## RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA

EMPRESA: <b>LOCADORA TERRAMARES LTDA</b>		DATA: <b>11/08/2021</b>
OBRA: <b>PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA E SERVIÇOS COMPLEMENTARES, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MÃO DE OBRA, NO MUNICÍPIO DE CONGONHAS-MG.</b>		DATA INICIAL: <b>02/03/2020</b>
CONTRATO: <b>PMC/078/2020</b>	RDO Nº: <b>527</b>	

DIA DA SEMANA						
2ª	3ª	4ª	5ª	6ª	SÁB	DOM
		X				
EFETIVO TOTAL: 3						
PRESENTES: 3			AUSENTES: 0			

CONDIÇÕES DO TEMPO			DADOS CONTRATUAIS		
	MANHÃ	TARDE	NOITE	PRAZO CONTRATUAL:	578
BOM	X	X	X	DIAS CORRIDOS:	527
CHUVA				DIAS RESTANTES:	51
mm					

EFETIVO	DESCRIÇÃO	QUANT		DESCRIÇÃO	QUANT		DESCRIÇÃO	QUANT.	
		PRES.	AUSEN.		PRES.	AUSEN.		PRES.	AUSEN.
	ENGENHEIRO	0		OP. DE MINI ESCAVADEIRA	0		AJUDANTE	2	
	ENCARREGADO	0		OPERADOR DE ESPARGIDOR	0		MOTORISTA BETONEIRA	0	
	OPERADOR DE PATROL	0		OPERADOR DE VIBROACABADORA	0		AJUDANTE DE ASFALTO	0	
	OPERADOR DE ESCAVADEIRA	0		OPERADOR ROLO PNEU	0		RASTILEIRO	0	
	OPERADOR DE ROLO (PÉ DE CARNEIRO)	0		OPERADOR ROLO LISO	0				
	MOTORISTA CAMINHÃO PIPA	0		MOTORISTA	0				
	OPERADOR DE TRATOR AGRÍCOLA	0		PEDREIRO	1		TOTAL	3	0

EQUIPAMENTOS	DESCRIÇÃO	QUANT		DESCRIÇÃO	QUANT		DESCRIÇÃO	QUANT.	
		PRES.	AUSEN.		PRES.	AUSEN.		PRES.	AUSEN.
	PATROL	0		MINI ESCAVADEIRA	0		CAMINHÃO TRAÇADO	0	
	ESCAVADEIRA	0		CAMINHÃO ESPARGIDOR	0		CAMINHÃO BASCULANTE	0	
	ROLO COMPACTADOR (PÉ DE CARNEIRO)	0		VIBROACABADORA	0		PLACA VIBRATÓRIA	1	
	CAMINHÃO PIPA	0		ROLO PNEU	0		CAMINHÃO DE CONCRETO	0	
	TRATOR AGRÍCOLA	0		ROLO LISO	0		TOTAL	1	0

ITEM	DISCRIMINAÇÃO DAS ATIVIDADES
1	EXECUÇÃO DE ATERRO DE SOLO CIMENTO COM PLACA VIBRATÓRIA - ESTRADA ESMERIL
2	
3	
4	
5	
6	
7	
8	

ITEM	OBSERVAÇÃO
1	
2	
3	
4	
5	
6	

### GALERIA DE FOTOS



**ASSINATURAS:**  
 CONTRATADA: *Hugo Seabra da Mata*  
 CONTRATANTE: *Sandra Kato Lacerda Milagre*  
 Engenheiro Civil - CREA 149138 D TO  
 Profissional de Congonhas

Prefeitura Municipal de Congonhas  
 Rua...  
 CEP: 35.000-000



# TERRAMARES

3611  
Damo

## RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA

EMPRESA:		LOCADORA TERRAMARES LTDA		DATA:	13/08/2021
OBRA:		PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA E SERVIÇOS COMPLEMENTARES, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MÃO DE OBRA, NO MUNICÍPIO DE CONGONHAS-MG.		DATA INICIAL:	02/03/2020
		CONTRATO:	PMC/078/2020	RDO Nº:	529

DIA DA SEMANA						
2ª	3ª	4ª	5ª	6ª	SÁB	DOM
				X		
EFETIVO TOTAL: 7						
PRESENTES: 7			AUSENTES: 0			

CONDIÇÕES DO TEMPO			DADOS CONTRATUAIS		
	MANHÃ	TARDE	NOITE	PRAZO CONTRATUAL:	578
BOM	X	X	X	DIAS CORRIDOS:	529
CHUVA				DIAS RESTANTES:	49
mm					


ELETIVO	DESCRIÇÃO	QUANT		DESCRIÇÃO	QUANT		DESCRIÇÃO	QUANT.	
		PRES.	AUSEN.		PRES.	AUSEN.		PRES.	AUSEN.
	ENGENHEIRO	0		OP. DE MINI ESCAVADEIRA	0		AJUDANTE	4	
	ENCARREGADO	0		OPERADOR DE ESPARGIDOR	0		MOTORISTA BETONEIRA	1	
	OPERADOR DE PATROL	0		OPERADOR DE VIBROACABADORA	0		AJUDANTE DE ASFALTO	0	
	OPERADOR DE ESCAVADEIRA	0		OPERADOR ROLO PNEU	0		RASTILEIRO	0	
	OPERADOR DE ROLO (PÉ DE CARNEIRO)	0		OPERADOR ROLO LISO	0				
	MOTORISTA CAMINHÃO PIPA	0		MOTORISTA	0				
	OPERADOR DE TRATOR AGRÍCOLA	0		PEDREIRO	2		TOTAL	7	0

EQUIPAMENTOS	DESCRIÇÃO	QUANT		DESCRIÇÃO	QUANT		DESCRIÇÃO	QUANT.	
		PRES.	AUSEN.		PRES.	AUSEN.		PRES.	AUSEN.
	PATROL	0		MINI ESCAVADEIRA	0		CAMINHÃO TRAÇADO	0	
	ESCAVADEIRA	0		CAMINHÃO ESPARGIDOR	0		CAMINHÃO BASCULANTE	0	
	ROLO COMPACTADOR (PÉ DE CARNEIRO)	0		VIBROACABADORA	0		PLACA VIBRATÓRIA	0	
	CAMINHÃO PIPA	0		ROLO PNEU	0		CAMINHÃO DE CONCRETO	1	
	TRATOR AGRÍCOLA	0		ROLO LISO	0		TOTAL	1	0

ITEM	DISCRIMINAÇÃO DAS ATIVIDADES
1	EXECUÇÃO DE ESCADA D'ÁGUA - ESTRADA ESMERIL
2	EXECUÇÃO DE SARJETA EM V - ÁGUA BOA
3	
4	
5	
6	
7	
8	

ITEM	OBSERVAÇÃO
1	
2	
3	
4	
5	
6	

### GALERIA DE FOTOS

  
**Hugo Sebastião da Mota**  
 Engenheiro Civil  
 CRE: 202510 - MG

Sandra Raquel Lacerda Milagre  
 Engenheira Civil  
 CRE: 144.135 D TO  
 13/08/2021

Françoise Indaiana Santos  
 Prefeitura de Congonhas  
 T. Edifício: 1688-1000

ASSINATURAS: CONTRATADA CONTRATANTE

# TERRAMARES

Prefeitura de Congonhas  
Secretaria Municipal de Obras  
003803

## RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA

EMPRESA:	LOCADORA TERRAMARES LTDA	DATA:	28/10/2021
OBRA:	PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA E SERVIÇOS COMPLEMENTARES, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MÃO DE OBRA, NO MUNICÍPIO DE CONGONHAS-MG.	DATA INICIAL:	02/03/2020
CONTRATO:	PMC/078/2020	RDO Nº:	605

DIA DA SEMANA							
2ª	3ª	4ª	5ª	6ª	SÁB	DOM	
			X				
EFETIVO TOTAL:							23
PRESENTES:			23	AUSENTES:		0	


CONDIÇÕES DO TEMPO				DADOS CONTRATUAIS	
	MANHÃ	TARDE	NOITE	PRAZO CONTRATUAL:	728
BOM	X	X	X	DIAS CORRIDOS:	605
CHUVA				DIAS RESTANTES:	123
mm					

EFETIVO	DESCRIÇÃO	QUANT		DESCRIÇÃO	QUANT		DESCRIÇÃO	QUANT.	
		PRES.	AUSEN.		PRES.	AUSEN.		PRES.	AUSEN.
	ENGENHEIRO	1		OP. DE MINI ESCAVADEIRA	0		AJUDANTE	2	
	ENCARREGADO	1		OPERADOR DE ESPARGIDOR	2		MOTORISTA BETONEIRA	1	
	OPERADOR DE PATROL	1		OPERADOR DE VIBROACABADORA	1		AJUDANTE DE ASFALTO	4	
	OPERADOR DE ESCAVADEIRA	1		OPERADOR ROLO PNEU	1		RABELEIRO	2	
	OPERADOR DE ROLO (PÉ DE CARNEIRO)	1		OPERADOR ROLO LISO	1		INSTALADOR	0	
	MOTORISTA CAMINHÃO PIPA	1		MOTORISTA	3		MESISTA	1	
	OPERADOR DE TRATOR AGRÍCOLA	1		PEDREIRO	2		TOTAL	23	0

EQUIPAMENTOS	DESCRIÇÃO	QUANT		DESCRIÇÃO	QUANT		DESCRIÇÃO	QUANT.	
		PRES.	AUSEN.		PRES.	AUSEN.		PRES.	AUSEN.
	PATROL	1		MINI ESCAVADEIRA	0		CAMINHÃO TRAÇADO	0	
	ESCAVADORA	1		CAMINHÃO ESPARGIDOR	1		CAMINHÃO BASCULANTE	2	
	ROLO COMPACTADOR (PÉ DE CARNEIRO)	1		VIBROACABADORA	1		PLACA VIBRATORIA	0	
	CAMINHÃO PIPA	1		ROLO PNEU	1		CAMINHÃO DE CONCRETO	1	
	TRATOR AGRÍCOLA	1		ROLO LISO	1		TOTAL	12	0

ITEM	DISCRIMINAÇÃO DAS ATIVIDADES
1	EXECUÇÃO DE REPARO EM PAVIMENTO NO BAIRRO ÁGUA BOA (RUA 10).
2	REMOÇÃO DE PAVIMENTO DANIFICADO - RUA 10 - BAIRRO ÁGUA BOA.
3	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO - RUA 10 - ÁGUA BOA.
4	EXECUÇÃO DE BASE - RUA 10 - ÁGUA BOA.
5	EXECUÇÃO DE IMPRIMAÇÃO - RUA 10 - ÁGUA BOA.
6	EXECUÇÃO DE PINTURA DE LIGAÇÃO - RUA 10 - ÁGUA BOA.
7	EXECUÇÃO DE CBUQ + TRANSPORTE DO MESMO - RUA 10 - ÁGUA BOA.
8	REPARO EM CORDÃO DE CONCRETO - ESMERIL.
9	REPARO EM SARJETA EM "V" DANIFICADA PELA CHUVA - ESMERIL.

ITEM	OBSERVAÇÃO
1	OBSERVAÇÃO: CONFORME INFORMADO AOS RESPONSÁVEIS DA CONTRATANTE, SR. FREDERICO OSANAM REIS E SRA. FRANCIELE INDIANARA S. SILVA, O REPARO FOI EXECUTADO CONFORME SOLICITADO POR PARTE DA PREFEITURA E SEGUINDO ORIENTAÇÕES DA MESMA. ALEM DISSO, A DRENAGEM EXISTENTE NA RUA NÃO É CAPAZ DE COMPORTAR O GRANDE FLUXO DE ÁGUA. CABE RESSALTAR QUE A VIA APRESENTA DIVERSOS PROBLEMAS, CAUSADOS PELOS MORADORES LOCAIS, OS QUAIS JÁ FORAM COMUNICADOS EM OFÍCIO ENTRE A CONTRATADA E A CONTRATANTE.
2	
3	
4	O ENG. Frederico informou que devido a execução
5	destes serviços está em trabalho home office e que a
6	execução foi interrompida pelo Eng. Diretor de Obras

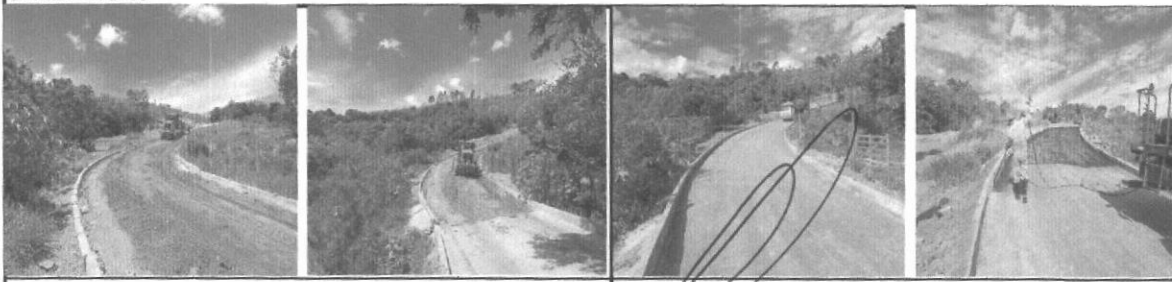

ASSINATURAS:

Hugo Seabra da Mota  
Engenheiro Civil  
CONTRATADA 18629 MG

Frederico Osanam Reis  
Engenheiro Civil / Fiscal  
CONTRATANTE 18629  
CREA-MG 18629  
Prefeitura de Congonhas

O SR. DANIEL APARECIDO, O QUAL DETERMINOU OS SERVIÇOS A SEREM EXECUTADOS.

Frederico Osanam Reis  
Engenheiro Civil / Fiscal  
CREA-MG 18629  
Prefeitura de Congonhas
